

# verslag

Verslag van contractvergadering project  
31091560 'Eerste fase Marker Wadden'

Omschrijving	Contractvergadering
Datum bespreking	1 juni 2021
Deelnemers	[redacted] (Boskalis), [redacted] (Boskalis), [redacted] (RWS), [redacted] (NM), [redacted] (RWS), [redacted]
Afschrift aan	Deelnemers, [redacted] (NM)

## 1. Opening/mededeling

[redacted] opent de vergadering en heet iedereen welkom.

## 2. Verslag projectvergadering

- ondertekening verslag projectvergadering nr 64

Het verslag zal na de vergadering door [redacted] worden getekend.

- bespreking verslag projectvergadering nr 65

Er zijn geen opmerkingen op het verslag.

- acties

De actielijst is besproken en in dit verslag bijgewerkt.

## 3. Voortgangsrapportage (terugkijken)

- toelichting voortgang (adhv voortgangsrapportage)

- Vorige keer is gevraagd om de VGR uit te breiden. Dit is gedaan. OG-team heeft echter nog wel behoefte aan meer inzicht in de weekproducties, gesplitst naar zand en holocene. Dit zal de volgende keer worden opgenomen, actie 66.01.
- Restpunten: de nog open staande punten zullen worden toegevoegd aan de actielijst van de contractvergadering (*na de bestaande lijst is de "actielijst respunten" toegevoegd in dit verslag*). Hiermee is het niet nodig om de restpunten in de VGR te behandelen.
- MJO/B&O: Noordstrand en Harde rand worden in de VGR opgenomen, actie 66.01. MJO/B&O valt verder buiten de VGR (als we geen E-eilanden zouden maken, zou er helemaal geen VGR zijn).
- De hoofdschipper van de Rhone is thuis aan een hartstilstand overleden. Het team van Boskalis heeft met elkaar stil gestaan bij dit verlies. Desondanks heeft het werk geen vertraging opgelopen. Er is direct een

vervanger geregeld.

- De Lessons Learned Sessie / close-out meeting was een informatieve bijeenkomst. Het verslag, dat door OG wordt gemaakt, volgt nog, actie 66.00.
- Beoordeling van het VGM-plan uitvoering is door OG opgepakt.
- Interne audits zijn gepland. De verslagen zullen ter zijner tijd aan de VGR worden toegevoegd of separaat met OG worden gedeeld.
- Vorige week is de V&V-sessie voor de E-eilanden geweest.
- Afwijkingen worden niet met OG gedeeld als OG er geen akkoord op hoeft te geven. In de VGR zal een afwijkingenregister worden opgenomen, actie 66.01.
- Veiligheid: Boskalis is op de goede weg voor de certificering voor de Veiligheidsprestatieladder Niveau 4.
- Veiligheid: de waarschuwingsborden die Boskalis heeft laten maken, zijn geplaatst.
- Er is door [REDACTED] een presentatie gegeven over de Marker Wadden op het MBO in Almere. Dit is via [REDACTED] georganiseerd.
- Twee archeologen hebben diverse vondsten gedaan op de Marker Wadden.
- Er is 450 000 m3 zand in de onderwaterdammen aangebracht. De contour van E1 is er.
- Ook zijn er 3 eilandjes binnen het compartiment gemaakt. Deze eilandjes zijn een beheersmaatregel om meer differentiatie te krijgen.
- De aanlandingsplek en aansluiting naar E2 is ook gereed.
- In de VGR is de survey van de winput opgenomen. Winning in de put zal richting het zuiden verder gaan.
- Werkzaamheden staan nu in het teken van het sproeien van de onderwaterdammen E2.
- In week 25 wordt gestart met het stortwerk.
- Grond, zanderig materiaal, wordt vanuit de Singelgracht geleverd. Volgende week wordt het ponton verhuisd naar het Noordstrand.
- In de winput komen geen grote stenen voor, zoals dat bij winput 1 het geval was.

- afwijkingen/voorstellen tot wijziging

- VTW85 "Extra zand compartiment E1 en onderwaterdam E2" ligt ter beoordeling bij OG, actie 66.02.
- Peilen ondiep: zie actie 57.01
- Overige nog openstaande VTW's zijn op de restpuntenlijst opgenomen.

- WAV

Er zijn geen bijzonderheden te melden m.b.t. de WAV.

- termijnstaat//factuur/PV/betalen

Loopt, er ligt één verzoek tot PV bij OG. Deze is in behandeling. Verder geen bijzonderheden.

#### **4. Veiligheid en gezondheid / NINA**

- V&G incidenten en bijna ongevallen  
Er zijn geen incidenten of bijna ongevallen te melden.

**Datum**  
1 juni 2021  
**Nummer**  
64

De veiligheidsronde door OG die voor vanmorgen gepland stond, is ivm ziekte geannuleerd. ON had al wel een uitgevoerde werkplekinspectie opgestuurd naar OG. Er worden regelmatig veiligheidsinspecties gedaan. Bijvoorbeeld intake controle schip voor start werkzaamheden. Ook kick-off is geweest. ON geeft voorkeur aan fysieke veiligheidsronde door OG, dan aan het digitaal delen van bestanden. OG geeft aan dat dat ook de insteek is.

#### **5. B&O / MJO**

Volgende contractvergadering zal [REDACTED] (beheer NM) aansluiten. Dan zal ook de presentatie door ON worden gegeven.

#### **6. Oplevering ABCD**

- restpuntenlijst

- Nr 14: Afwerken recreatiestrand wordt gecombineerd met het Noordstrand en uitvoering zal waarschijnlijk Q3 worden.
- Harde rand: volgende week vindt bezoek buiten plaats, daarna vervolg.
- De restpuntenlijst zal worden vastgesteld. Nog openstaande punten worden in de contractvergadering bewaakt (openstaande punten komen op de actielijst).

- opleverdossier

Het DTB is ingediend en ligt bij de toetsers. Het B&O-plan moet nog aangevuld worden met het kaartje (check of dit klopt). Morgen is er weer overleg tussen ON en OG.

#### **7. Raakvlakken / Afstemming werkzaamheden van Boskalis met;**

- Onderzoekers, geen bijzonderheden
- Eilandwachters (NM), geen bijzonderheden

#### **8. Grondstromen**

Singelgracht: loopt, zie ook actie 65.01

Keileem: niets meer van gehoord. [REDACTED] zal bellen.

#### **9. Vooruitkijken**

- Agenda komende periode / werkbezoeken / toezicht
- Komende maand wordt hoog bezoek verwacht.

#### **10. Rondvraag**

- volgende overleg dinsdag 29 juni 2021, 13:00uur-14:30uur (MS Teams)
- Deze vergadering zal gecombineerd worden met een werkbezoek aan de E-eilanden.

Akkoord OG

[REDACTED]

Akkoord ON

[REDACTED] 7/6/2021

**Actielijst**

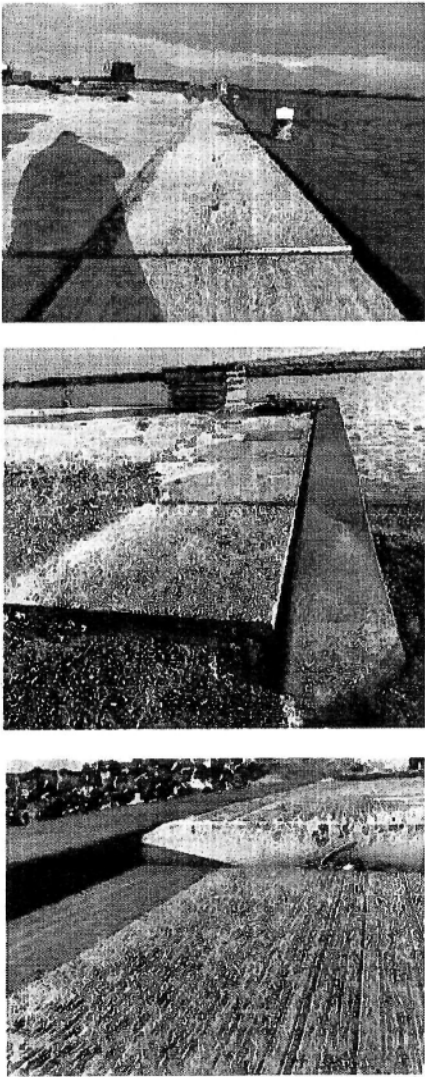
Actie	Omschrijving	Actiehouder	Deadline	Opmerking
50.01	Kennismaking met [redacted] (team Boskalis)	[redacted]	Afhankelijk van coronamaatregelen.	
57.01	Peilen ondieptes: VTW opstellen	[redacted]	Juni 2021	1/6: prijs is bekend, nog opsplitsen naar ON en OG. VTW volgt.
62.01b	Overleg plannen over uitvoeringsmethode ('lessons learned') hoogteontwikkeling	[redacted]	september 2021 (als we samen mogen komen)	GEREED: Wordt 24 Sept. Deelnemers: [redacted]
62.02	Aanbrengen bewijzing en informatieve voorziening: nagaan of in de begroting hier een waarde aan is gegeven	[redacted]	9-3-2021	[redacted] in open begroting. Meenemen in totaalafrekening.
62.07	Bankgarantie: voorstel omruilen als wijziging 5 getekend is	[redacted]	9 april 2021	E-mail van ON is ontvangen. [redacted] vraagt zich af of dit het juiste is. Na de vergadering zullen [redacted] bij [redacted] navraag doen.
65.01	Werkplan en VTW Noordstrand	[redacted]	1-6-2021	Eerst onderwater uitvoeren: materiaal vanuit Singelgracht komt in vooroever. Over ca 2 weken meer info bij elkaar, dan kan de VTW opgesteld worden.
65.02	Kaartje vaarroutes beroepsvaart (grondleveranciers)	[redacted]	17-5-2021	GEREED
65.03	Vakantieplanning opnemen in verslag contractvergadering	[redacted]	1-7-2021	GEREED
66.00	Verslag Lessons Learned rondsturen	[redacted]	Juli 2021	
66.01	opnemen in de VGR: - weekproducties zand en holoceen; - Noordstrand; - Harde rand; - Afwijkingenregister.	[redacted]	29-6-2021	

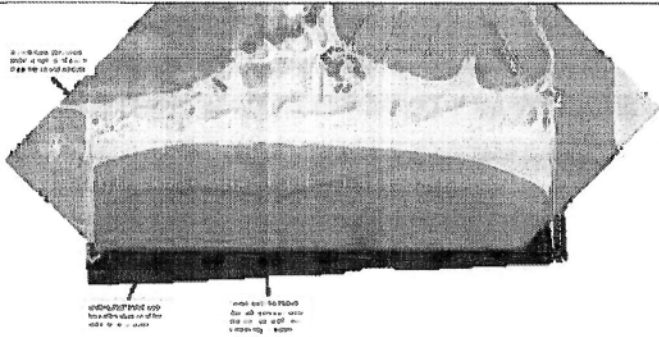




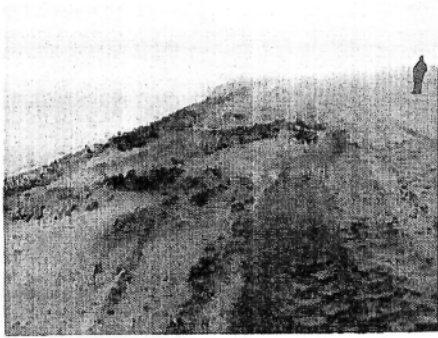
Actie	Omschrijving	Actiehouder	Deadline	Opmerking	Datum
66.02	VTW85 "Extra zand compartiment E1 en onderwaterdam E2"		29-6-2021		1 juni 2021 Nummer 64

### Acties Restpuntenlijst

Nr.	Toetsaspect	Bevinding / actie	Deadline / opmerking	Status
<b>Opname 2020</b>				
10	Ondiepe delen	Inmeten ondiepe delen conform VTW, inclusief rapportage.	April/mei 2021	
11	Gekalibreerd model	EMVI belofte voor een gekalibreerd model voor de voorspelling van zetting en consolidatie van de compartimenten (p4 EMVI boek 4). Acties: 1) aanvullen memo hoogteligging tot versie 2.0 conform afspraken (verslag overleg memo hoogteligging januari 2021) 2) evaluatie uitvoering		
12	Schade paden	Op meerdere plaatsen zijn de paden stuk gereden door zwaar materieel en/of zijn dellen ontstaan in de paden.	Kruispunt onderdam+ achterdam A2 zullen we herstellen (q2 2021).	
<b>Aanvulling januari 2021</b>				

13	Loswal	<p><b>Loswal:</b> de platen raken (nog steeds) onderspoeld en door zetting (?) zakt middendeel meer dan rand waardoor schuine loswal niet vlak is.</p> 	<p><b>Stelcon</b>  <b>platen</b>      langs de      dekloof zullen      we herstellen      indien we een      materieel stuk      ter plaatsen      hebben om de      actie uit te      voeren (q2      2021).</p> <p>De eerste rij      platen zal      gelicht en      opnieuw gelegd      worden met      evt. een doek      eronder.</p> <p>Herstel      uitvoeren in      overleg met</p> <p>Oorzaak van de      schade is nog      niet helemaal      helder</p>	
----	--------	---	--	--

<p><b>14</b></p>	<p>Afwerken Recreatiestrand</p>		<p>Herstel van recreatiestrand naar duintop zullen we inplannen, indien we materieel beschikbaar hebben (Q2 2021), overige punten meerwerk opstelling voor maken.</p>	
<p><b>16</b></p>	<p>Landhoofd brede vlonder nabij A1</p>	<p>Definitief herstel is nodig van de erosieschade.</p> 	<p>Herstel in Q2 wanneer er materieel aanwezig is.</p>	

20	Zuidelijke duiker door tijdelijke dam A1	<p>Zuidelijke duiker door tijdelijke dam A1 is te hoog, scheef en te weinig waardoor A1 onvoldoende ontwatert.</p> 	<p>Doorvoerpijp zeer dun waardoor er veel deuken inzitten en is hij niet recht, pvc pijp ingraven als we een machine op het eiland hebben (Q2 2021). Dam is weggespoeld. Herstel is niet meer nodig.</p>	Afgerond
25	Zuidelijke haventoeegangsdam	<p>Zuidelijke haventoeegangsdam is voor helft niet in profiel gebracht.</p> 	<p>Indien materieelstuk beschikbaar zullen we dit afronden Q2-2021. Uitvoering herstel iom</p>	
27	Harde rand	<p>Herstellen van de harde rand. Op diverse plekken in de harde rand zijn verzakkingen ontstaan. Er wordt onderzocht wat hier de oorzaak van is. De stenen worden gekeurd, eind week 18 wordt het rapport verwacht. Op basis hiervan zal een plan worden gemaakt voor herstel.</p>		
29	Opleverdossier	<p>Indienen Deel-Opleverdossier ABCD Deel 1 en Deel 2.  - Deel-Opleverdossier ABCD Deel 1 opleverdatum op 04-01-21.  - Deel-Opleverdossier ABCD Deel 2 opleverdatum nader te bepalen in gesprek met OG door afhankelijkheid van CIV-DTB proces.</p>	medio 2021	



30	VTW's	Stelpost opdracht KIMA werkzaamheden. Inmeting ondiepe delen. Bewegwijzering VTW 69. Meerboeien, invaarbepierking.	Medio 1 juni 2021 Nummer 64
----	-------	---	--------------------------------

### Vakantieplanning

	juni	juli	augustus	september
		22 t/m	t/m 13	
	7 tot 12	Hele maand	Hele maand	
			1 t/m 29	
		12 t/m	t/m 13	
			30 t/m	t/m 17
	16 t/m 28			3 t/m 24

### Besluitenlijst

Besluit	Omschrijving
B1.1	Informeel overleg is prima, maar besluiten worden alleen geformaliseerd in dit contractoverleg
B1.2	Besloten wordt om dingen niet te doen om het doen, maar omdat ze zinnig zijn. Wordt getwijfeld aan nut en noodzaak van een activiteit dan volgt overleg.
B2.1	Projectplan WSCS-OCE wordt tot nader bericht niet ingediend omdat er geen verdachte locaties zijn binnen het werkterrein.
B3.1	De contractueel gevraagde vastmeetschets is niet zinvol en de contracteis voor ON om die aan te leveren wordt daarom geschrapt.
B15.1	Bij toegang vd haven wordt extra rood-wit-rood geplaatst om ongewenst bezoek te weren.
B16.1	V&V-dossier hoeft niet steeds ter acceptatie te worden ingediend wanneer deze is aangescherpt / nieuwe onderdelen zijn toegevoegd. De huidige werkwijze, inclusief intensieve afstemming met OG, wordt gehandhaafd.
B21.1	"Duiken" wordt niet in het bezoekersplan opgenomen. Afspraak is om met [redacted] een toolbox te houden (en vast te leggen) (actie 21.02). Bij duikverzoeken vervolgens per keer beoordelen of het veilig is en eventueel specifieke afspraken maken.
B46.1	Vanaf 1 september 2019 is het compartiment dunslib niet langer werkterrein, het terrein valt vanaf die datum onder verantwoording van de opdrachtgever.
B55.01	Schadedossier als onderdeel van B&O-plan bij oplevering.
