

verslag

Verslag van contractvergadering project
31091560 'Eerste fase Marker Wadden'

Omschrijving	Contractvergadering
Datum bespreking	29 juni 2021
Deelnemers	[redacted] (Boskalis), [redacted] (RWS), [redacted] (NM), [redacted] (RWS), [redacted] [redacted] (OG), [redacted] (OG)
Afschrift aan	Deelnemers, [redacted] (Boskalis), [redacted] (NM-beheer), [redacted] (NM)

1. Opening/mededeling

[redacted] opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2. Verslag projectvergadering

~~—ondertekening verslag projectvergadering nr~~

- bespreking verslag projectvergadering nr 66

Op pagina 2 wordt het delen van het verslag van de Lessons Learned sessie expliciet als actie benoemd (actienr 66.00). Er zijn verder geen opmerkingen op het verslag.

- acties

- restpuntenlijst (zie acties)

De actielijst is besproken en in dit verslag bijgewerkt.

- Afstemming loswal volgt na de vakanties.

3. Voortgangsrapportage (terugkijken)

- toelichting voortgang (adhv voortgangsrapportage)

- Vorige keer is gevraagd om de VGR uit te breiden. Dit is gedaan. OG-team heeft echter nog wel behoefte aan inzicht in de weekproducties in tabelvorm (zie actie 66.01).
- Harde rand: stand van zaken is nu niet opgenomen in de VGR. Dat zal de volgende keer worden toegevoegd (zie actie 66.01).
- OG geeft complimenten voor de VGR: het is een mooi, informatief stuk dat goed beeld geeft van de voortgang!
- Sproeiwerk onderwaterdammen is gereed. Vorige week is met het stortwerk gestart.
- Er zit kwaliteitsverschil in het zand: met sproeien ging het goed, maar nu met storten wordt er minder voortgang behaald dan verwacht t.o.v. de

volumes die uit de put worden gehaald. Het is echter te kort dag om te zeggen of dit alleen een tijdelijk issue is (door bijvoorbeeld aanzanden in de put omdat er niet in de put werd gewerkt) of dat er structureel slechte kwaliteit zand zit.

- Boskalis heeft een interne risicosessie gehad.
- Planning: 1 september is niet meer haalbaar, wordt waarschijnlijk tweede week oktober. De planning wordt komende weken geactualiseerd.
- In 2022 staan nu geen werkzaamheden gepland. Dat verandert mogelijk, doordat:
 - Grote druk op 2023: zo'n 40 weken werk, waardoor weinig ruimte voor het opvangen van tegenvallers;
 - Tijd/ ruimte voor zetting;
 - Er toch materieel beschikbaar lijkt te zijn.
- Boskalis neemt dit mee in de aan te passen planning.
- De betonning blijft in 2022 liggen, dat is dus geen belemmering voor werken in 2022.
- Boskalis heeft 2 interne audits uitgevoerd. De verslagen worden aan de volgende VGR toegevoegd.
- Het afwijkingenregister is separaat met de VGR meegestuurd.
- [REDACTED] geeft aan dat er geen vegetatiebeheer en peilbeheer op de E-eilanden zal zijn, zoals dat wel op ABCD was. Er wordt bijv. niet ingezaaid (er dwarrelt genoeg rond). Notitie met achtergrond voor deze keuze volgt nog. Zeer waarschijnlijk wordt wel een inzet van [REDACTED] gevraagd voor monitoring.

- opleverdossier ABCD

Loopt: Het DTB is goedgekeurd. Voor het BKN staat volgende week een afspraak gepland tussen [REDACTED] Datadragers met daarop alle gegevens gaar [REDACTED] achteraan, actie 67.01.

- afwijkingen/voorstellen tot wijziging

- VTW85 "Extra zand compartiment E1 en onderwaterdam E2" is akkoord en ligt bij OG ter ondertekening (zie actie 66.02).
- Peilen ondiep: VTW 82 is akkoord en zal een dezer dagen getekend retour worden gestuurd (zie actie 57.01).
- Overige nog openstaande VTW's zijn op de restpuntenlijst/actielijst opgenomen.

- WAV

Er zijn geen bijzonderheden te melden m.b.t. de WAV.

- termijnstaat//factuur/PV/betalen

PV indexering is akkoord en volgt z.s.m.

Nog 1x PV volgens vigerende planning en termijnstaat. Volgende termijn PV o.b.v. geactualiseerde stukken (zie planning onder toelichting VGR).

4. Veiligheid en gezondheid / NINA

- V&G incidenten en bijna ongevallen

- Er zijn geen incidenten of bijna ongevallen te melden.
- Elke dinsdagochtend heeft Boskalis een uitvoerdersoverleg.
- Er is binnen Boskalis een proefaudit geweest voor certificering voor de veiligheidsladder trede 4. Het lijkt ambitieus om de certificering te halen. Officiële audit is over een paar maanden.
- De door Boskalis geplaatste borden, blijken te werken. Ook al zijn ze op afstand niet leesbaar, het triggert wel.
- De mailing naar de havens is verstuurd.

5. B&O / MJO

- [redacted] zou deze vergadering aansluiten, maar was verhinderd.
- Herstel paden: [redacted] heeft over een paar weken werkzaamheden gepland. Afstemming met [redacted] is nodig, zodat we elkaar niet in de weg lopen.

6. Raakvlakken / Afstemming werkzaamheden van Boskalis met;

- Onderzoekers

Er loopt afstemming met Deltares voor het plaatsen van een meetopstelling (3m hoge mast). Project Marker Wadden is hier niet de OG, mogelijk wel andere afdeling van RWS, anders Deltares zelf. Op de Rhone installeert Boskalis zelf meetapparatuur om vrijkomende gassen te meten. Afspraken over uitwisseling data e.d. zullen nog worden gemaakt.

- Eilandwachters (NM), geen bijzonderheden

8. Grondstromen

Singelgracht: loopt, materiaal komt in het Noordstrand.

9. Vooruitkijken

- Agenda komende periode / werkbezoeken / toezicht

Boskalis ligt een aantal weken stil: week 29 is de stort klaar, week 34 (eind aug.) wordt weer gestart. [redacted] werken de zomer door. Er zal m.n. aan de afleverdossiers worden gewerkt.

10. Rondvraag

- volgende overleg dinsdag xx 13:00uur-14:30uur (MS Teams?):

27 juli [redacted]

24 aug [redacted]

21 sept [redacted]

De vergadering op 27 juli wordt geannuleerd. 24 augustus gaat door en zal in de projectkeet zijn. [redacted] is dan waarschijnlijk terug van vakantie.

Akkoord OG

Akkoord ON

[redacted]
Contractmanager Rijkswaterstaat

[redacted]
Projectmanager Boskalis

Actielijst


 Datum
 20 juni 2021

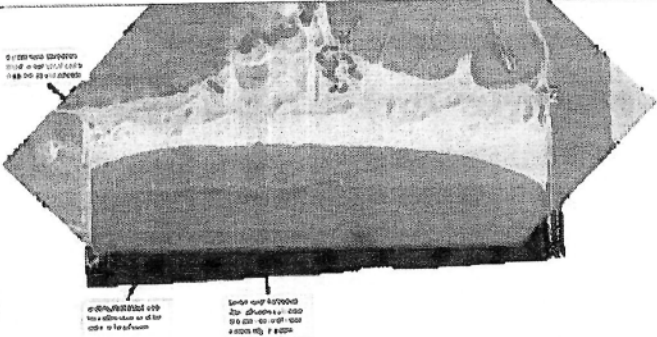

Actie	Omschrijving	Actiehouder	Deadline	Opmerking
50.01	Kennismaking met [redacted] team Boskalis)	[redacted]	September 2021	29/6: In vorm van safety walk in september. zal voorstel voor datum sturen.
57.01	Peilen ondieptes: VTW	[redacted]	02-07-2021	29/6: ligt ter ondertekening bij [redacted]
62.02	Aanbrengen bewijzing en informatieve voorziening: nagaan of in de begroting hier een waarde aan is gegeven	[redacted]	9-3-2021	[redacted] in open begroting. Meenemen in totaalafrekening. [redacted] maakt een voorstel.
62.07	Bankgarantie: voorstel omruilen als wijziging 5 getekend is	[redacted]	9 april 2021	29/06: ligt bij RWS inkoop
65.01	Werkplan en VTW Noordstrand	[redacted]	September 2021	Aansluitend aan deze vergadering presentatie afstudeeronderzoek. Daarna het wat afstemmen en dan kan VTW worden opgesteld.
66.00	Verslag Lessons Learned rondsturen	[redacted]	Juli 2021	
66.01	opnemen in de VGR: -weekproducties zand en holocene; - Noordstrand; - Harde rand; - Afwijkingenregister.	[redacted]	29-6-2021	29/6: weekproducties in tabelvorm & stavaza harde rand toevoegen aan volgende VGR.
66.02	VTW85 "Extra zand compartiment E1 en onderwaterdam E2"	[redacted]	29-6-2021	29/6: ligt ter ondertekening bij [redacted]
67.01	Datadragers oplevering ABCD	[redacted]	Als data oplevering compleet is.	

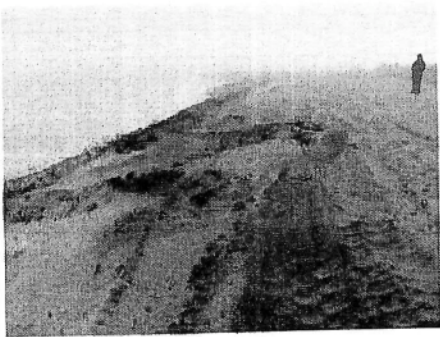
Acties Restpuntenlijst

Datum
29 juni 2021

Nr.	Toetsaspect	Bevinding / actie	Deadline / opmerking	Status
Opname 2020				
10	Ondiepe delen	Inmeten ondiepe delen conform VTW, inclusief rapportage.	April/mei 2021	
11	Gekalibreerd model	EMVI belofte voor een gekalibreerd model voor de voorspelling van zetting en consolidatie van de compartimenten (p4 EMVI boek 4). Acties: 1) aanvullen memo hoogteligging tot versie 2.0 conform afspraken (verslag overleg memo hoogteligging januari 2021) 2) evaluatie uitvoering		
12	Schade paden	Op meerdere plaatsen zijn de paden stuk gereden door zwaar materieel en/of zijn dellen ontstaan in de paden.	Kruispunt onderdam+ achterdam A2 zullen we herstellen (q2 2021).	
Aanvulling januari 2021				

<p>13</p>	<p>Loswal</p>	<p>Loswal: de platen raken (nog steeds) onderspoeld en door zetting (?) zakt middendeel meer dan rand waardoor schuine loswal niet vlak is.</p> 	<p><small>Datum</small> 29 juni 2021 <small>Nummer</small></p> <p>Stelconplaten langs de deksloot zullen we herstellen indien we een materieel stuk ter plaatsen hebben om de actie uit te voeren (q2 2021).</p> <p>De eerste rij platen zal gelicht en opnieuw gelegd worden met evt. een doek eronder.</p> <p>Herstel uitvoeren in overleg met [redacted].</p> <p>Oorzaak van de schade is nog niet helemaal helder</p>	
------------------	---------------	---	---	--

14	Afwerken Recreatiestrand		<p>Herstel in Q2 2021 recreatiestrand naar dynslib zullen we inplannen, indien we materieel beschikbaar hebben (Q2 2021), overige punten meerwerk opstelling voor maken.</p>	
16	Landhoofd brede vlonder nabij A1	<p>Definitief herstel is nodig van de erosieschade.</p> 	<p>Herstel in Q2 wanneer er materieel aanwezig is.</p>	

25	Zuidelijke haventoeegangsdam	Zuidelijke haventoeegangsdam is voor helft niet in profiel gebracht. 	Datum 29 juni 2021 Indien materieelstuk beschikbaar zullen we dit afronden Q2-2021. Uitvoering herstel iom	
27	Harde rand	Herstellen van de harde rand. Op diverse plekken in de harde rand zijn verzakkingen ontstaan. Er wordt onderzocht wat hier de oorzaak van is. De stenen worden gekeurd, eind week 18 wordt het rapport verwacht. Op basis hiervan zal een plan worden gemaakt voor herstel.		
29	Opleverdossier	Indien Deel-Opleverdossier ABCD Deel 1 en Deel 2. - Deel-Opleverdossier ABCD Deel 1 opleverdatum op 04-01-21. - Deel-Opleverdossier ABCD Deel 2 opleverdatum nader te bepalen in gesprek met OG door afhankelijkheid van CIV-DTB proces.	medio 2021	
30	VTW's	Stelpost opdracht KIMA werkzaamheden. Inmeting ondiepe delen. Bewegwijzering VTW 69. Meerboeien, invaarbeperking.	Medio 2021	

Vakantieplanning

	juni	juli	augustus	september
		22 t/m	t/m 13	
	7 tot 12	Hele maand	Hele maand	
		12 t/m	t/m 13	
			30 t/m	t/m 17
	16 t/m 28			3 t/m 24

BesluitenlijstDatum
29 juni 2021

Besluit	Omschrijving	Nummer
B1.1	Informeel overleg is prima, maar besluiten worden alleen geformaliseerd in dit contractoverleg	67
B1.2	Besloten wordt om dingen niet te doen om het doen, maar omdat ze zinnig zijn. Wordt getwijfeld aan nut en noodzaak van een activiteit dan volgt overleg.	
B2.1	Projectplan WSCS-OCE wordt tot nader bericht niet ingediend omdat er geen verdachte locaties zijn binnen het werkterrein.	
B3.1	De contractueel gevraagde vastmeetschets is niet zinvol en de contracteis voor ON om die aan te leveren wordt daarom geschrapt.	
B15.1	Bij toegang vd haven wordt extra rood-wit-rood geplaatst om ongewenst bezoek te weren.	
B16.1	V&V-dossier hoeft niet steeds ter acceptatie te worden ingediend wanneer deze is aangescherpt / nieuwe onderdelen zijn toegevoegd. De huidige werkwijze, inclusief intensieve afstemming met OG, wordt gehandhaafd.	
B21.1	"Duiken" wordt niet in het bezoekersplan opgenomen. Afspraak is om met [REDACTED] een toolbox te houden (en vast te leggen) (actie 21.02). Bij duikverzoeken vervolgens per keer beoordelen of het veilig is en eventueel specifieke afspraken maken.	
B46.1	Vanaf 1 september 2019 is het compartiment dunslib niet langer werkterrein, het terrein valt vanaf die datum onder verantwoording van de opdrachtgever.	
B55.01	Schadedossier als onderdeel van B&O-plan bij oplevering.	

