



Verslag

Contractoverleg project Afsluitdijk

Nummer 29
Datum bespreking 9 januari 2020
Tijdstip 13:00 - 15:00
Locatie Kantoor Level, Den Oever

Deelnemers Rijkswaterstaat



Deelnemers Level



Afschrift aan



1. Opening

a. Vaststellen agenda

█ opent de vergadering en er worden nog twee punten aan de agenda toegevoegd nl. staal en hoogwaterveiligheid.

2. Mededelingen


a. Welkom █

Om het RWS kernteam te versterken is █ aan het team toegevoegd.

Buiten scope

3. Veiligheid en milieu

Geen bijzonderheden.



5. Specifieke punten vanuit instandhouding

Geen bijzonderheden.

Buiten scope

6. Specifieke punten vanuit technisch management



Levvel is van mening dat de belastingen voortkomend uit de golfklappen vanuit het IJsselmeer op de kunstwerken onderdeel zijn van de WOG HR 7.0 en verzoekt deze belastingen op te nemen in de belastingnota behorende bij de [redacted]. Rijkswaterstaat ziet dit anders en stelt voor dat beide partijen hun eigen visie op dit onderwerp eerst op papier zetten.



c. Stand van zaken Afvoeren Water

Terugkoppeling overleg woensdag 18-12-2019. Dit onderwerp is enige tijd niet op tafel geweest. Eind 2019 is er intern wat intensiever over gesproken. Voor de Kerst zijn [redacted] en [redacted] bijgepraat. Een mogelijk knelpunt is dat volgens het verificatievoorschrift pompen en spuien de verificatie van Afvoeren Water zou moeten zijn afgerond voordat Levvel met de uitvoeringswerkzaamheden van de pompgebouwen mag beginnen. [redacted] licht toe dat de oplossing voor verbetering van de afvoercapaciteit niet meer te vinden is in de pompen, de EMVI maatregelen uitgeput zijn en verbetermogelijkheden te vinden zijn bij het nieuwe Spuimiddel en stelt daarom voor de verificatie tussen pompen en spuien te splitsen. RWS heeft Levvel gevraagd om dit voorstel uit te werken in een memo. Dit memo zal op dinsdag 14 januari worden besproken met [redacted] en [redacted]. [redacted] geeft aan dat Levvel van mening is dat de aanpassing van het verificatievoorschrift een gevolg is van de WOG HR 7.0, omdat personele capaciteit sinds in april 2019 is ingezet op de WOG HR 7.0 en niet op Afvoeren Water. Rijkswaterstaat herkent dit onderwerp niet als gevolg van de WOG HR 7.0.

d. Stand van zaken energievoorziening



e. Omgaan met meldingen mbt de planning/voortgang





f. Staal



g. Hoogwaterveiligheid



7. Specifieke punten vanuit omgevingsmanagement



8. Specifieke punten vanuit contractmanagement



- b. Bekrachtiging gemaakte afspraken mbt de WOG HR 7.0 (bijlage C) – is ondertekend.
- c. Voortgang proces WOG HR 7.0.

█ meldt dat Levvel 31 maart a.s. een complete aanbieding zou maken. Dit impliceert dat in februari alles gereed moet zijn, omdat er ook nog interne afstemming en reviews moeten plaatsvinden. Zoals het er nu bij BSM voorstaat denkt hij dat 31 maart niet haalbaar is. █ meldt dat dit ook in het BOT overleg van deze week is besproken en dat opnieuw is bevestigd dat eerst de scope duidelijk moet zijn voordat afstemming met stakeholders kan plaatsvinden. Daarna kan de planning worden uitgewerkt en tenslotte kunnen de kostenconsequenties inzichtelijk worden gemaakt.

█ geeft aan dat RWS in principe wenst vast te houden aan de eerder gemaakte afspraak van 31 maart 2020 en vraagt Levvel in dit kader om aan te geven wat er wél mogelijk is vóór 31 maart 2020. █ al in kaart brengen hoe Levvel het proces ziet.

Actie █

- d. Faaldefinities – Bijlage D, E

Buiten scope



- e. Werkwijze met betrekking tot Bijzondere Omstandigheden.



- f. Status ondertekening WOG HR deel 2

█ vraagt of RWS een update kan geven van de WOG HR deel 2. Voor de Kerst zaten we met twee versies en zou er een advies worden gegeven. █ wil graag weten wat dat advies was. Zowel █ als █ kunnen dit nu niet beantwoorden.

9. Vaststellen/ondertekenen verslagen vorig Contractoverleg.



10. Actiepunten

De actielijst is besproken en bijgewerkt.

11. Rondvraag

-
-
-
-



12. Sluiting

Om 14.30 uur sluit [redacted] de vergadering.

Het verslag van dit contractoverleg wordt vastgesteld voor akkoord en ondertekend.




Buiten scope

Actiepunten


Nummer	Actie	Actiehouder	Termijn	Status
A 28-02	Organogram HR team RWS updaten en aan Levvel verstrekken		09-01-2020	Open





Buiten scope

Besluiten



Nummer	Besluit	Datum
B17-02	W-0046 Wijziging hydraulische randvoorwaarden is een WOG	07-02-2019



Nummer	Besluit	Datum
B21-02	De "achtertuin" van de VMR aan de IJsselmeerzijde (zowel de vismigratierivier, als het natuurcompensatie-eiland) als golfbreker meenemen t.b.v. het verminderen van de belastingen als gevolg van de WOG HR is acceptabel voor RWS.	06-06-2019
B22-01	Technisch management van RWS en Levvel dienen in overleg te gaan om te bepalen hoe de Hydraulische Randvoorwaarden 7.0 worden vertaald in ontwerprandvoorwaarden ten aanzien van het Doorlaatmiddel VMR, ten gevolge van besluit B21-02 in contractoverleg #21 (het meenemen van de "achtertuin" van de VMR aan de IJsselmeerzijde (zowel de vismigratierivier, als het natuurcompensatie-eiland)).	04-07-2019

Onderwerp Besluitvormend overleg esthetisch ontwerp dijk m.b.t. overgangsverschillen dijkvakken

Datum bespreking 4 december 2019

Tijdschip 15.30 – 17.00 uur

Locatie Kantoor Level, Den Oever

Documentnummer

Aanwezigen

Afwezigen

Buiten scope

A

Buiten scope



Buiten scope





Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat


LELY

LELY'S ERFGOED VEILIGGESTELD

BESPREKING DIJKONTWERP

OVERLEG OVER PRINCIPLEOPLOSSINGEN VOOR OVERGANGEN

04-12-2019

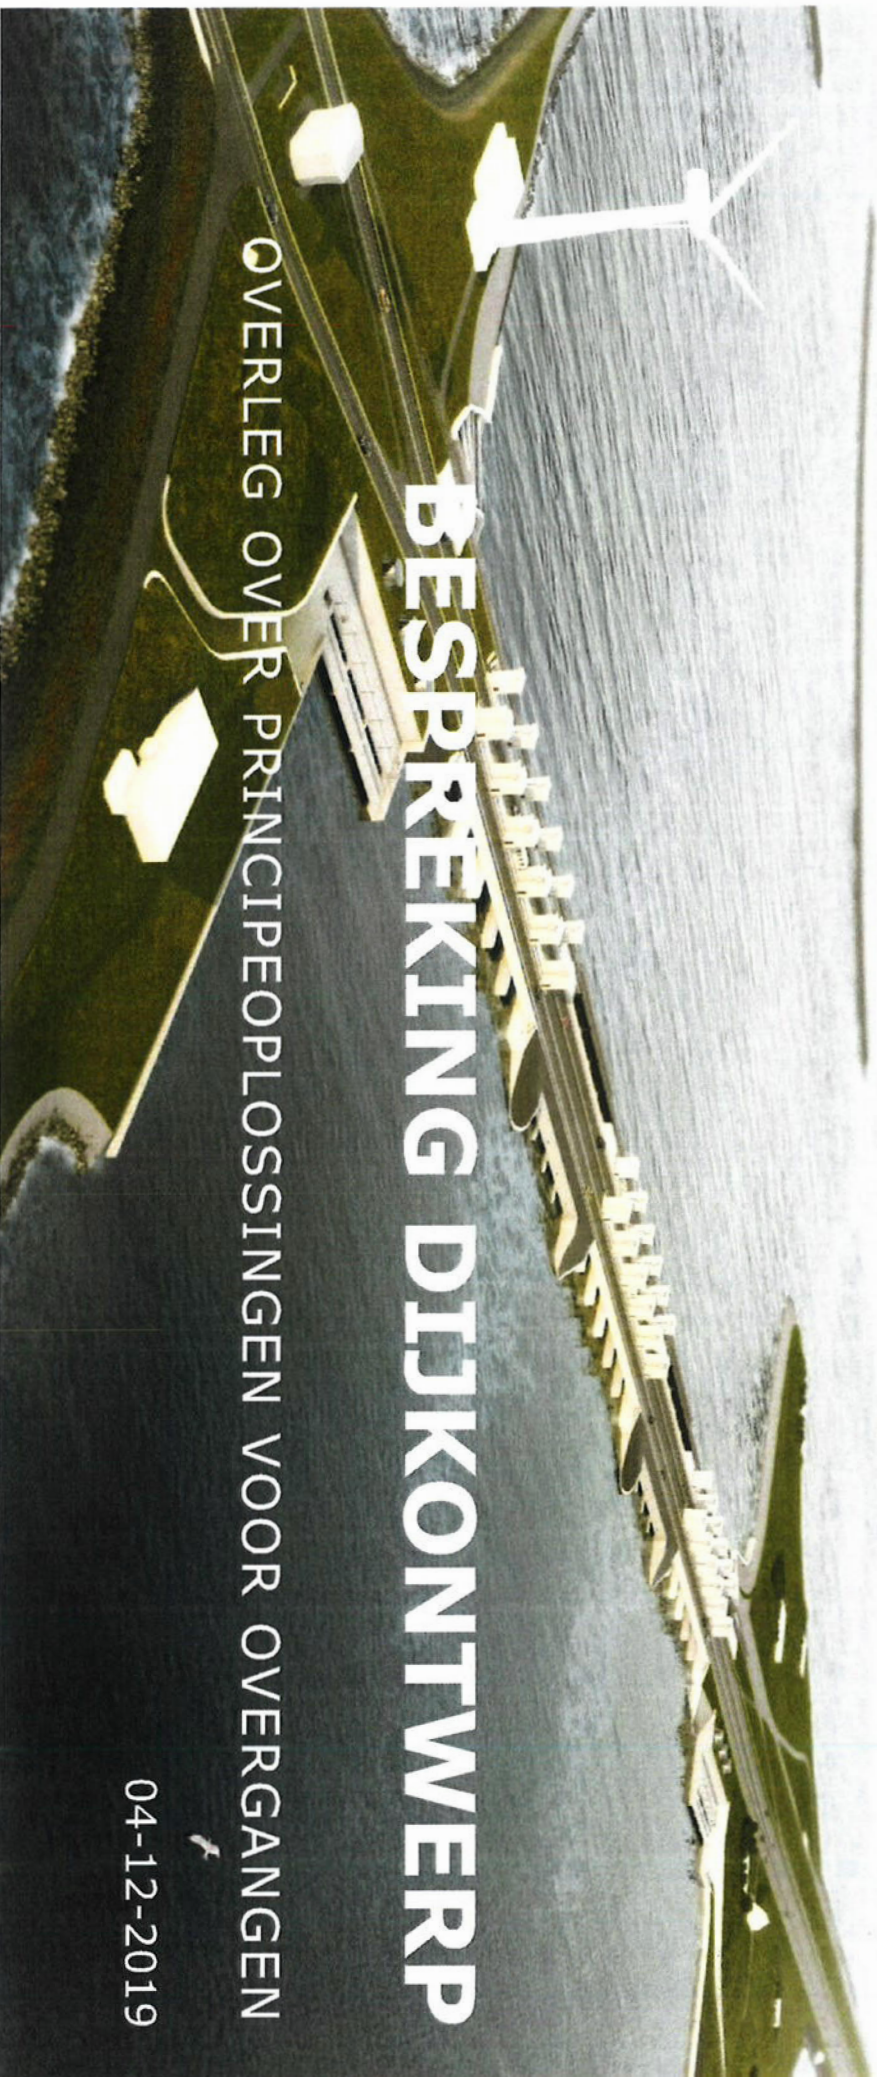



INHOUD

- ▷ Achtergrond
- ▷ Waterbouwkundig ontwerp
- ▷ Visualisaties
- ▷ Discussie

Samen. Sterker. Trots.



ACHTERGROND

*EPVE ontwerpuitgangspunt B: het dijklichaam blijft herkenbaar
als een strakke autonome lijn*

Samen. Sterker. Trots.



Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

LEVV3J

WATERBOUWKUNDIG ONTWERP




Samen. Sterker. Trots.



Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat


LEVI

WATERBOUWKUNDIG ONTWERP






DATE: 10/10/2019

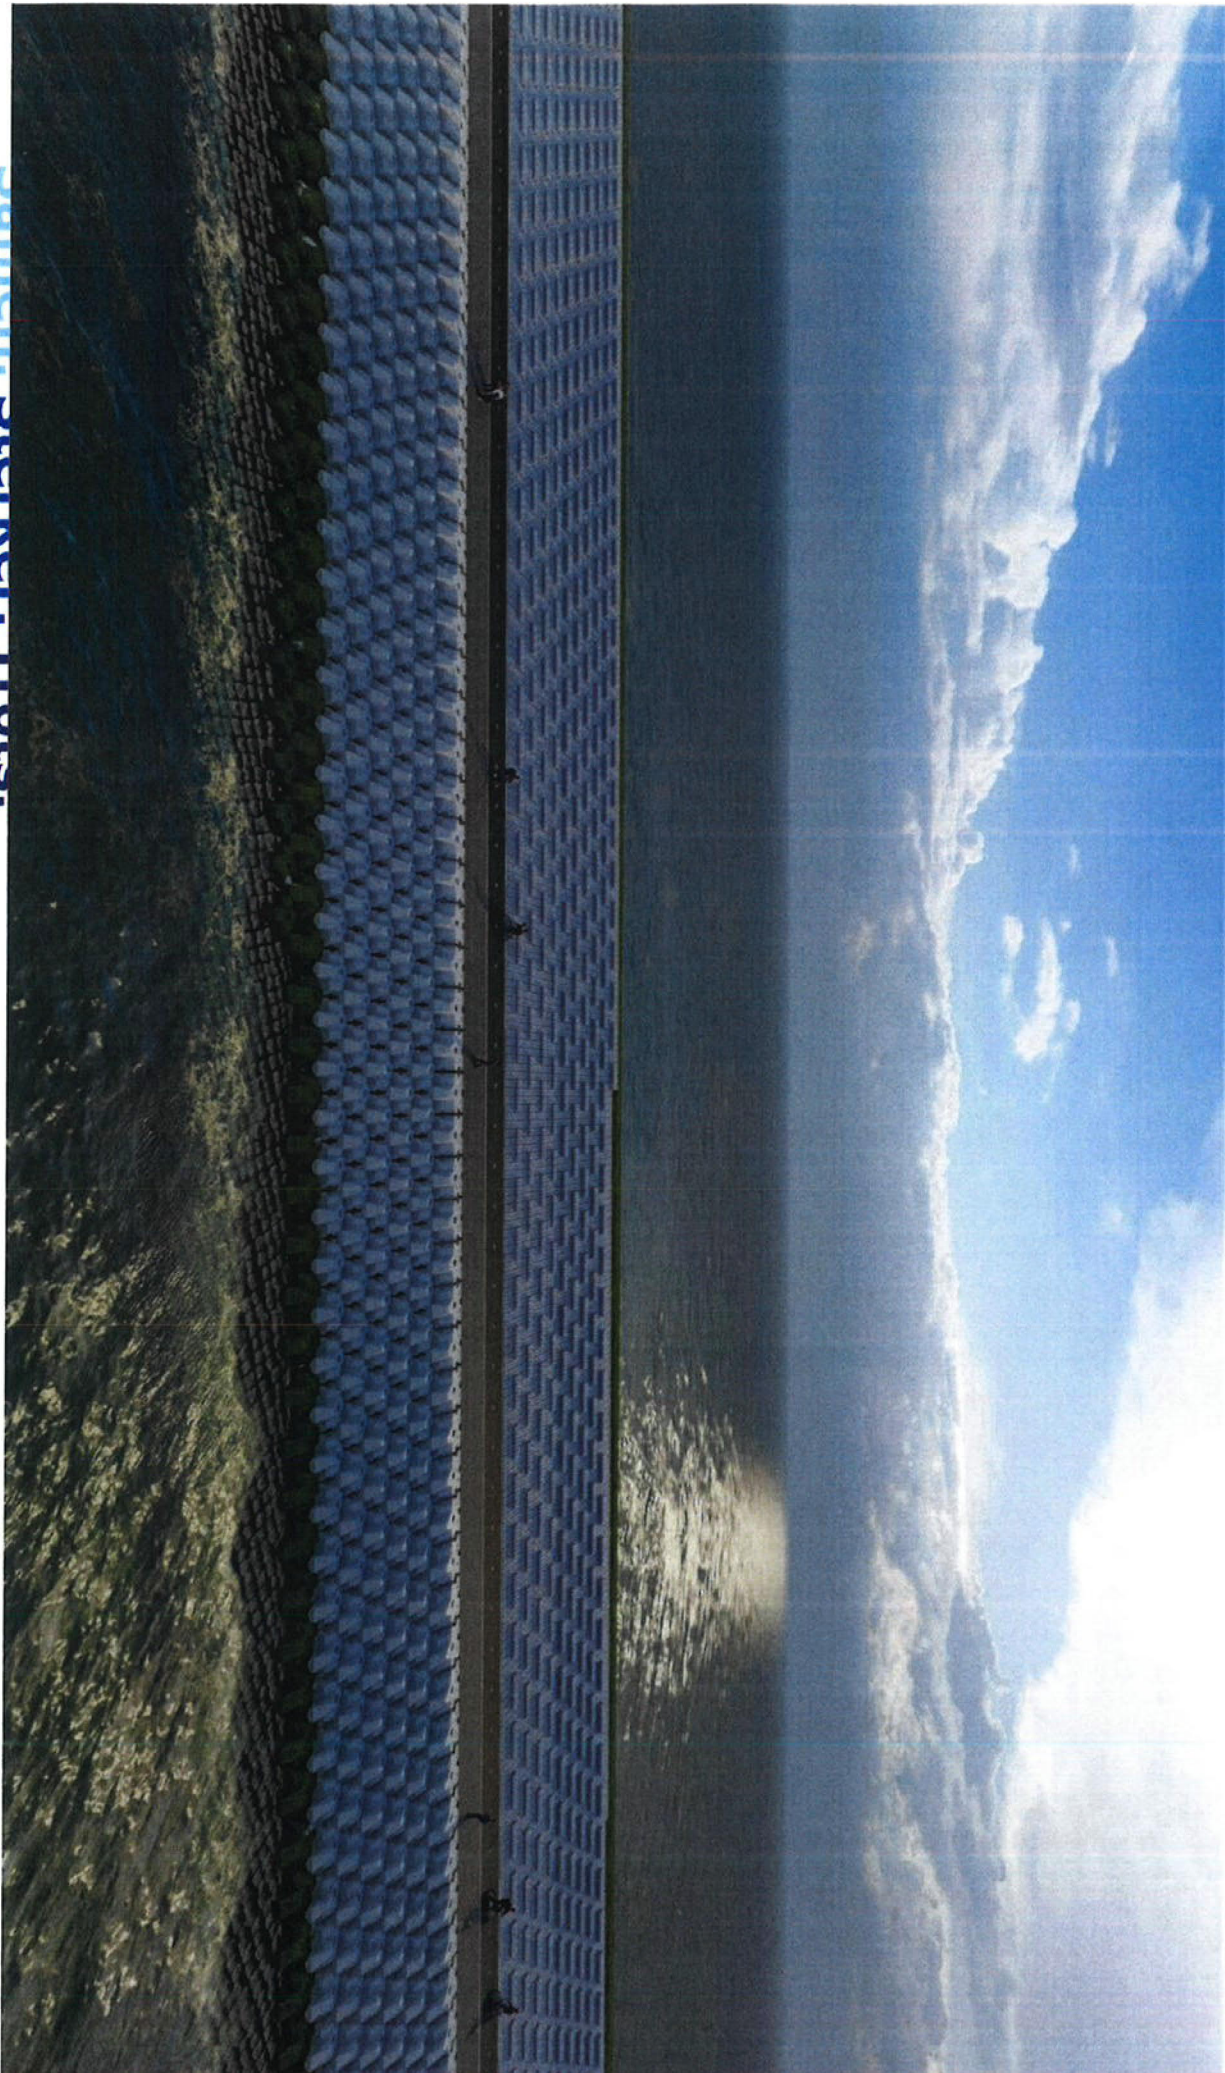

SEARCH: SEARCH: 1105.

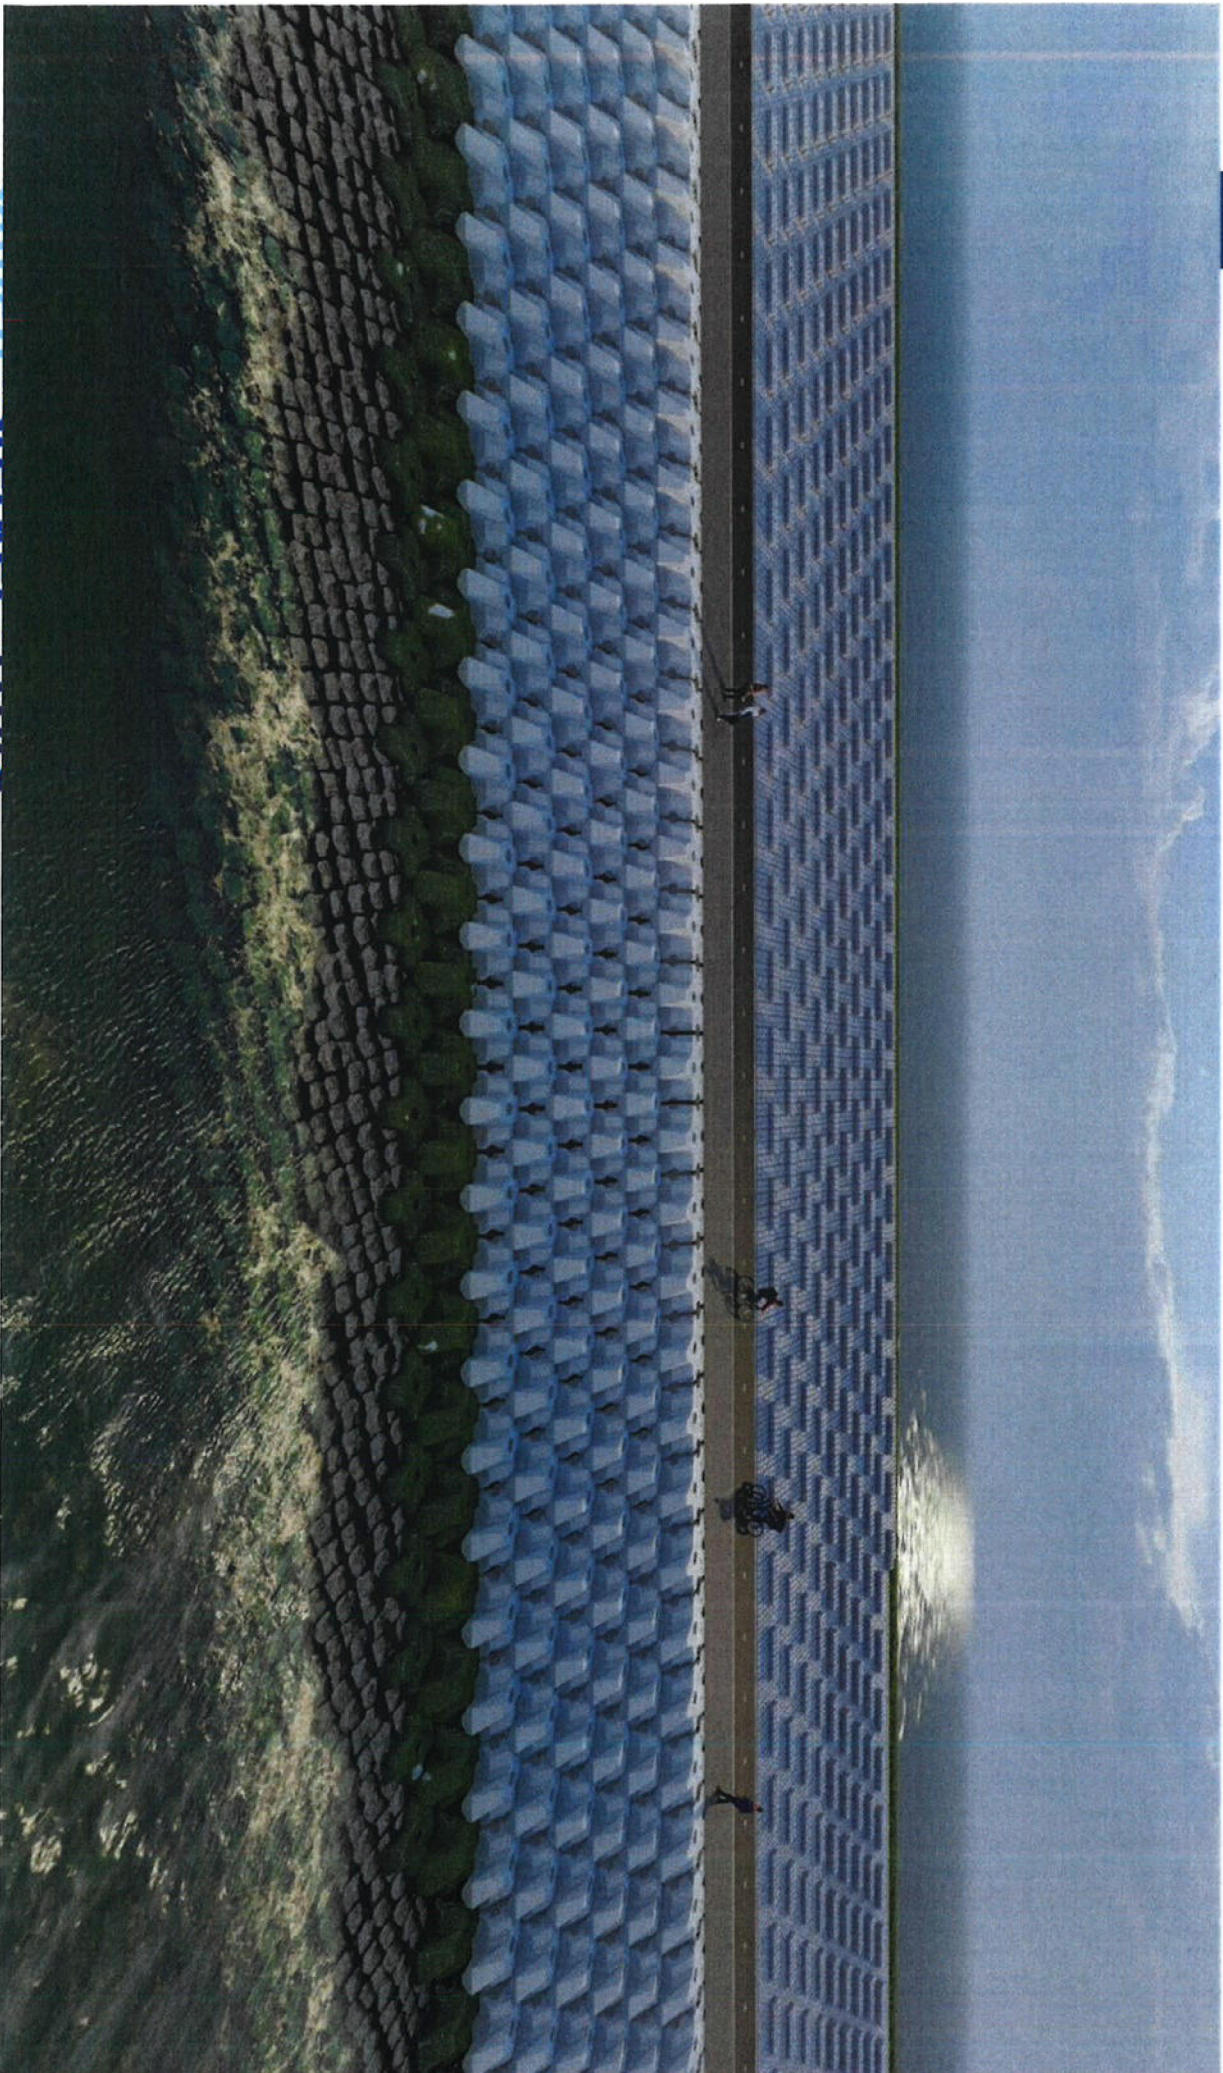

STADIUM SEATING TOWERS



PARCHE: SPECIFICITÀ.





CONCRETE STRUCTURES.




CONCRETE STRUCTURES





CONTRIBUTING TO THE

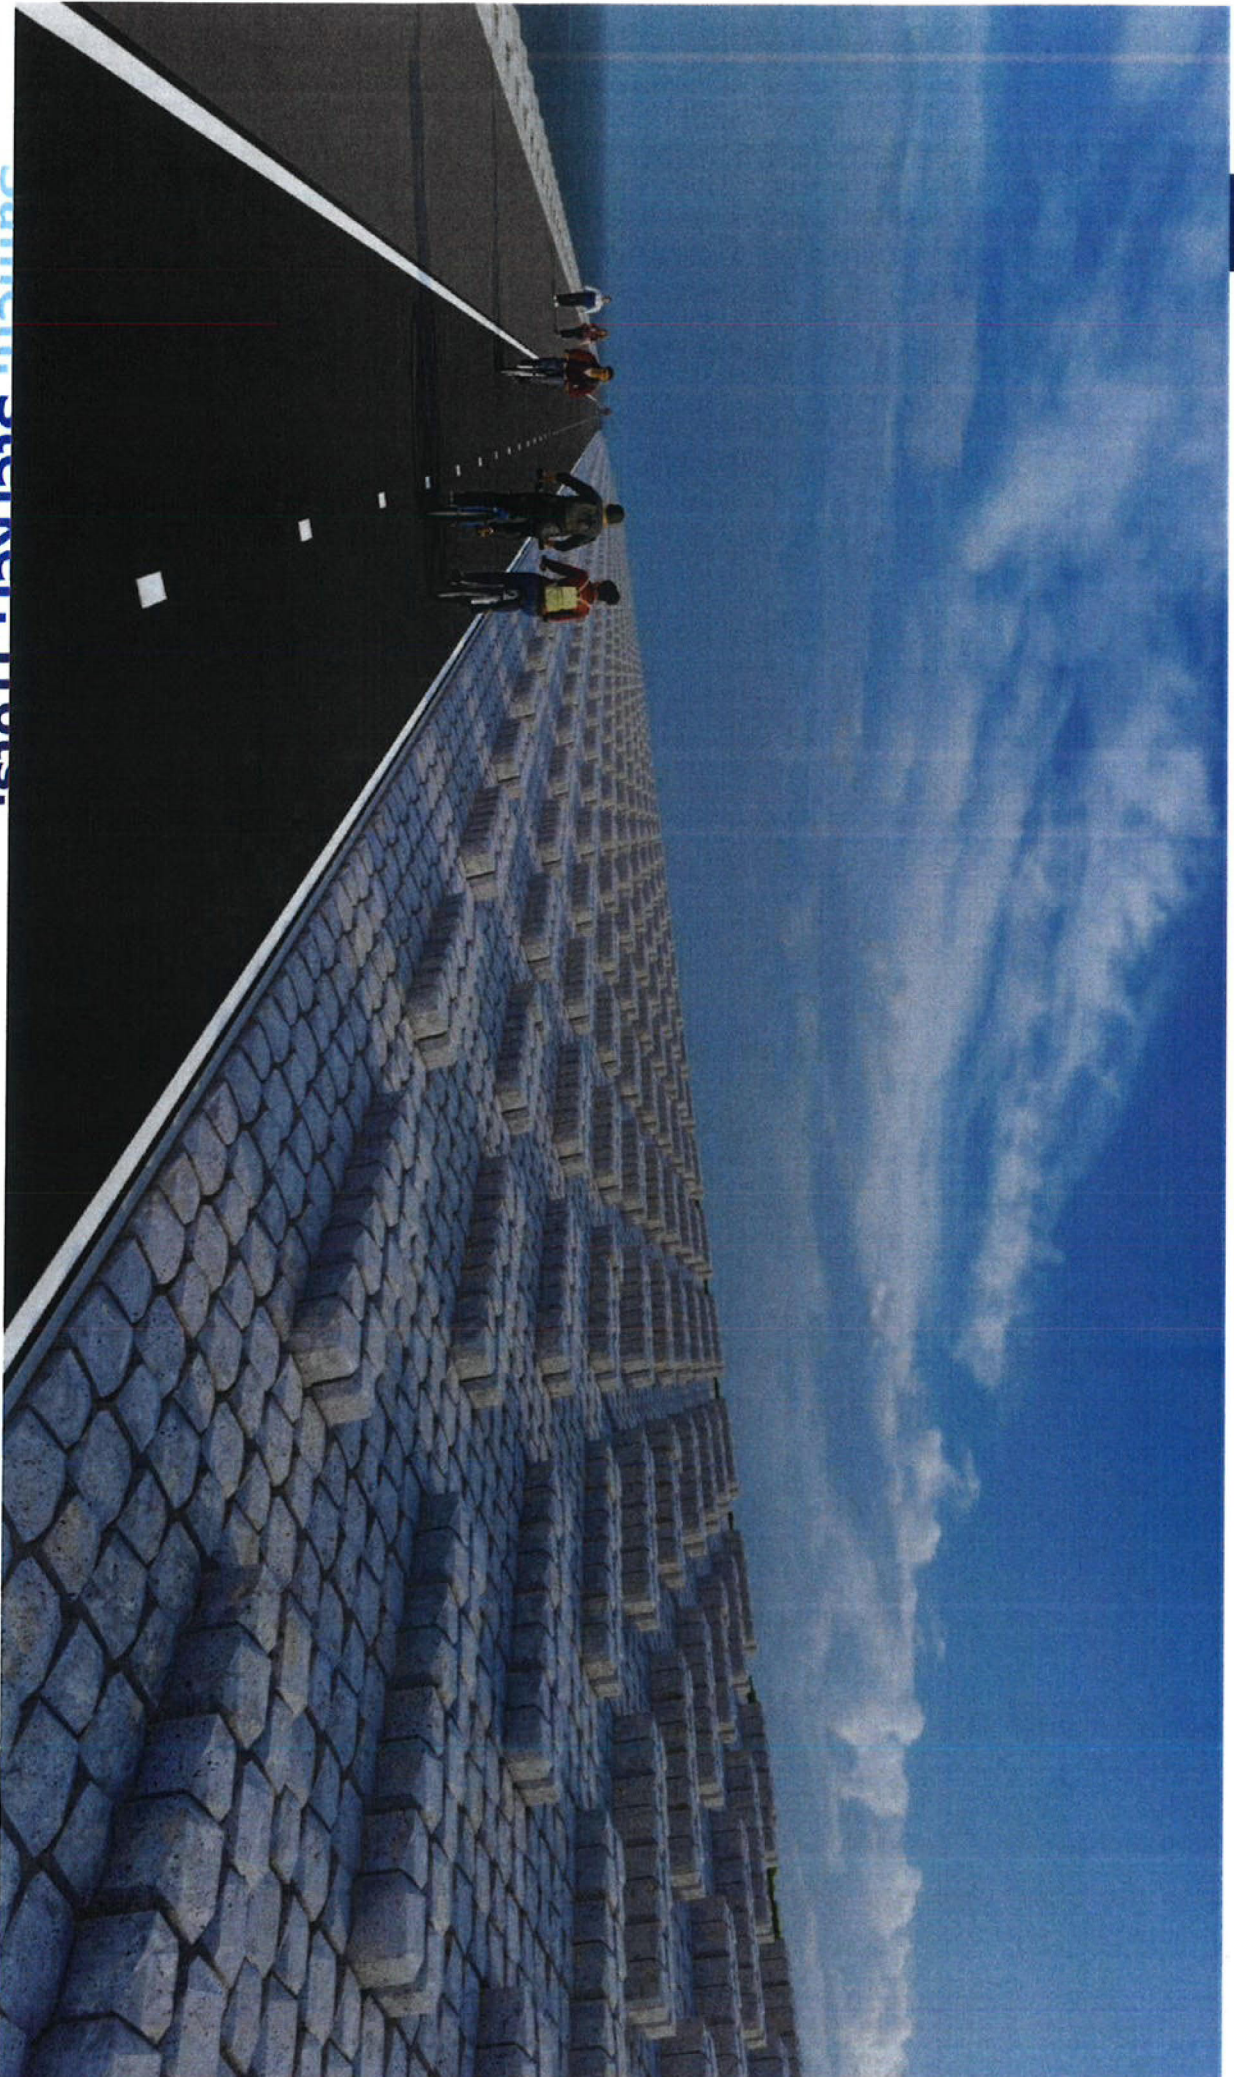

САНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТОВАРЫ



САНКТ-ПЕТЕРБУРГ



CONCRETE SURFACE FINISHES






Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat


LEVV3J

16

DIJKVAK 17

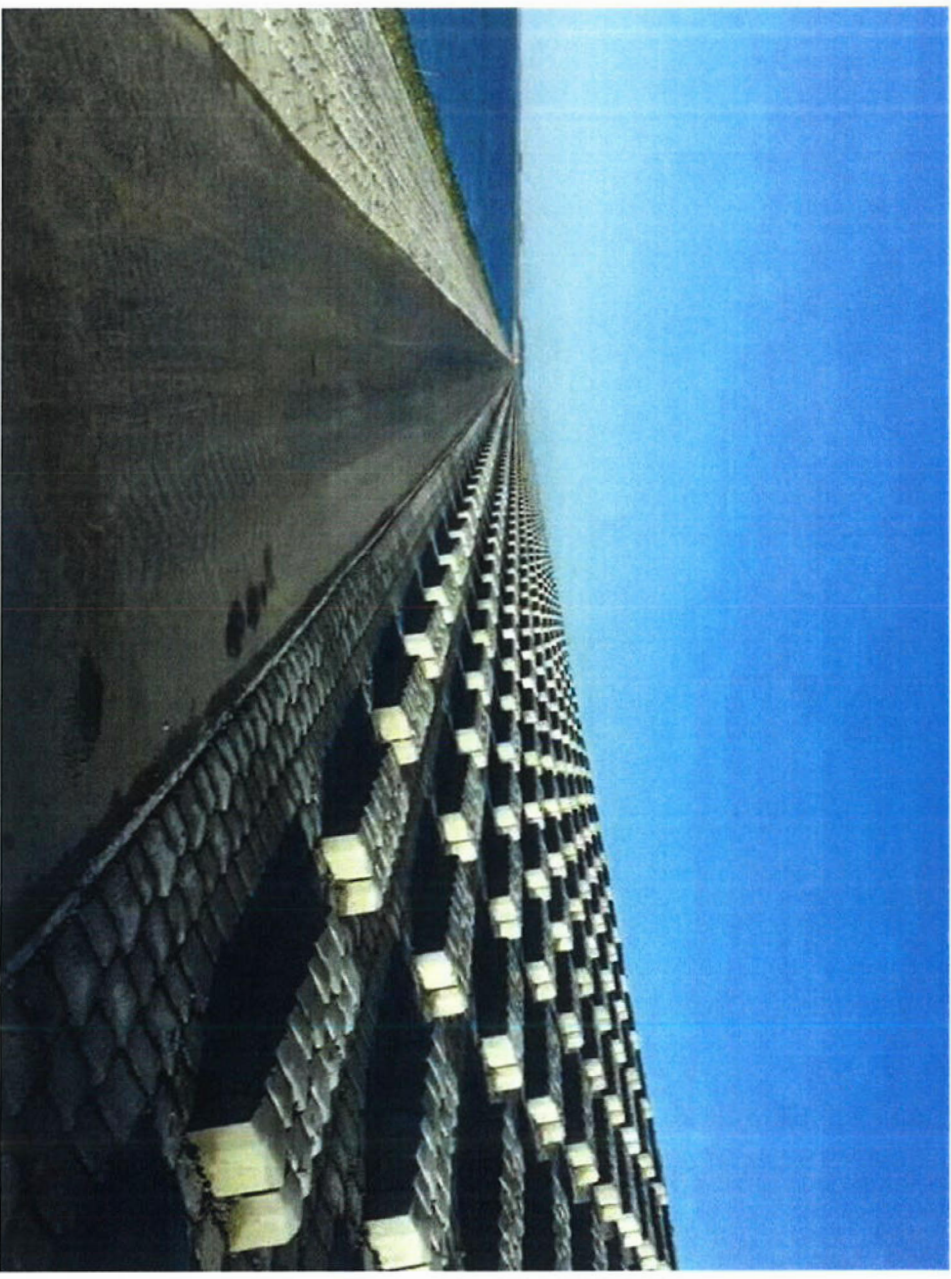


Samen. Sterker. Trots.

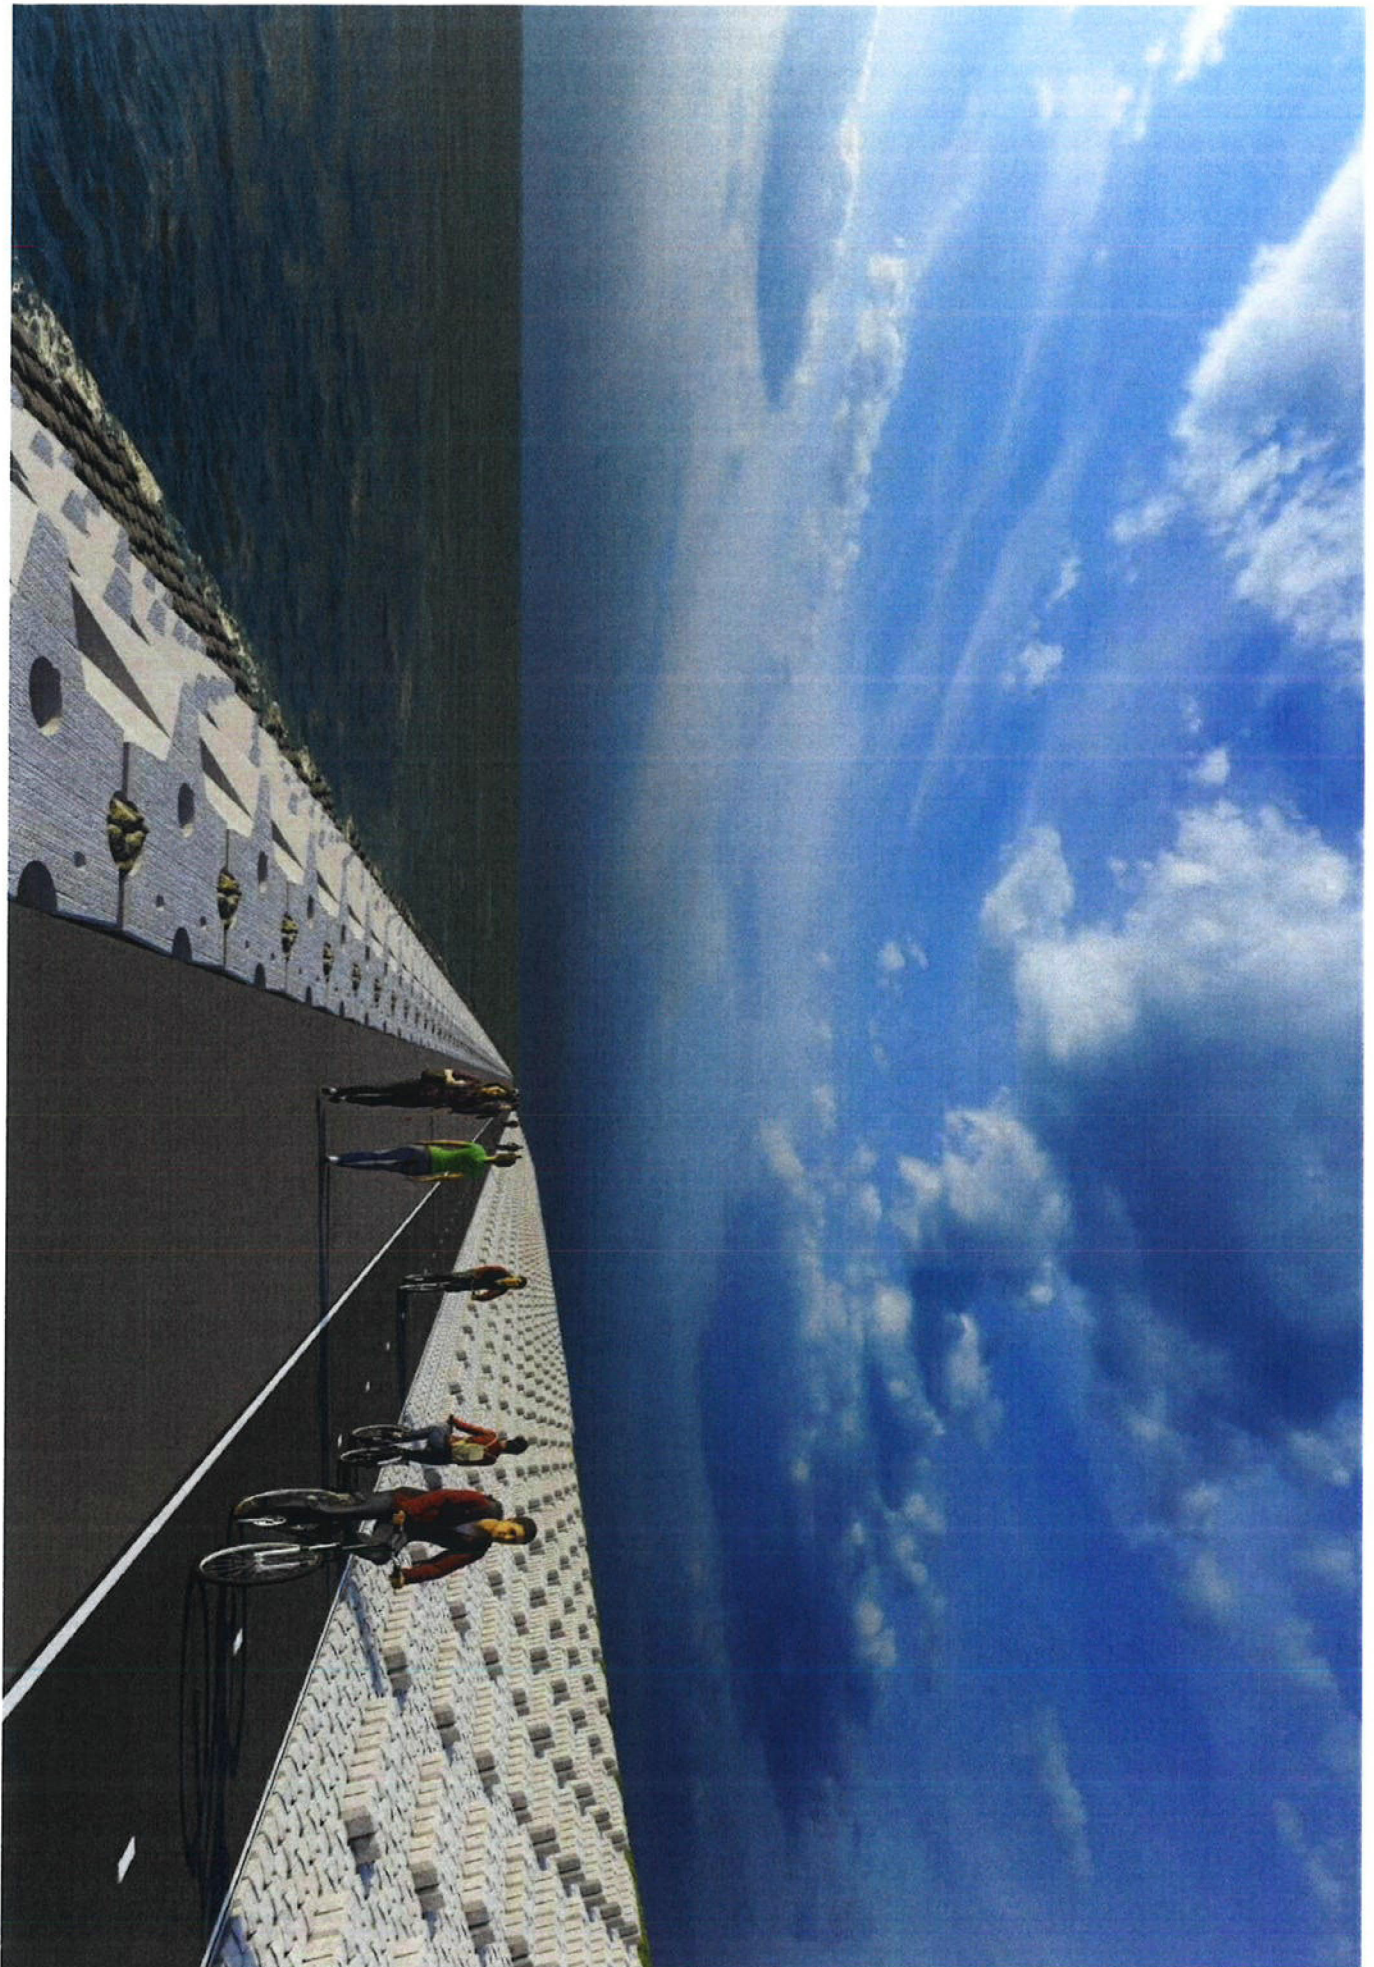



Schematisch overzicht bekleding Quattroblocks op
boventalud van dijk tussen knooppunten




Overzicht besluiten, afspraken en of wijzigingen die onder de reikwijdte van WOG HR vallen

Datum:
7-1-2020


Doc nr. ASD-VSL-0778

Nr	Onderdeel	Datum besluit	Vastgelegd in/Via
1	Instructie van RWS t a v. Bredara Bouwklinaan voor de nieuwe smilkkere in Den Oaver	27-3-2019	Verstae overloe "Hydraulische Randvoorwaarden" - "CONCEPT - Usselmeerzijde"
3	O b v. incrementele besluiten doorvoeren WOG HR (Geen ontwerp maken o.b.v. delta 1)	25-4-2019	Afspraak 1 in "Afspraken RWS-Lewel over de WOG Hydraulische Randvoorwaarden kunstwerken Usselmeerzijde"
11	WOG HR Usselmeerzijde Dijk -> toezegging dat WOG in de maak is	30-4-2019	- nog geen concept voorstel WOG via Postbus



<p>38 In navolging van afspraak 22 d.d. 1 juli 2019 en afspraak 15 d.d. 27 mei 2019 komen RWS en Lewvel overeen dat de opgetreden inefficiency kosten van Lewvel voor de periode van 15 december 2018 tot en met 31 mei 2019 (fase 1) een totaalbedrag van [redacted] De compensatie van deze inefficiency kosten zal middels een separate vaststellingsovereenkomst worden vastgelegd. Voor de Algemene Kosten is in de kostenstaat voorlopig 10,96% opgenomen. Dit percentage (en dientengevolge tevens het totaalbedrag) zal worden gecorrigeerd tot het, door middel van accountantsverklaringen van de EPC partijen aan te tonen, werkelijke percentage Algemene Kosten. Voor alle duidelijkheid wordt vermeld dat bovengenoemde overeengekomen compensatie geen vergoeding is voor gevolgkosten zoals bijvoorbeeld de vertraging in de uitvoering.</p> <p>In afspraak 22 d.d. 1 juli 2019 is de methode van verrekening van Fase 2 van 31 mei 2019 tot aan gereedkomen DO's ook overeengekomen. Daarbij is afgesproken dat de wijze van afrekenen van de inefficiency kosten voor deze periode door Lewvel en RWS nader wordt uitgewerkt en uiterlijk medio september wordt vastgelegd in een wederzijds geaccordeerde Werkwijze vaststelling Financieel Nadeel tot aan DO's WOG HR 7.0'.</p> <p>In navolging van deze afspraak dient daarbij primair een onderscheid te worden gemaakt tussen categorieën 'algemene staf' en 'specifieke staf'. Vervolgens dient binnen de categorie 'specifieke staf' de uitvoerende medewerkers (uitvoering en instandhouding), waarvan de werkzaamheden in hoofdzaak buiten plaatsvinden en die niet in de voorbereiding zijn betrokken, niet te worden doorrekend tenzij de werkzaamheden van deze subcategorie alsnog worden beïnvloed door de WOG HR 7.0.</p>	<p>17-7-2019</p>	<p>Afspraak 24 in "Afspraken RWS-Lewvel over de WOG Hydraulische Randvoorwaarden IJsselmeezijde"</p>
<p>39 [redacted]</p>	<p>17-7-2019</p>	<p>Afspraak 25 in "Afspraken RWS-Lewvel over de WOG Hydraulische Randvoorwaarden IJsselmeezijde"</p>

Buiten scope



--	--

	WOG HR 7.0 deel 3 : "Opdracht om uit te voeren" - uiterlijk 30 april 2020 volgt reactie van RWS waarin zij aangeeft of zij instemt met het voorstel tot Wijziging van Lewvel.		
	Bij deze structuur geldt voorts dat de eerder gemaakte afspraken tot nu toe in het kader van HR 7.0 onverkort van kracht blijven totdat in 'deel 2' of 'deel 3' eventueel vervangende afspraken gemaakt worden, danwel de bestaande afspraken worden herhaald.		
	Indien besluitvorming noodzakelijk is om aanvullende of gewijzigde Werkzaamheden conform planning 3b uit te voeren en WOG HR 7.0 'Deel 3' is nog niet overeengekomen zal dit separaat worden opgedragen.		
44	Afspraak 29: Staal inkoop Keerstuis Den Oever / Kornwerdstrand Om verdere vertragingen te voorkomen zal Lewvel op verzoek van RWS het staal voor de deuren van KS DOV en KS KWZ in Nederland c.q. West Europa inkopen in plaats van in Azië.	20-9-2019	Afspraak 29 in "Afspraken RWS-Lewvel over de WOG Hydraulische Randvoorwaarden IJsselmeerzijde
45	Afspraak 30: Communicatie RWS en Lewvel stellen uiterlijk 4 oktober een communicatiestrategie inclusief Q&A's op met betrekking tot HR 7.0.	20-9-2019	Afspraak 30 in "Afspraken RWS-Lewvel over de WOG Hydraulische Randvoorwaarden IJsselmeerzijde
46	Afspraak 31: Bevestiging gemaakte afspraken RWS bevestigt op verzoek van Lewvel dat alle eerder gemaakte afspraken, zowel in het directieoverleg als in het Contractoverleg van kracht zijn en zullen blijven.	28-10-2019	Afspraak 31 in "Afspraken RWS-Lewvel over de WOG Hydraulische Randvoorwaarden IJsselmeerzijde
47	Afspraak 32: Gemaakte afspraken Daar waar gemaakte afspraken later tot wragen leiden wordt aanvullend overleg gevoerd ten einde de afspraak uit te werken en verder SMART te maken.	28-10-2019	Afspraak 32 in "Afspraken RWS-Lewvel over de WOG Hydraulische Randvoorwaarden IJsselmeerzijde
48	Afspraak 33: Validatie Definitief ontwerp nieuwe spuitkokers Het op 1 mei 2019 vrijgegeven Definitief Ontwerp van de nieuwe spuitkokers is beschreven in document ASD-RAP-0850. Dit document is op 24 oktober in conceptvorm gedeeld met RWS. De validatie van dit Definitief Ontwerp zullen Lewvel en RWS uiterlijk op 4 november 2019 afronden. Met deze validatie wordt vastgesteld dat het ontwerp van Lewvel voldoet aan de contracteisen, in het bijzonder de Hydraulische Randvoorwaarden 6.2.	28-10-2019	Afspraak 33 in "Afspraken RWS-Lewvel over de WOG Hydraulische Randvoorwaarden IJsselmeerzijde
49	Afspraak 34: Voortgang ontwerp pwerzaamheden De HR 7.0 dienen vertraaid te worden in belastingen waar vervolgens het ontwerp op gebaseerd dient te worden. Dit is een nog lopend proces. Om verdere vertraging van het ontwerpproces te voorkomen heeft Lewvel ervoor gekozen het ontwerpen van verschillende kunstwerken te starten op basis van ingeschatte belastingen. RWS bevestigt dat dit een verstandige keuze is geweest. Indien later blijkt dat de berekende belastingen anders zijn, dient de impact hiervan beschouwd te worden. Daar waar de delta leidt tot Financieel Nadeel wordt dit vergoed door RWS.	28-10-2019	Afspraak 34 in "Afspraken RWS-Lewvel over de WOG Hydraulische Randvoorwaarden IJsselmeerzijde
50	Afspraak 35: WOG deel 2 RWS en Lewvel streven ernaar om WOG deel 2 zo snel mogelijk (en uiterlijk eind november) te ondertekenen. Om de periodieke vergoeding voor de uitwerking van WOG HR 7.0 deel 2 nog voor het eind van het jaar betaald c.q. in gang te kunnen zetten, zullen RWS en Lewvel uiterlijk 20 november overeenstemming bereiken over de financiële omvang (kostenverrekening conform afspraak 22 en 24) van deze vergoeding.	28-10-2019	Afspraak 35 in "Afspraken RWS-Lewvel over de WOG Hydraulische Randvoorwaarden IJsselmeerzijde
51	Afspraak 36: Q&A lijst voor vragen externe partijen RWS verstrekt Lewvel uiterlijk 4 november een Q&A lijst met als doel gezamenlijk dezelfde boodschap te kunnen communiceren over de WOG HR 7.0 indien hier door externe partijen (bijvoorbeeld leveranciers en onderaannemers van Lewvel) vragen over worden gesteld.	28-10-2019	Afspraak 36 in "Afspraken RWS-Lewvel over de WOG Hydraulische Randvoorwaarden IJsselmeerzijde
52	Afspraak 37: planning uitwerking WOG deel 2 RWS en Lewvel zullen de planning van de uitwerking van WOG deel 2 uiterlijk 8 november overeenkomen.	28-10-2019	Afspraak 37 in "Afspraken RWS-Lewvel over de WOG Hydraulische Randvoorwaarden IJsselmeerzijde

57	Vooruitlopend op de overeengekomen WOG is binnen het Lewel-consortium Hycom gestart met het ontwerp van powerpacks om planningsvariant 3b mogelijk te maken	11-12-2019	Besproken tussen [redacted]	8-11-2019
57	Afspraak 38: [redacted] an het dashboardoverleg verbeteren. Doel hiervan is stabiliteit brengen in de uitgangspunten voor het ontwerp, zodat het ontwerpproces in rustige vaarwater komt.	26-11-2019	Afspraak 38 in "Afspraken RWS-Lewel over de WOG Hydraulische Randvoorwaarden IJsselmeerzijde (directieoverleg)	
57	Afspraak 39: Deze week gaan de teams nog eens om de tafel om tot overeenstemming te komen over de kostenverrekening van fase 2 (WOG HR) en een definitief AK% dat we bij Financieel Nadeel kunnen hanteren. Als hier de teams toch niet lukt om tot overeenstemming te komen, escaleren we begin volgende week en zullen [redacted] een klap op geven".	26-11-2019	Afspraak 39 in "Afspraken RWS-Lewel over de WOG Hydraulische Randvoorwaarden IJsselmeerzijde (directieoverleg)	
57	Afspraak 40: [redacted] maken welke verbeteracties er lopen bij Lewel ten behoeve van kwaliteit en veiligheid.	26-11-2019	Afspraak 40 in "Afspraken RWS-Lewel over de WOG Hydraulische Randvoorwaarden IJsselmeerzijde (directieoverleg)	
57	Afspraak 41: [redacted] gaan een voorstel maken voor een "erande organisatie".	26-11-2019	Afspraak 41 in "Afspraken RWS-Lewel over de WOG Hydraulische Randvoorwaarden IJsselmeerzijde (directieoverleg)	
57	Afspraak 42: [redacted] an een voorstel doen voor het expliciet werken aan vrouwen.	26-11-2019	Afspraak 42 in "Afspraken RWS-Lewel over de WOG Hydraulische Randvoorwaarden IJsselmeerzijde (directieoverleg)	

Memo

Aan Technisch Management, Contract Management

Kopie aan

Van

Datum ~~19-sep-2019~~ 12-nov-2019


Documentnr. ASD-NOT-0831

Blad 1 van 6

Onderwerp 2^{de} voorstel tot invoeren van een keuringsrapport tbv de faaldefinities voor het instandhouden van het vaarwegprofiel

Buiten scope

Voorstel ter akkoord aanpassen Bieden Vaarwegprofiel van AD - BD




Datum ~~19-sep-2019~~ 12-nov-2019

Documentnr. ASD-NOT-0831

Buiten scope

Blad 2 van 6




Datum ~~19-sep-2019~~ 12-nov-2019

Documentnr. ASD-NOT-0831

Blad 3 van 6

Buiten scope



Datum ~~19-sep-2019~~ 12-nov-2019

Documentnr. ASD-NOT-0831

Buiten scope

Blad 4 van 6



Datum ~~19-sep-2019~~ 12-nov-2019



Documentnr. ASD-NOT-0831



Blad 5 van 6

Bijlage 1. Grafieken en peilingen Den Oever

Datum ~~19-sep-2019~~ 12-nov-2019
Documentnr. ASD-NOT-0831
Blad 6 van 6

Bijlage 2. Grafieken en peilingen Kornwerderzand

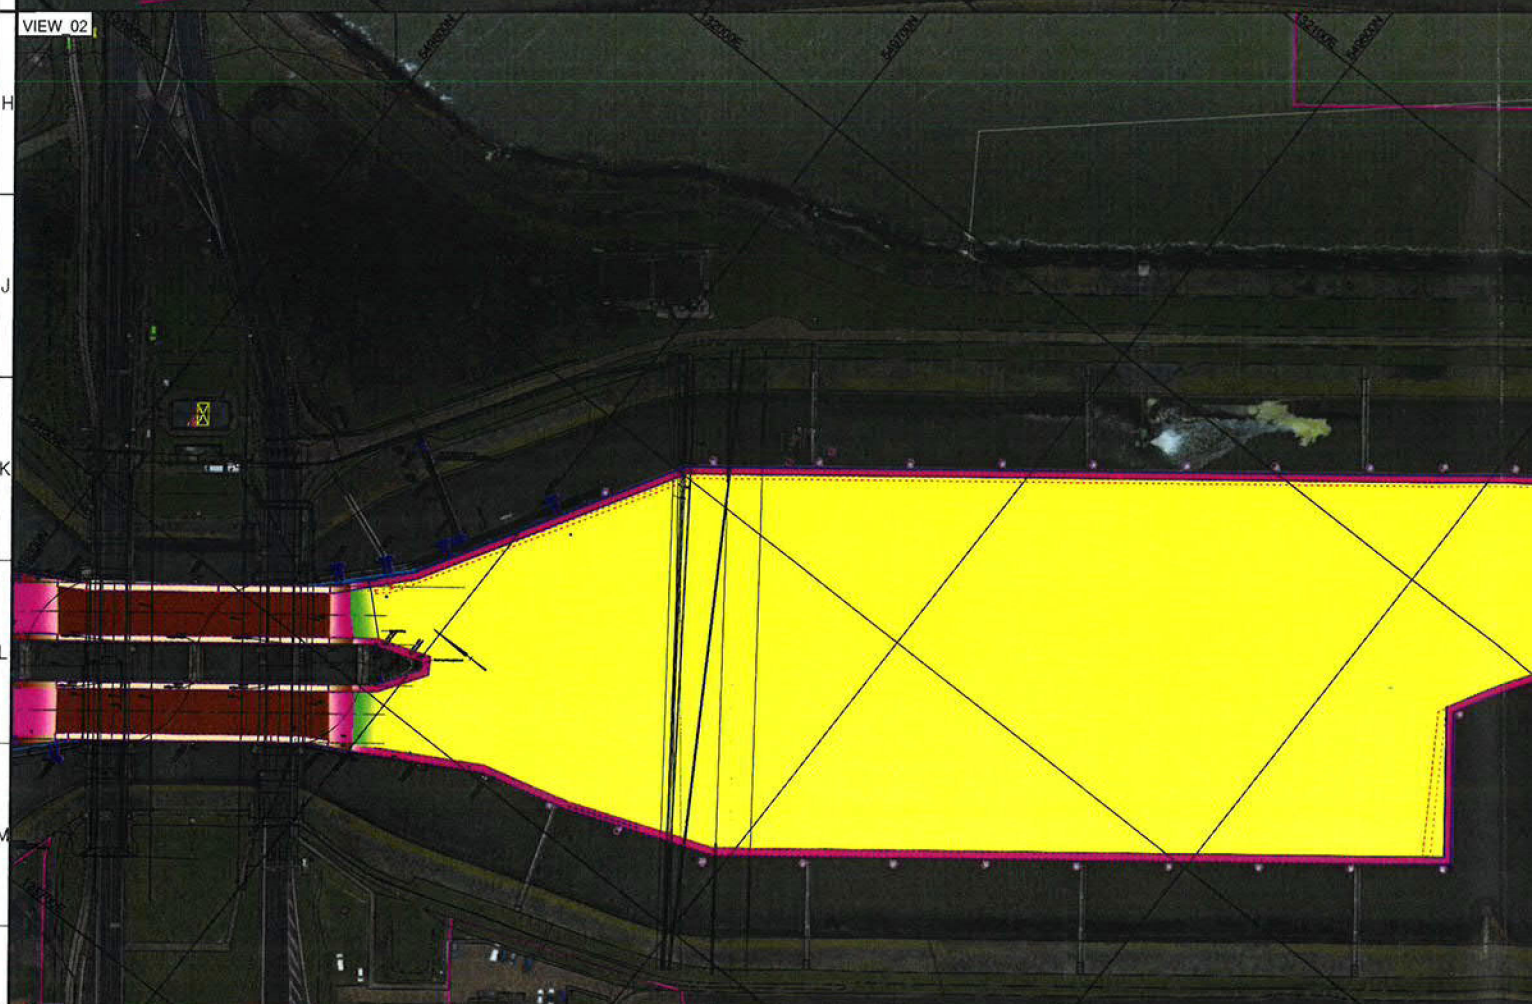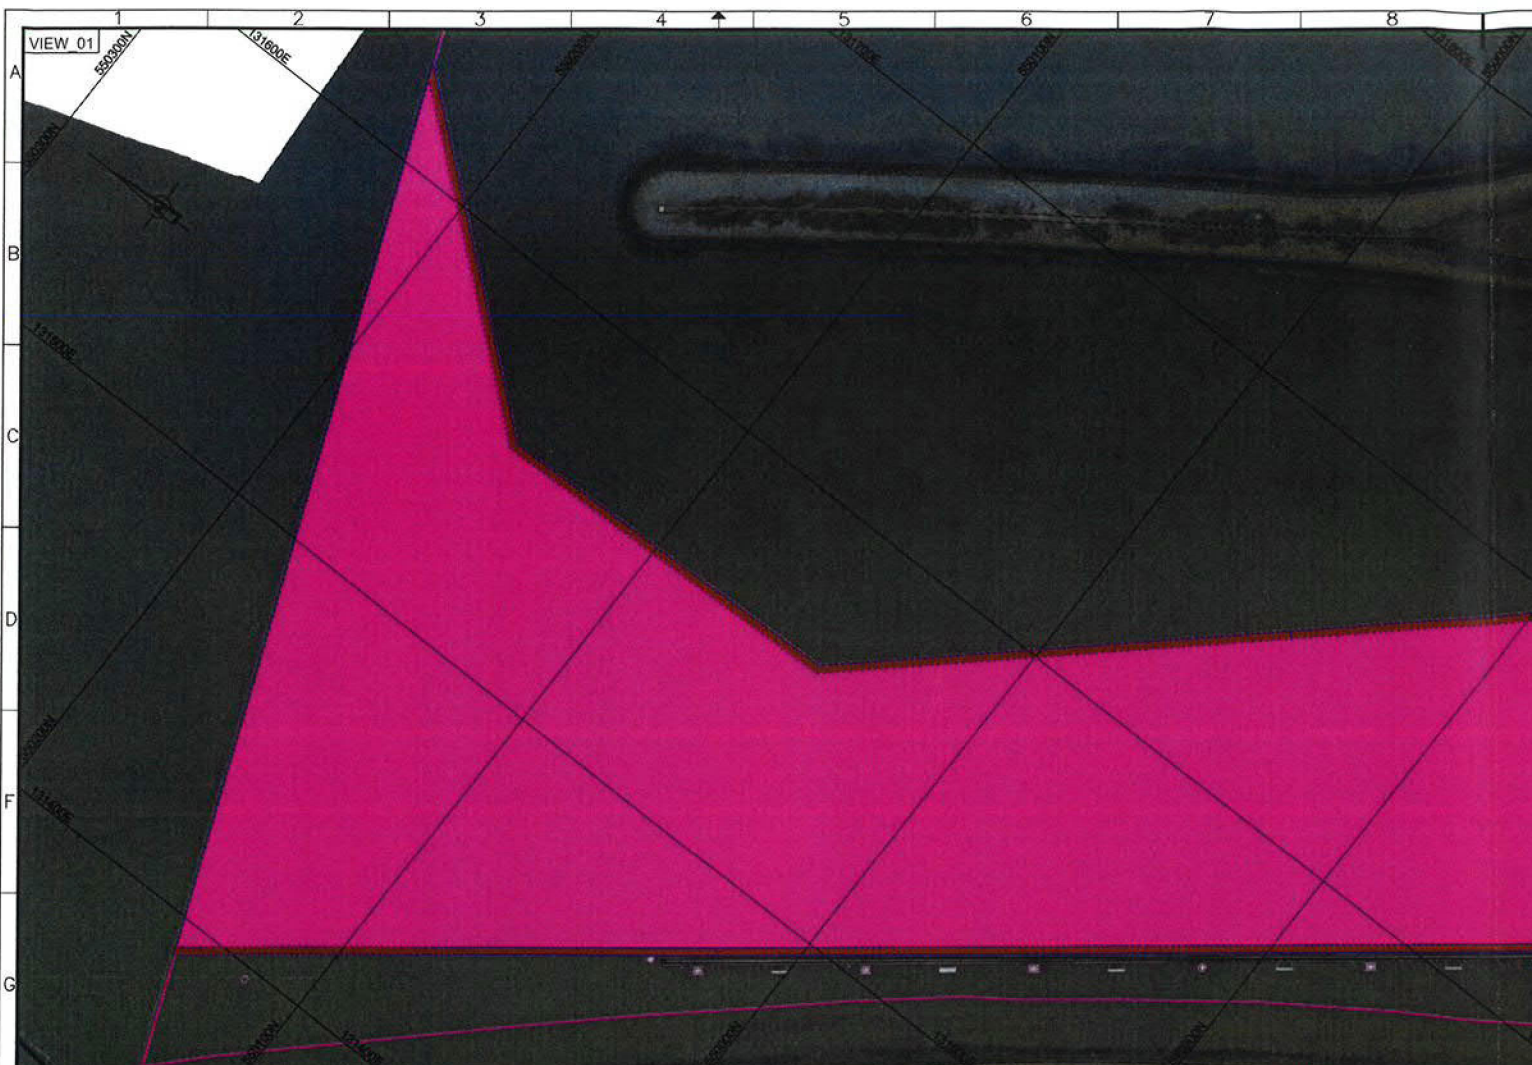

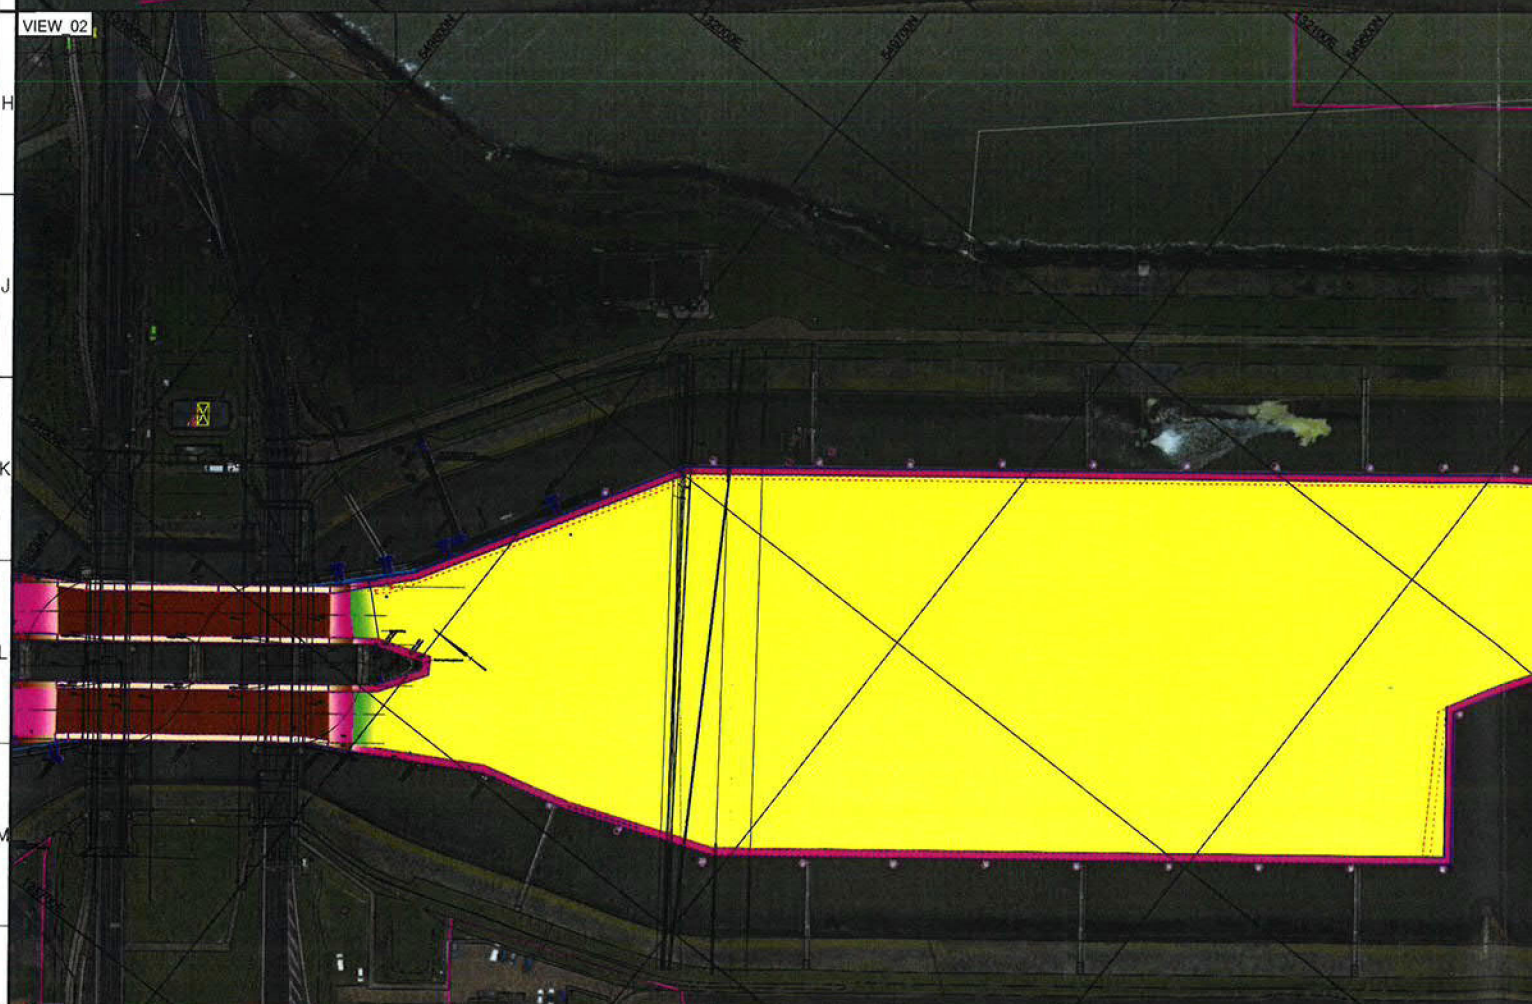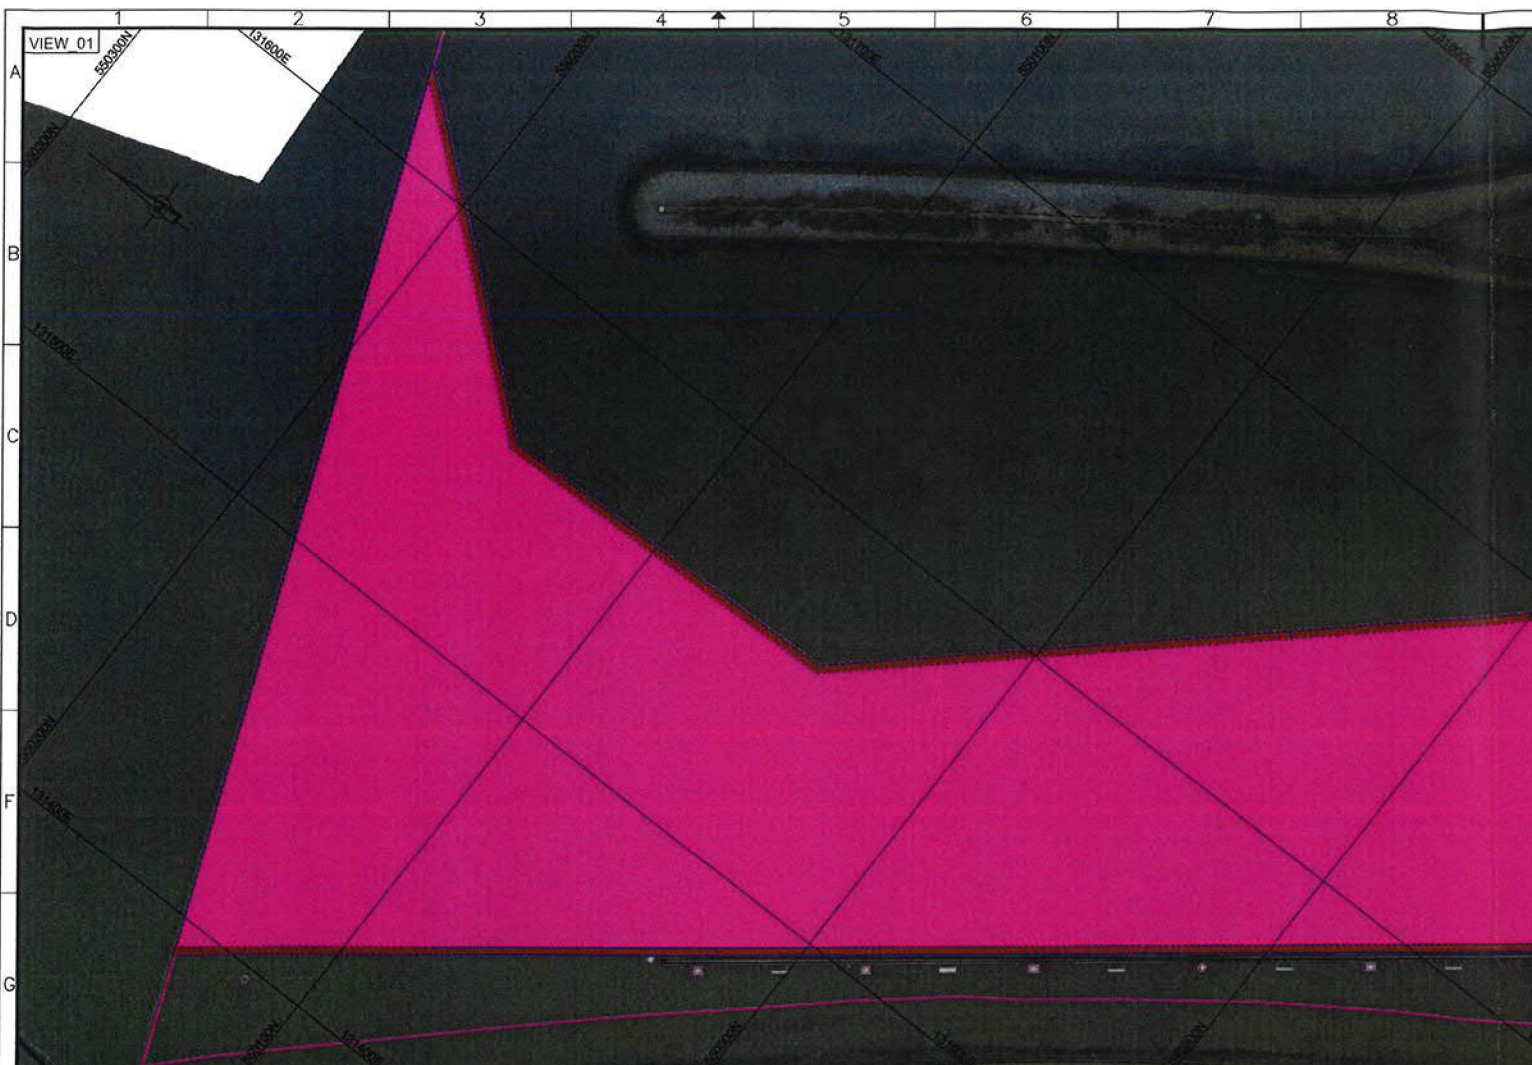

VIEW 01



VIEW 02

