



Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

LEVEE

LELY'S ERFGOED VEILIGGESTELD



PROJECT AFSLUITDIJK

DIRECTIE OVERLEG

Woensdag 17 juli 2019



AGENDA:

1. Stand van zaken
 - Voortgang werkzaamheden in uitvoering
 - Terugblik sinds 1 juli → goede stappen gemaakt / positief


2. Uitwerking n.a.v. afspraken van 27 mei / 1 juli jl.
 - In-efficiency tot 31 mei 2019
 - In-efficiency tot gevalideerd DO

3. Planning
 - Resultaten
 - Hoe verder


Samen. Sterker. Trots.



Stand van zaken “DBFM Afsluitdijk”

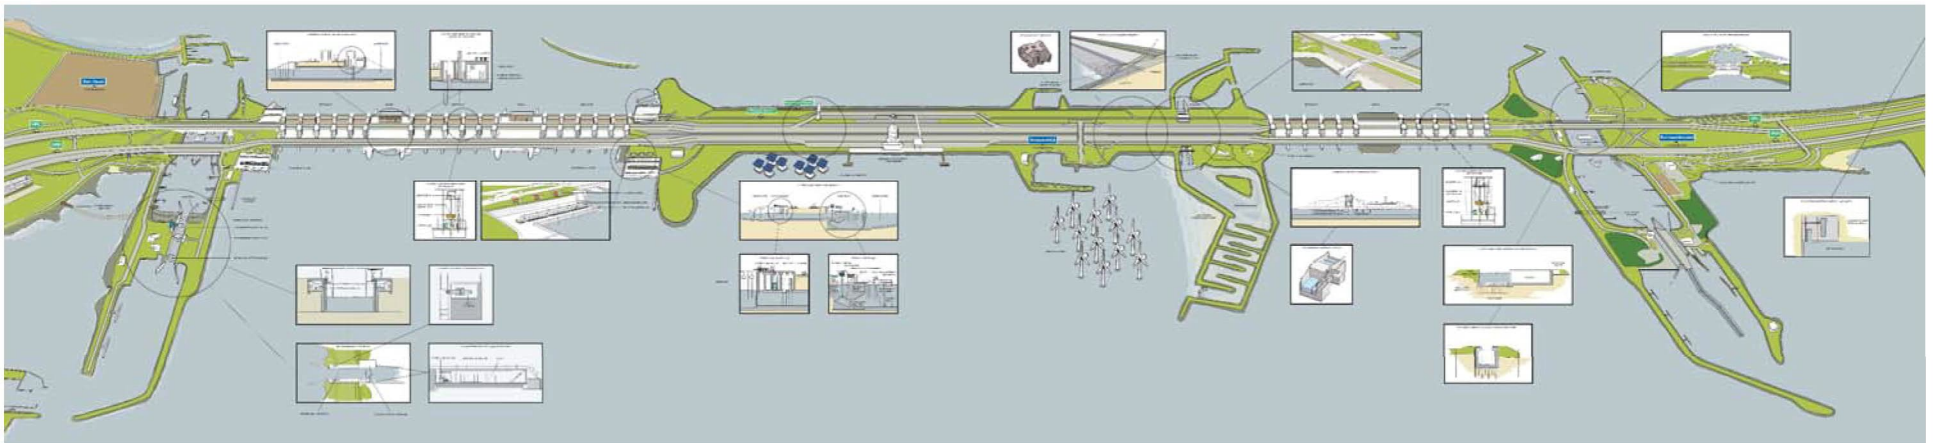


Samen. Sterker. Trots.

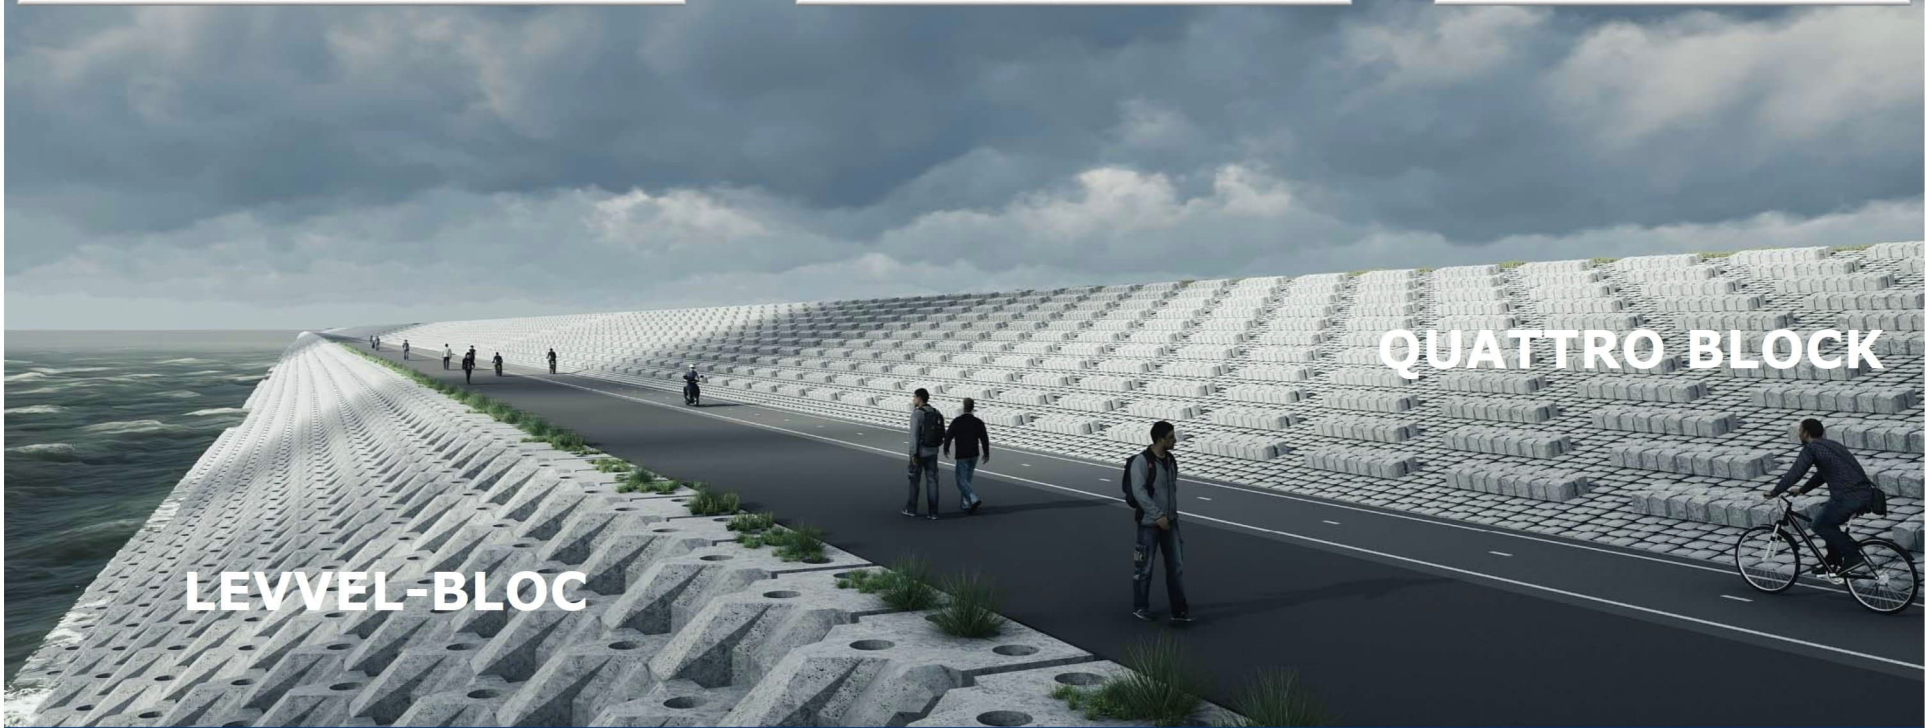

LEVEL-BLOC

QUATTRO BLOC



Type 1 (20km)

Type 2 (4km)



DAM D15



DIJKVAK 17



KOSTEN VERREKENING



KOSTEN VERREKENING

- De verrekening over periode tot 31 mei 2019:
 - Volledig budget ontwerp en staf retour
 - Werkelijke kosten ontwerp en staf opgevoerd
 - ✓ Minus: 'eigen issues' en 'eigen in-efficiency'
 - Na onderhandeling overeenstemming over compensatie bedrag.

Samen. Sterker. Trots.



PERIODE 31 MEI – GEREEDKOMEN DO'S

- Een principe afspraak over de methode van verrekenen
- Nadere uitwerking methode nodig → m.n. onderverdeling staf
- Medio september overeenkomen

Samen. Sterker. Trots.



PLANNING



RESULTAAT

- N.a.v. 1^e analyse van de planningsconsequenties voor 1 juli:
 - Variant 1: zonder mitigerende maatregelen
 - 24 mnd vertraging (2x3 mnd ON & OG buffers nog aanwezig)
 - Variant 2: na BD uitvoeren NSM spuikokers
 - 27 mnd vertraging (idem buffers)
- Afgelopen weken hard gewerkt o.a. gezamenlijke analyse haalbaarheid 'planningsknoppen'

Samen. Sterker. Trots.



RESULTAAT


- 'Unlimited' variant:
 - → 6 mnd vertraging (idem buffers)
- Variant 3: 'loslaten EMVI beloften + wegfaseringseisen'
 - → 11 mnd vertraging (idem buffers)
- Variant 4: idem 3 + spuicapaciteit 40% + spuigroepen KWZ dicht
 - → 10-11 mnd vertraging (idem buffers)
- Lijkt mogelijk de vertraging te beperken tot 10 – 15 mnd
 - → nog groot aantal onzekerheden / disclaimers van toepassing

Samen. Sterker. Trots.

Management samenvatting Projectplanning (variant 3/loslaten EMVI beloftes)

zelfstandig leesbaar a3 netwerkschema cf. ME_01041

versie V3
Datum: 15-07-2019

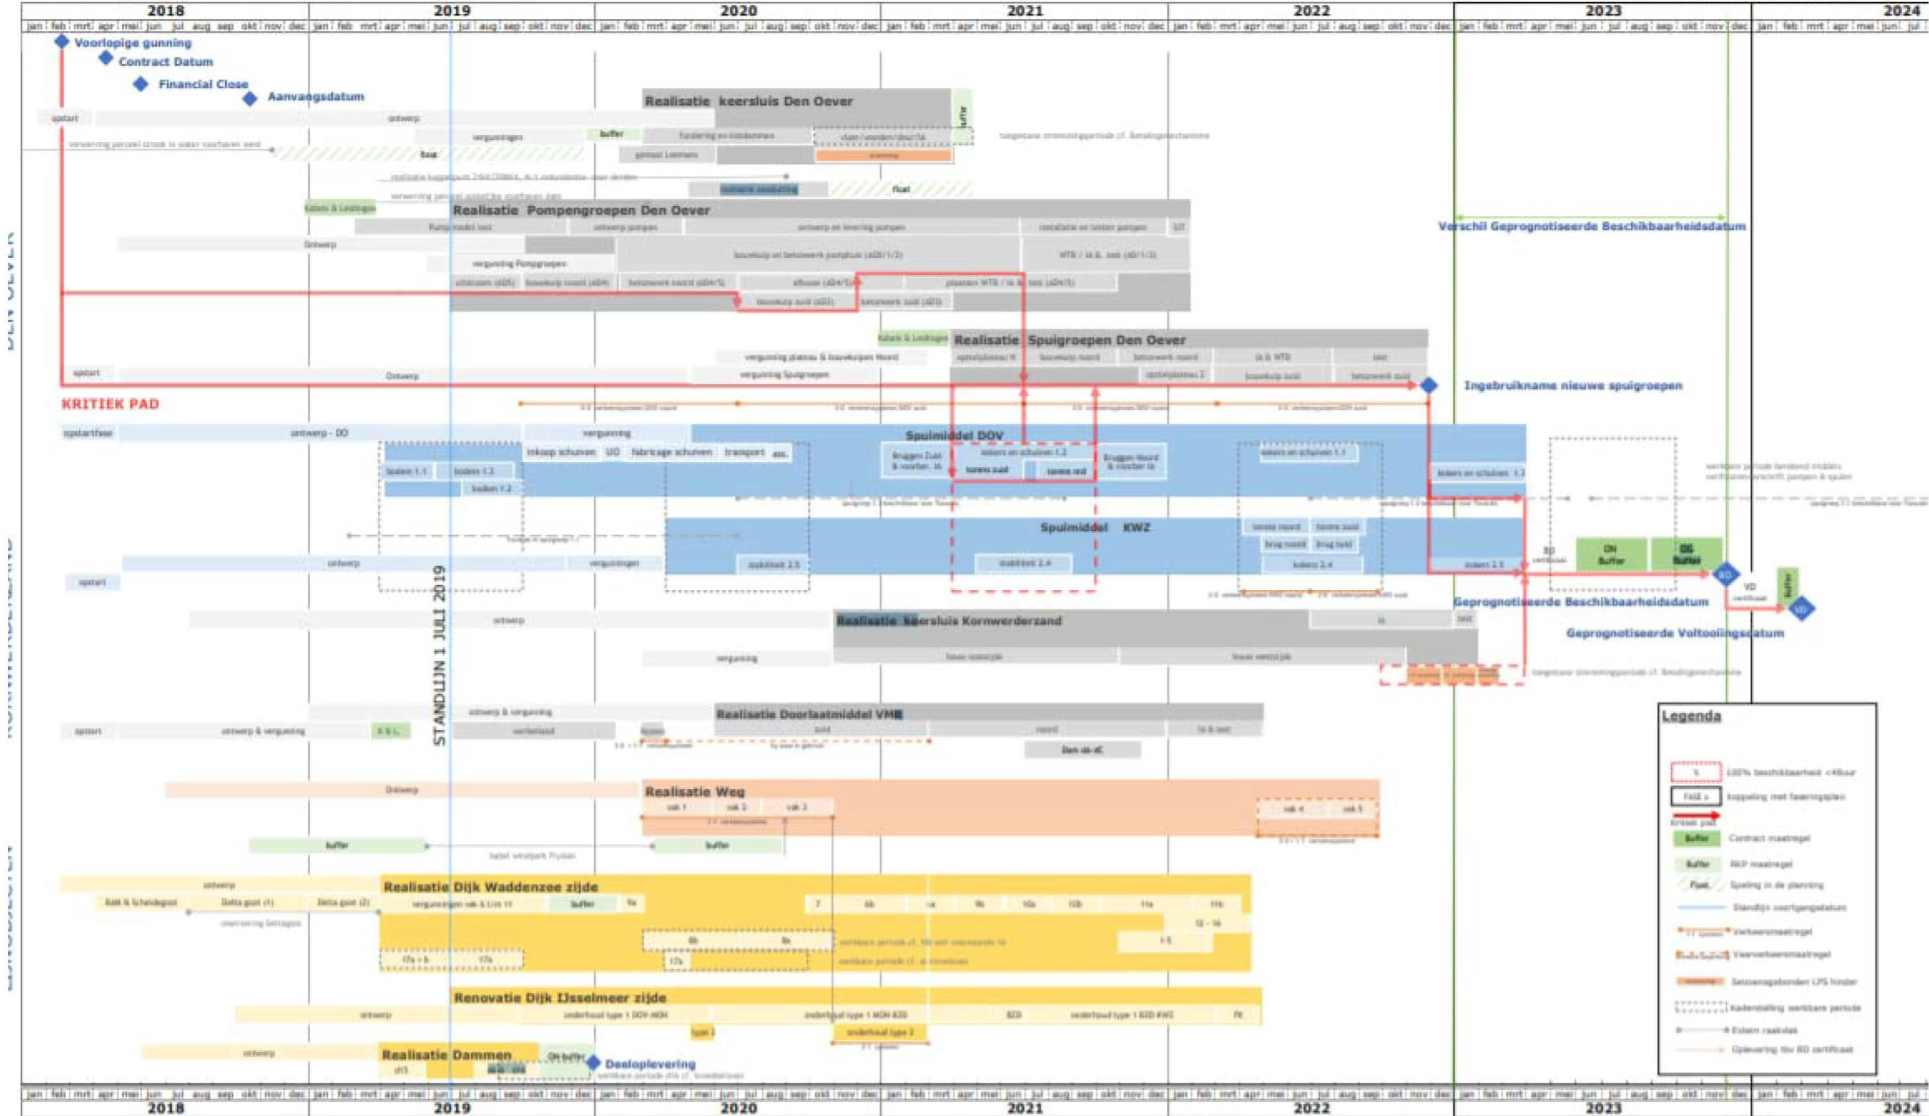



HOE VERDER:

In 'continue' afstemming met elkaar z.s.m. DO's afronden:

- Impact ontwerpplanning begin aug '19
- Check's in overall planning (Primavera) eind aug '19
- Nadere analyse & afstemming optimalisaties eind sept '19
- Eerste zicht baseline uitvoeringsplanning medio okt '19
- Freeze ontwerpuitgangspunten/concept NSM (SO) eind sept '19
- DO's gereed eind '19
- Finale nieuwe baseline Projectplanning Q1 '20

Samen. Sterker. Trots.



HOE VERDER:

- Zorgen over capaciteit
- Lijst met kritische beslissingen Levvel opstellen:
 - → bv. inkoop staal (ontwerp / bouw) in Nederland;
- Inbouwen prikkels
- Informeren achterban / banken / verzekeraars ?
 - → afspraken over communicatie

Samen. Sterker. Trots.
