

DIRECTIEOVERLEG RWS-LEVVE

Foto: Levvel-bloc opslag in Harlingen (maart 2020)

12 j

AGENDA



Buiten scope

- ▷ Voortgang VtW HR 7.0
- ▷ Liquiditeitsprobleem Levvel
- ▷ Staalinkoop





BREEZANDDIJK LOGISTIEK CENTRUM



**BREEZANDDIJK
VERSTERKING TEENCONSTRUCTIE DIJK**



**BREEZANDDIJK
VERSTERKEN TEENCONSTRUCTIE DIJK**



**HARLINGEN
AANLEGGEN VOORRAAD LEVEL-BLOCS**

Buiten scope





**KORNWERDERZAND
TIJDELIJKE WATERKERING TER HOOGTE VAN BY-PA**



**DEN OEVER
AANBRENGEN BODEMBESCHERMING (BSM)
KRAANSCHIP VOOR ONTGRAVEN**



**DEN OEVER
AANBRENGEN BODEMBESCHERMING (BSM)
DUIKPONTON VOOR AFBRANDEN OUDE DAMWANDE**




**DEN OEVER
BOUWKUIP POMPGROEP 2 (IJSELMEERZIJDE)**




DEN OEVER GEREEDMAKEN OPSTELPLATEAUS (TUSSENEILANDE



**DEN OEVER
ASFALTERINGSWERKZAAMHEDEN NA VERDICHTING**

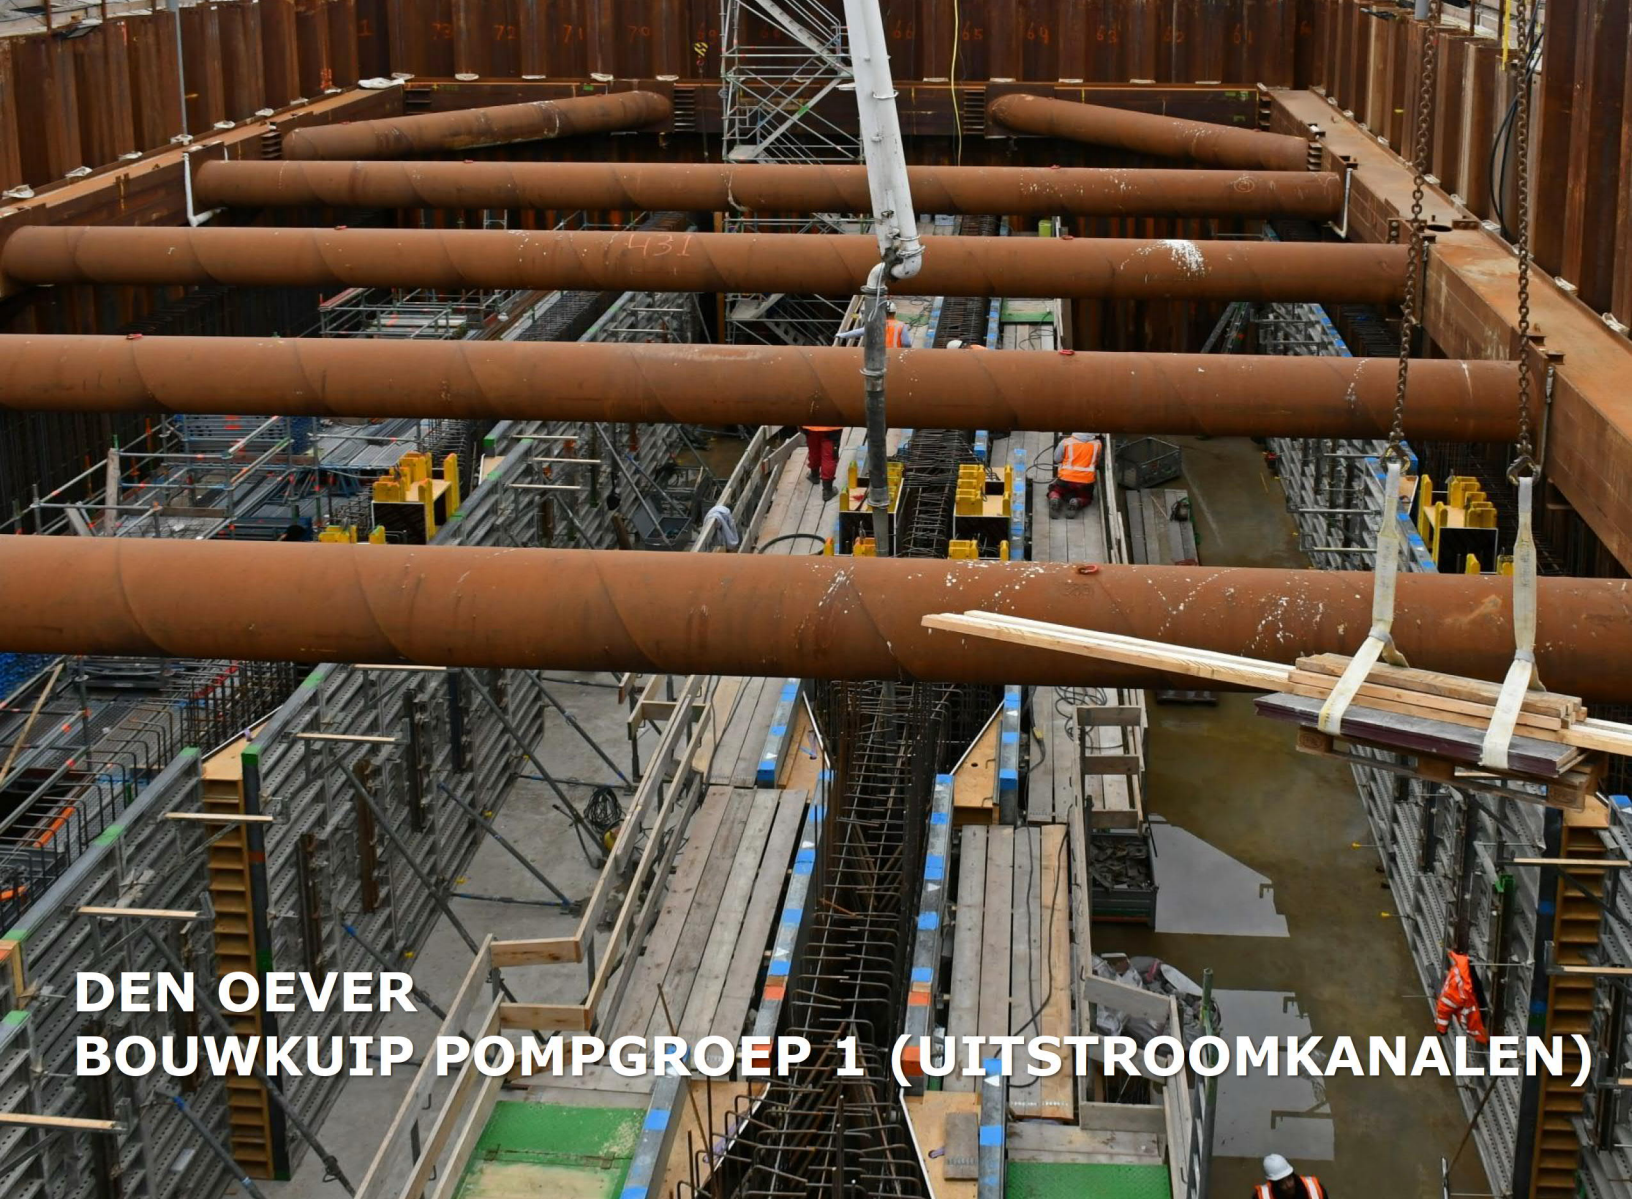

**DEN OEVER
BOUWKUIP POMPGROEP 1 (UITSTROOMKANALEN)**

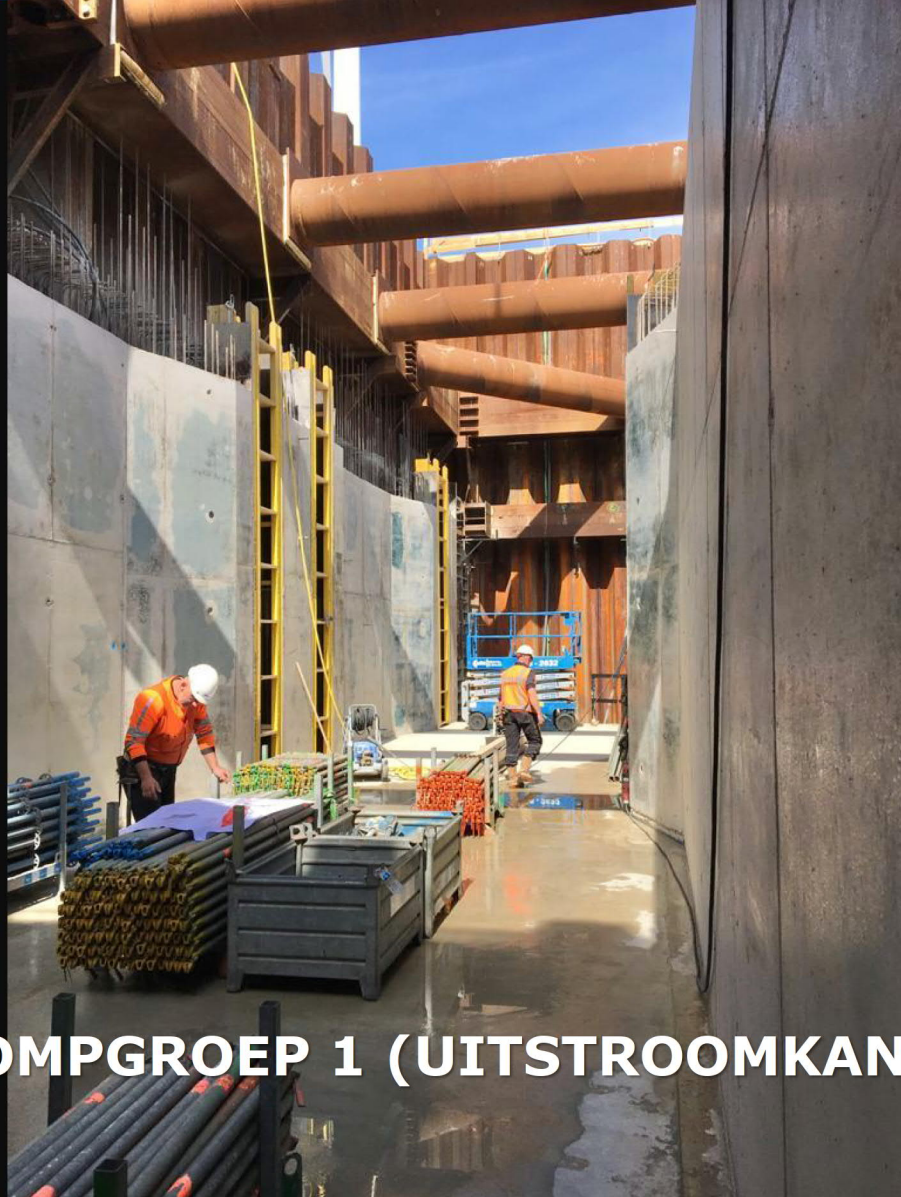

**DEN OEVER
BOUWKUIP POMPGROEP 1 (UITSTROOMKANALEN)**



DEN OEVER BOUWKUIPEN HEIEN GEMAAL LEEMANS



AFSLUITDIJK AANBRENGEN TUSSENLAAG WERKVAK 2



KORNWERDERZAND DIGITALE STAKEHOLDERSBIJEENKOMST



**DEN OEVER
LEPELAARS TERUG OP DAM D15**

Buiten scope










VOORTGANG UITWERKEN PROJECTPLANNING

- ▷ Gesprekken vinden plaats op basis van baseline 1.3 (zie volgende slide)
- ▷ Grootste onzekerheden zijn:
 - ▷ Doorlooptijd NSM → bepalend voor BD
 - ▷ Doorlooptijd BSM → bepalend voor VD

Buiten scope

Procesplanning HR: juni 2020

| 2020 | | | | | |
|------|------|----------|-----------|---------|----------|
| juni | juli | augustus | september | oktober | november |

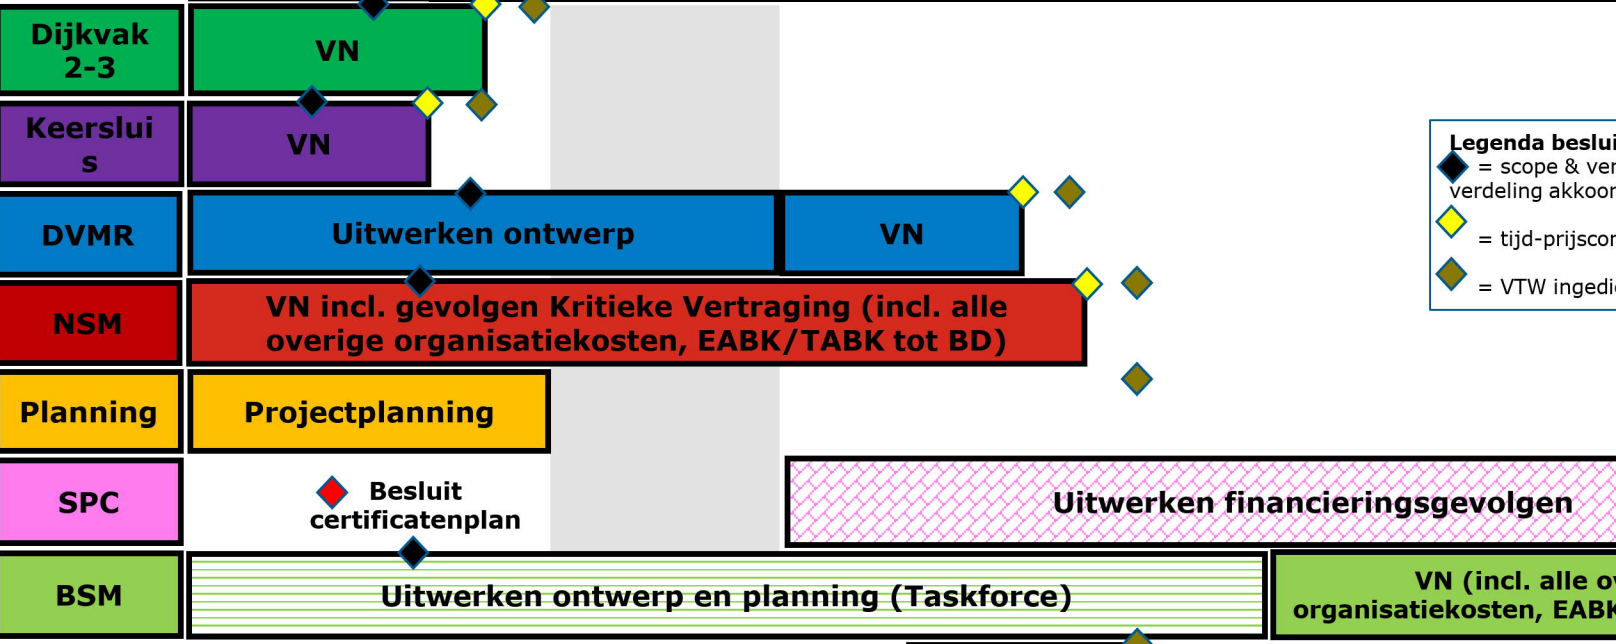

Legenda besluit
 ◆ = scope & verdeling akkoord
 ◆ = tijd-prijscoördinatie
 ◆ = VTW ingediend

Doorlooptijd afhankelijk van gezamenlijk proces Level - RWS

Doorlooptijd afhankelijk van traject banken

Integrale WOG

Besluitvormingsproces

| | Onderdeel | Voorwaarden | Proces | Resultaat |
|--|--|---|---|---|
| | Scope en principe verantwoordelijkheidsverdeling | 1/ UNO goedgekeurd 2/ Ontwerp voldoende afgerond 3/ Stakeholders akkoord met gewijzigd ontwerp (VO-niveau) | 1/ Bespreken en overeenkomen principe verantwoordelijkheidsverdeling 2/ Levvel beschrijft veranderde scope in verschilnotitie; 3/ RWS beoordeelt scope en levert specifieke opmerkingen / vragen; 4/ Gesprek c.q. onderhandeling over scope onderdelen waarover vragen zijn; | Overeengekomen scope- en verantwoordelijkheidsverdeling d.m.v. met kostensoortenverschilnotitie |
| | Tijd- prijs consequenties | 1/ Overeengekomen scope- en verantwoordelijkheidsverdeling 2/ Gevalideerd DO civiel (m.u.v. BSM: gevalideerd DO integraal) 3/ Stakeholders akkoord met DO 4/ Planning afgerond | 1/ Levvel vermeldt kosten in de tabel met kostensoorten; 2/ RWS beoordeelt kosten en levert specifieke vragen en opmerkingen; 3/ Levvel levert onderbouwing van de kosten 4/ Gesprek c.q. onderhandeling over de extra kosten – en voorwaarden | Overeengekomen en tijdsconsequenties opgenomen in verschilnotitie |
| | VTW ingediend / afgerond | 1/ Overeengekomen tijd- prijsconsequenties | 1/ Levvel verwerkt overeengekomen scope, prijs en voorwaarden in verschilnotitie 2/ Levvel stelt VTW formulier op | Overeengekomen incl. verschilnotitie bijlage |

10.2.b

VOORSTELLEN VERBETERING LIQUIDITEIT

Basis blijft vergoeding van gemaakte kosten door Levvel

1. Betalingsregeling op basis van "slice the elephant" voortg
2. Betaling van werkelijke kosten op basis van Methode F p
maand achteraf:
 - April 2020 werkelijke kosten (actueel)
 - Volgende maanden, voor nu, ingeschat
3. Betaling van tgv "incrementele beslissingsproces" gemaak
kosten/uitgaven

STAALINKOOP KEERSLUIZEN

- ▷ Beelden RWS en Levvel liggen uit elkaar over de kosten van de inkoop van de stalen deuren in Nederland



Buiten sco

