


Veldboorbeschrijving (klasse 2)

Maatvoering in meters t.o.v. N.A.P.

Maatvoering in meters t.o.v. maaiveld

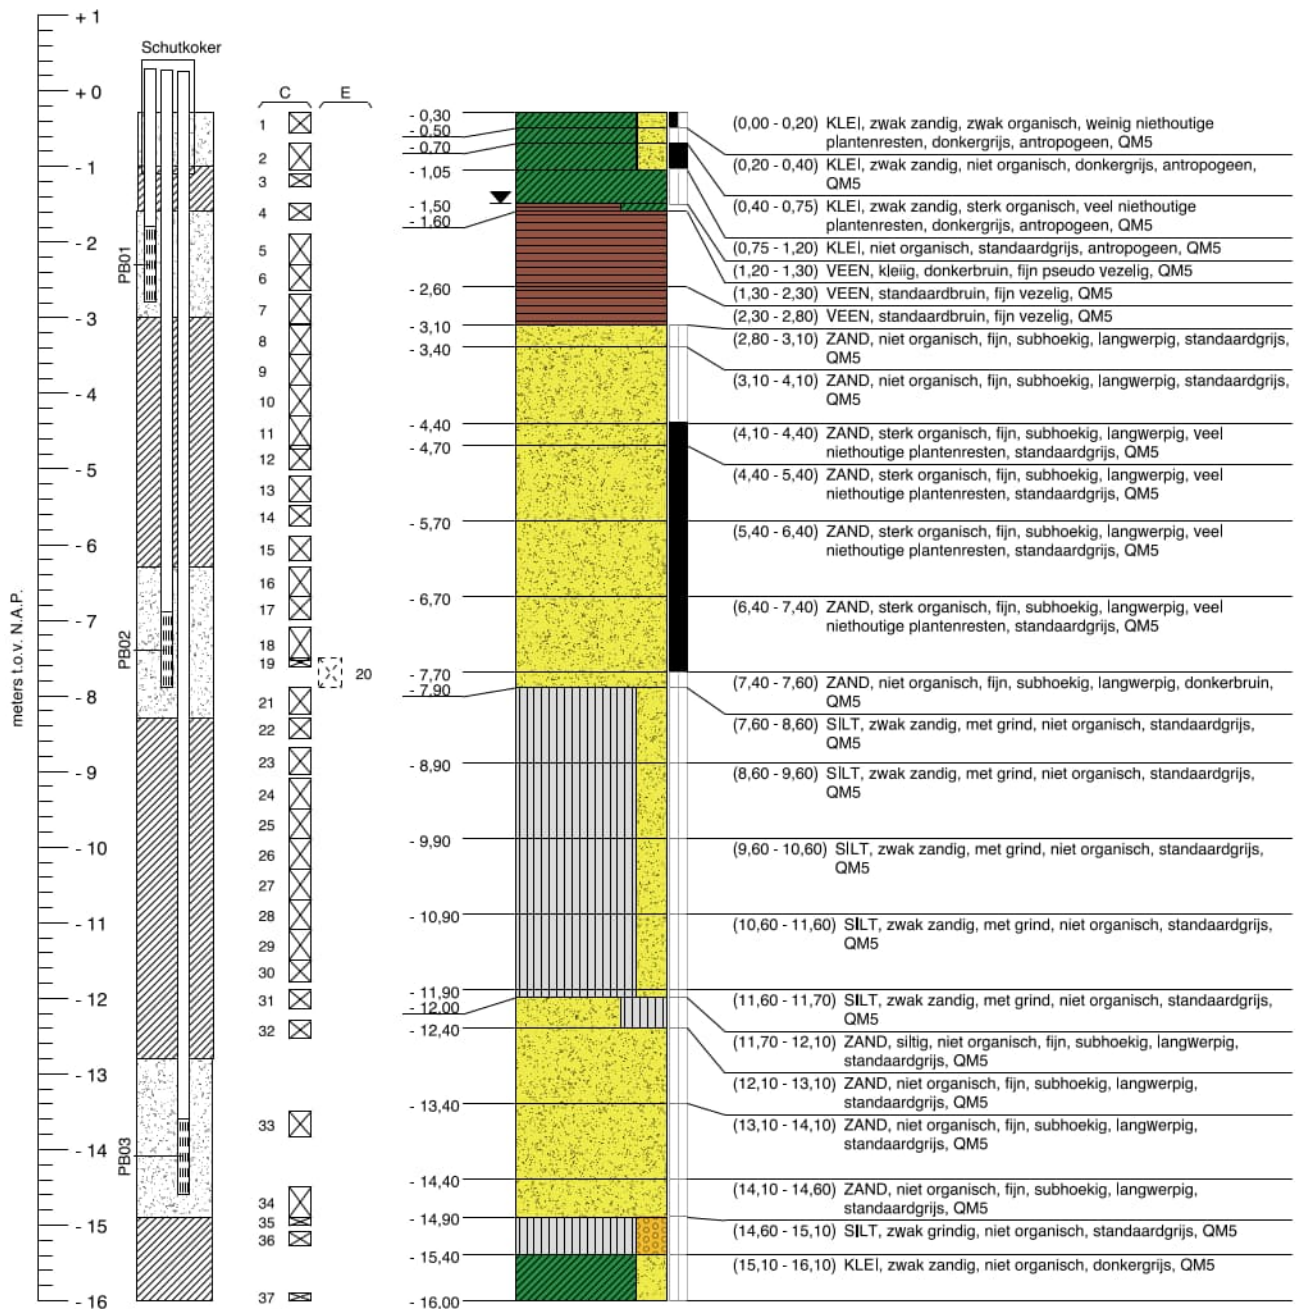


Geotechnisch onderzoek (Boorbeschrijving conform NEN-EN-ISO-14688)	RD coördinaten	Prinses Margrietunnel te Sneek	
Van Kessel Bronbemaling, Geesbrug	X = 176772,5		
	Y = 557100,7		
	Uitgevoerd: 20-02-2023	Oprachtnr.: VN-83268-1	
	Blad 1 van 2	MB_E22 Boornr (W&P): MB122	

Veldboorbeschrijving (klasse 2)

Maatvoering in meters t.o.v. N.A.P.

Maatvoering in meters t.o.v. maaiveld



	t.o.v. N.A.P.	t.o.v. maaiveld	Ec
BK PB01 (Øint = 36,6mm) :	+ 0,28 m	+ 0,58 m	
GWS PB01 d.d. (20-02-2023) :	niet waargenomen		1.570 µS/cm
BK filter PB01 :	- 1,80 m	- 1,50 m	
OK filter PB01 :	- 2,80 m	- 2,50 m	
Materiaal PB01 :	pvc		
BK PB02 (Øint = 36,6mm) :	+ 0,26 m	+ 0,56 m	
GWS PB02 d.d. (20-02-2023) :	niet waargenomen		890 µS/cm
BK filter PB02 :	- 6,90 m	- 6,60 m	
OK filter PB02 :	- 7,90 m	- 7,60 m	
Materiaal PB02 :	pvc		
BK PB03 (Øint = 36,6mm) :	+ 0,25 m	+ 0,55 m	
GWS PB03 d.d. (20-02-2023) :	niet waargenomen		790 µS/cm
BK filter PB03 :	- 13,60 m	- 13,30 m	
OK filter PB03 :	- 14,60 m	- 14,30 m	
Materiaal PB03 :	pvc		
GWS MB122 d.d. (20-02-2023) :	- 1,50 m	- 1,20 m	
G.H.G. MB122 d.d. (20-02-2023) :	niet waargenomen		
G.L.G. MB122 d.d. (20-02-2023) :	niet waargenomen		

Monsternames nog niet geverifieerd in laboratorium

Geotechnisch onderzoek (Boorbeschrijving conform NEN-EN-ISO-14688)	RD coördinaten	Prinses Margrietunnel te Sneek	
Van Kessel Bronbemaling, Geesbrug	X = 176772,5		
	Y = 557100,7		
	Uitgevoerd: 20-02-2023	Opdrachtnr.: VN-83268-1	
	Blad 2 van 2	MB_E22 Boornr (W&P): MB122	
