Basis Projectplanning uitwerking II niveau 3

status: definitief
datum: 13-12-17

Act. ID	Omschrijving	Duur	Start	Einde	Speling (TF)	Objectcode	P85 Start	P85 Einde
NPS40	Spuigroep D: Realiseren D3 - bouwkuip en fundering (zuid)	70d	16-06-20	24-09-20	103d	1.5.1.1	10-07-20	20-10-20
NPS47	Spuigroep D: Realiseren D3 - betonwerk (zuid)	65d	25-09-20	27-01-21	103d	1.5.1.1	21-10-20	01-03-21
NPS48	Spuigroep D: Realiseren D1 - betonwerk	65d	05-10-20	08-02-21	189d	1.5.1.1	18-12-20	29-04-21
NPS57	Spuigroep D: Aanbrengen bodembescherming	40d	10-02-21	19-04-21	189d	1.5.1.1	30-04-21	30-06-21
Realiseren pompen, installaties, schuiven & bewegingswerk landhoofden spuimiddel DOV		185d	25-09-20	01-07-21	212d		10-11-20	13-09-21
NPS46	Spuigroep A: Plaatsen en aansluiten schuiven	30d	25-09-20	05-11-20	317d	1.5.1.1	19-11-20	13-01-21
NPS45	Spuigroep D: Plaatsen en aansluiten schuiven	30d	25-09-20	05-11-20	317d	1.5.1.1	19-11-20	13-01-21
NPS51	Spuigroep D: Plaatsen en inbedrijfstellen pompen	110d	05-10-20	19-03-21	231d	1.5.1.1	10-11-20	04-05-21
NPS50	Spuigroep A: Plaatsen en inbedrijfstellen pompen	110d	05-10-20	19-03-21	251d	1.5.1.1	20-11-20	12-05-21
NPS61	Spuigroep A+D: Uitvoeren SAT	20d	20-04-21	19-05-21	212d	1.5.1.1	05-07-21	30-07-21
NPS62	Spuigroep A+D: Uitvoeren SIT	30d	20-05-21	01-07-21	212d	1.5.1.1	02-08-21	13-09-21
Realiseren schuiven, installaties en bewegingswerk tusseneilanden spuimiddel DOV		184d	10-06-20	08-03-21	0d		23-06-20	03-05-21
NPS38	Spuigroep B: Plaatsen en inbedrijfstellen schuiven / bewegingswerk	90d	10-06-20	13-10-20	69d	1.5.1.1	23-06-20	29-10-20
NPS37	Spuigroep C: Plaatsen en inbedrijfstellen schuiven / bewegingswerk	90d	10-06-20	13-10-20	69d	1.5.1.1	03-07-20	09-11-20
NPS54	Spuigroep B+C: Uitvoeren SAT	20d	14-10-20	10-11-20	69d	1.5.1.1	11-11-20	08-12-20
NPS59	Spuigroep B+C: Uitvoeren SIT	5d	02-03-21	08-03-21	0d	1.5.1.1	26-04-21	03-05-21
NPS60	mijlpaal: ingebruikname tusseneilanden nieuw Spuimiddel DOV	0d		08-03-21	0d	1.5.1.1		03-05-21
Renoveren Spuimiddelen Den Oever		675d	23-04-19	22-11-21	111d		01-04-19	04-02-22
Realiseren Spuigroep 1.1 DOV		565d	23-04-19	21-06-21	203d		01-04-19	12-08-21
SDOV10	Spuigroep 1.1: Realiseren bodembescherming	58d	23-04-19	15-07-19	74d	1.5.1.2	01-04-19	31-07-19
SDOV14	Spuigroep 1.1: Renoveren zuidzijde bovenzijde brugdek noord	40d	06-01-20*	23-03-20	21d	1.5.1.2	06-01-20	24-03-20
SDOV15	Spuigroep 1.1: Renoveren noordzijde bovenzijde brugdek noord en vervangen spatscherm	30d	01-04-20	15-05-20	15d	1.5.1.2	01-04-20	18-05-20
SDOV18	Spuigroep 1.1: Renoveren puntstukken	40d	01-05-20*	29-06-20	67d	1.5.1.2	01-05-20	01-07-20
SDOV19	Spuigroep 1.1: Renoveren bovenzijde brugdek zuid	40d	16-06-20	12-08-20	118d	1.5.1.2	10-07-20	08-09-20
SDOV24	Spuigroep 1.1: Renoveren binnenzijde kokers / verwijderen defensiebalk	55d	09-03-21	31-05-21	0d	1.5.1.2	04-05-21	29-07-21
SDOV25	Spuigroep 1.1: Vervangen schuif / aandrijving incl. inbedrijfstellen en testen	70d	09-03-21	21-06-21	0d	1.5.1.2	04-05-21	12-08-21
SDOV29	Spuigroep 1.1: Vervangen fietsbrug	5d	02-06-21	08-06-21	177d	1.5.1.2	30-07-21	06-08-21
Realiseren Spuigroep 1.2 DOV		615d	16-07-19	22-11-21	111d		01-08-19	04-02-22
SDOV11	Spuigroep 1.2: Realiseren bodembescherming	55d	16-07-19	30-09-19	74d	1.5.1.3	01-08-19	20-04-20
SDOV12	Spuigroep 1.2: Renoveren zuidzijde bovenzijde brugdek noord	40d	20-09-19	18-11-19	82d	1.5.1.3	26-09-19	22-11-19
SDOV16	Spuigroep 1.2: Renoveren noordzijde bovenzijde brugdek noord en vervangen spatscherm	30d	01-04-20	15-05-20	15d	1.5.1.3	01-04-20	18-05-20
SDOV21	Spuigroep 1.2: Renoveren bovenzijde brugdek zuid	40d	13-08-20	09-10-20	118d	1.5.1.3	09-09-20	06-11-20
SDOV26	Spuigroep 1.2: Renoveren puntstukken	40d	07-05-21	05-07-21	5d	1.5.1.3	05-07-21	27-08-21
SDOV31	Spuigroep 1.2: Renoveren binnenzijde spuikokers / verwijderen defensiebalk	55d	17-08-21	01-11-21	0d	1.5.1.3	18-10-21	14-01-22
SDOV32	Spuigroep 1.2: Vervangen schuif / aandrijving incl. inbedrijfstellen en testen	70d	17-08-21	22-11-21	0d	1.5.1.3	18-10-21	04-02-22
SDOV33	Spuigroep 1.2: Vervangen fietsbrug	5d	03-11-21	09-11-21	87d	1.5.1.3	17-01-22	27-01-22
Realiseren Spuigroep 1.3 DOV		512d	20-09-19	06-09-21	161d		26-09-19	05-11-21
SDOV13	Spuigroep 1.3: Renoveren zuidzijde bovenzijde brugdek noord	40d	20-09-19	18-11-19	82d	1.5.1.4	26-09-19	22-11-19
SDOV17	Spuigroep 1.3: Renoveren noordzijde bovenzijde brugdek en vervangen spatscherm noord	30d	01-04-20	15-05-20	15d	1.5.1.4	01-04-20	18-05-20
SDOV20	Spuigroep 1.3: Realiseren bodembescherming	55d	30-06-20	17-09-20	96d	1.5.1.4	02-07-20	26-10-20
SDOV22	Spuigroep 1.3: Renoveren bovenzijde brugdek zuid	40d	12-10-20	11-12-20	118d	1.5.1.4	09-11-20	05-02-21
SDOV23	Spuigroep 1.3: Renoveren puntstukken	40d	09-03-21	06-05-21	5d	1.5.1.4	04-05-21	02-07-21
SDOV27	Spuigroep 1.3: Renoveren binnenzijde spuikokers / verwijderen defensiebalk	55d	01-06-21	16-08-21	0d	1.5.1.4	30-07-21	15-10-21
SDOV28	Spuigroep 1.3: Vervangen schuif / aandrijving incl. inbedrijfstellen en testen	70d	01-06-21	06-09-21	0d	1.5.1.4	30-07-21	05-11-21
SDOV30	Spuigroep 1.3: Vervangen fietsbrug	10d	17-08-21	30-08-21	130d	1.5.1.4	18-10-21	29-10-21
Renoveren Spuimiddel Kornwerderzand		552d	01-04-20	12-05-22	0d		21-04-20	27-07-22
Realiseren Spuigroep 2.1 KWZ		494d	01-04-20	21-02-22	53d		21-04-20	28-04-22
SKWZ10	Spuigroep 2.1: Realiseren stabiliteitsconstructie/bodembescherming	60d	01-04-20*	30-06-20	74d	1.5.2.1	21-04-20	24-08-20
OMZ-229	Instellen 2-0 verkeerssysteem via noord t.p.v. Spuimiddel Kornwerderzand	0d	01-04-21*		41d	1.5.2.1	01-04-21	
SKWZ12	Spuigroep 2.1: Renoveren bovenzijde brugdek zuid	40d	01-04-21	07-06-21	41d	1.5.2.1	01-04-21	09-06-21
OMZ-234	Opheffen 2-0 verkeerssysteem t.p.v. Spuimiddel Kornwerderzand	0d		07-06-21	41d	1.5.2.1		10-06-21
OMZ-18	Instellen 2-0 verkeerssysteem via zuid t.p.v. Spuimiddel Kornwerderzand	0d	08-06-21		41d	1.5.2.1	11-06-21	
SKWZ14	Spuigroep 2.1: Renoveren bovenzijde brugdek en vervangen spatscherm noord	40d	08-06-21	02-08-21	43d	1.5.2.1	11-06-21	06-08-21
OMZ-48	Opheffen 2-0 verkeerssysteem via zuid t.p.v. Spuimiddel Kornwerderzand	0d		02-08-21	88d	1.5.2.1		09-08-21
SKWZ17	Spuigroep 2.1: Renoveren puntstukken	40d	31-08-21	25-10-21	5d	1.5.2.1	26-10-21	20-12-21
SKWZ18	Spuigroep 2.1: Renoveren binnenzijde spuikokers / verwijderen defensiebalk	55d	02-11-21	31-01-22	0d	1.5.2.1	17-01-22	13-04-22
SKWZ19	Spuigroep 2.1: Vervangen schuif / aandrijving incl. inbedrijfstellen en testen	70d	02-11-21	21-02-22	0d	1.5.2.1	18-01-22	28-04-22
SKWZ22	Spuigroep 2.1: Vervangen fietsbrug	5d	02-02-22	10-02-22	48d	1.5.2.1	14-04-22	22-04-22
Realiseren Spuigroep 2.2 KWZ		487d	01-07-20	12-05-22	0d		25-08-20	27-07-22
SKWZ11	Spuigroep 2.2: Realiseren stabiliteitsconstructie/bodembescherming	60d	01-07-20	22-09-20	74d	1.5.2.2	25-08-20	25-05-21
SKWZ13	Spuigroep 2.2: Renoveren bovenzijde brugdek zuid	40d	01-04-21	07-06-21	41d	1.5.2.2	01-04-21	09-06-21
SKWZ15	Spuigroep 2.2: Renoveren bovenzijde brugdek en vervangen spatscherm noord	40d	08-06-21	02-08-21	43d	1.5.2.2	11-06-21	06-08-21
SKWZ16	Spuigroep 2.2: Renoveren puntstukken	40d	06-07-21	30-08-21	5d	1.5.2.2	30-08-21	25-10-21
SKWZ20	Spuigroep 2.2: Renoveren binnenzijde spuikokers / verwijderen defensiebalk	55d	01-02-22	20-04-22	0d	1.5.2.2	14-04-22	06-07-22
SKWZ21	Spuigroep 2.2: Vervangen schuif / aandrijving incl. inbedrijfstellen en testen	70d	01-02-22	12-05-22	0d	1.5.2.2	14-04-22	27-07-22
SKWZ23	Spuigroep 2.2: Vervangen fietsbrug	5d	21-04-22	28-04-22	9d	1.5.2.2	07-07-22	14-07-22
Realiseren Weg		666d	20-09-19	08-04-22	24d		26-09-19	16-05-22
Realiseren hoofdwegennet A7		423d	20-09-19	30-08-21	69d		26-09-19	08-10-21
Realiseren wegvak Den Oever (km 71,40 - 72,20)		194d	20-09-19	12-08-20	198d		26-09-19	07-09-20
WEG10	Wegvak Den Oever: Realiseren weg (tijdens 2-0 bouw Spuimiddel)	40d	20-09-19	18-11-19	110d	1.6.2.1	26-09-19	22-11-19
WEG16	Wegvak Den Oever: Realiseren weg (tijdens 2-0 bouw Spuimiddel)	40d	16-06-20	12-08-20	198d	1.6.2.1	10-07-20	07-09-20
Realiseren wegvak 1 (km 72,20- 78,70)		57d	02-03-20	29-05-20	88d		02-03-20	08-07-20
OMZ-08	Wegvak 1: Instellen 1-1 systeem wegvak 1 (1)	0d	02-03-20*		88d	1.6.2.1	02-03-20	
WEG11	Wegvak 1: Realiseren rijstrook R2 en vluchtstrook (HRL en HRR)	15d	02-03-20	25-03-20	88d	1.6.2.1	02-03-20	04-05-20
OMZ-38	Wegvak 1: Opheffen 1-1 systeem wegvak 1 (1)	0d		25-03-20	88d	1.6.2.1		04-05-20
OMZ-43	Wegvak 1: Instellen 1-1 systeem wegvak 1 (2)	0d	26-03-20		88d	1.6.2.1	06-05-20	
WEG12	Wegvak 1: Realiseren rijkstrook R1 en middenberm (HRL en HRR)	26d	26-03-20	06-05-20	88d	1.6.2.1	06-05-20	15-06-20
OMZ-28	Wegvak 1: Opheffen 1-1 systeem wegvak 1 (2)	0d		06-05-20	88d	1.6.2.1		15-06-20
OMZ-23	Wegvak 1: Instellen 1-1 systeem wegvak 1 (3)	0d	07-05-20		88d	1.6.2.1	16-06-20	
WEG14	Wegvak 1: Realiseren rijstrook R2 en vluchtstrook (HRL en HRR)	16d	07-05-20	29-05-20	88d	1.6.2.1	16-06-20	08-07-20
OMZ-33	Wegvak 1: Opheffen 1-1 systeem wegvak 1 (3)	0d		29-05-20	88d	1.6.2.1		08-07-20
Realiseren wegvak 2 (km 78,70 - 83,10)		43d	03-06-20	03-08-20	88d		09-07-20	10-09-20
OMZ-13	Wegvak 2: Instellen 1-1 systeem (1)	0d	03-06-20		88d	1.6.2.1	09-07-20	
WEG15	Wegvak 2: Realiseren rijstrook R2 en vluchtstrook (HRL en HRR)	12d	03-06-20	18-06-20	88d	1.6.2.1	09-07-20	27-07-20

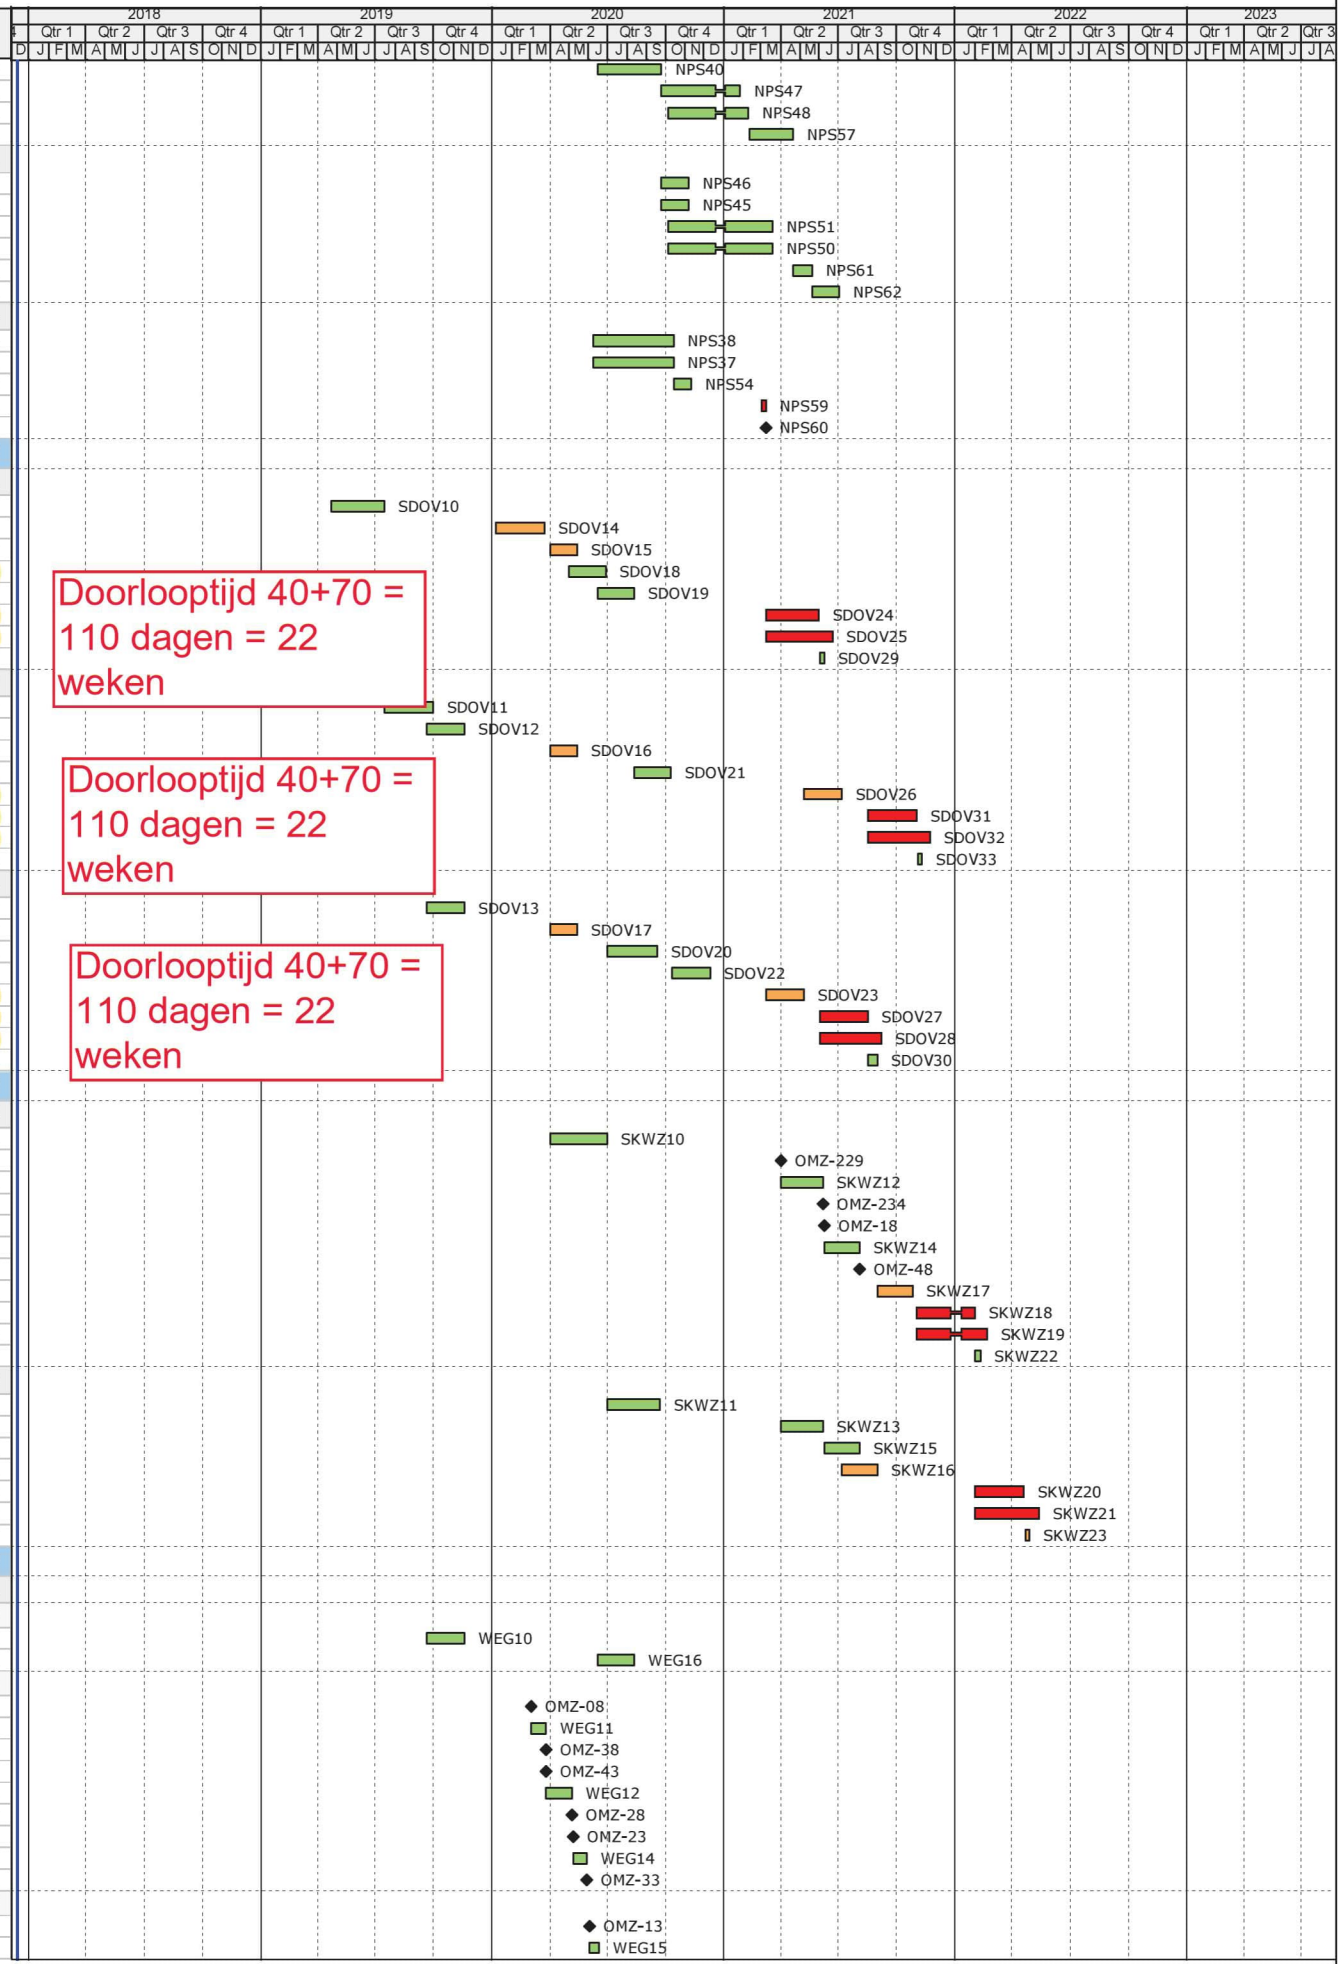

◆ Mijlpaal | ALAP | Activiteit | Kritiek-2 (speling <30d) | Kritiek-1 (speling = 0d) | Level of Effort | Buffer
