Projectplanning

STANDLIJN: 26-May-19

26-May-19
print datum: 19-Jun-19

layout: WOG 7.0 | lvl4 WOG HR 7.0
vs. versie G
TASK filter: All Activities

#	Activity ID	Omschrijving	Remaining Duration	Start	Finish	Total Float	BL Project Start	BL Project Finish	Variance - BL Project Finish Date
228	**Overig**		266	03-Sep-18 A	12-May-20	475	03-Sep-18	11-Jan-20	-123
229	OM108	Productiefaciliteit Harlingen: Proceduretijd vergunningen inrichten werkterrein/kade Ha	0	03-Sep-18 A	25-Apr-19 A		03-Sep-18	29-Mar-19	-27
230	OM151	Proceduretijd vergunningencluster aanpassing bestaande uitstroom Gemaal Leemans I	238	21-Aug-19	14-Apr-20	-211			
231	OM123	Loopbrug Monument: Proceduretijd vergunningencluster	238	18-Sep-19	12-May-20	475	01-Jun-19	11-Jan-20	-123
232	**INTEGRAAL VEILIGHEIDSMANAGEMENT**		1489	20-Apr-18 A	12-May-25	-546	20-Apr-18	27-Mar-23	-546
233	PM103	Veiligheidsmanagement: Uitvoeren	1489	20-Apr-18 A	12-May-25	-546	20-Apr-18	27-Mar-23	-546
234	PM107	Veiligheidsmanagement: Opstellen Calamiteitenplan (AC voorwaarde K)	0	28-May-18 A	15-Aug-18 A		28-May-18	15-Aug-18	0
235	PM106	Veiligheidsmanagement: Opstellen Integraal Veiligheidsmanagementplan (AC voorwaar	0	28-May-18 A	15-Aug-18 A		28-May-18	15-Aug-18	0
236	PM121	Veiligheidsmanagement: Opstellen EG-conformiteitsverklaring en CE-markering machir	25	20-Jun-24	24-Jul-24	-542	21-Apr-22	30-May-22	-542
237	PM120	Veiligheidsmanagement: Risicobeoordeling Machineveligheid (BC voorwaarde H)	25	20-Jun-24	24-Jul-24	-542	21-Apr-22	30-May-22	-542
238	PM119	Veiligheidsmanagement: Actualiseren Integraal Veiligheidsplan tbv Exploitatiefase (BC \	25	20-Jun-24	24-Jul-24	-542	21-Apr-22	30-May-22	-542
239	**CONTRACTMANAGEMENT**		1489	20-Apr-18 A	12-May-25	-546	20-Apr-18	27-Mar-23	-546
240	PM101	Contractmanagement: Uitvoeren	1489	20-Apr-18 A	12-May-25	-546	20-Apr-18	27-Mar-23	-546
241	PM108	Contractmanagement: Opstellen contractbeheersplan (CBPU)	0	21-May-18 A	22-Jun-18 A		21-May-18	22-Jun-18	0
242	PM126	Contractmanagement: Overeenkomen hersteltermijnen cf. ME_02085 met OG (VC voor	10	25-Feb-25	10-Mar-25	-546	09-Jan-23	23-Jan-23	-546
243	**INKOOPMANAGEMENT**		1489	20-Apr-18 A	12-May-25	-546	20-Apr-18	27-Mar-23	-546
244	PM102	Inkoopmanagement: Uitvoeren	1489	20-Apr-18 A	12-May-25	-546	20-Apr-18	27-Mar-23	-546
245	PM104	Inkoopmanagement: Overeenkomsten intellectele eigendommen (AC voorwaarde B)	0	09-Jul-18 A	01-Aug-18 A		09-Jul-18	01-Aug-18	0
246	**HUMAN RESOURCES**		0	23-Feb-18 A	18-Jan-19 A		23-Feb-18	16-Jan-19	-2
247	VERPL-25	Mobiliseren full-time Project Coordinator (PC) social return [M2.4.1][uiterlijk 16-4-2018	0	23-Feb-18 A	13-Apr-18 A		23-Feb-18	13-Apr-18	0
248	MOB22	Interne cursussen en opleiding	0	08-Mar-18 A	09-Nov-18 A		08-Mar-18	09-Nov-18	0
249	VERPL-24	Mobiliseren social return coordinatieteam [M2.4.1][uiterlijk 16-7-2018 gereed]	0	20-Apr-18 A	08-Jun-18 A		20-Apr-18	08-Jun-18	0
250	VERPL-26	Exclusief zoeken binnen social return doelgroep [minimaal tot 16-6-2018] [M2.4.2]	0	20-Apr-18 A	15-Jun-18 A		20-Apr-18	15-Jun-18	0
251	VERPL-27	Organiseren overleg met RWS en WSP [M2.4.6][uiterlijk 16-5-2018]	0	20-Apr-18 A	16-May-18 A		20-Apr-18	16-May-18	0
252	VERPL-28	Maandelijk deelnemen aan speedmetings en meet/greet evenementen [M2.4.7][tot 16-1	0	02-Jul-18 A	11-Jan-19 A		02-Jul-18	16-Jan-19	3
253	VERPL-29	Bespreken social-return-planning met ROC's [M2.4.8][uiterlijk 16-10-2018]	0	03-Sep-18 A	18-Jan-19 A		24-Dec-18	16-Jan-19	-2
254	**ONTWERP**		1338	22-Feb-18 A	10-Jul-24	6686	22-Feb-18	13-May-22	-564
255	**Algemeen**		0	02-Apr-18 A	24-May-19 A		02-Apr-18	18-Mar-19	-49
256	**Taskforce**		0	02-Apr-18 A	24-May-19 A		02-Apr-18	18-Mar-19	-49
257	**Onderzoeken**		0	02-Apr-18 A	24-May-19 A		02-Apr-18	18-Mar-19	-47
258	ONT10	Opstellen PvA op niveau brengen Infrastructuur RWS (AC voorwaarde P)	0	10-Jul-18 A	31-Jul-18 A		10-Jul-18	31-Jul-18	0
259	ONT61	Onderzoek: Uitvoeren funderingsproef t.p.v. Den Oever	0	07-Jan-19 A	22-Mar-19 A		07-Jan-19	01-Feb-19	-35
260	ONT60	Onderzoek: Uitvoeren funderingsproef t.p.v. Keersluis KWZ	0	20-May-19 A	24-May-19 A		07-Jan-19	25-Feb-19	-62
261	**Grondonderzoeken**		0	02-Apr-18 A	01-Feb-19 A		02-Apr-18	18-Mar-19	31
262	ONT17	Dijk: Milieu- en grondonderzoek	0	02-Apr-18 A	31-Aug-18 A		02-Apr-18	31-Aug-18	0
263	ONT32	Dijk: Milieu- en grondonderzoek - Productielocatie Dijk	0	28-May-18 A	31-Aug-18 A		28-May-18	31-Aug-18	0
264	ONT13	Nieuw Spuimiddel: Uitvoeren milieu- en grondonderzoek	0	23-Jul-18 A	18-Jan-19 A		23-Jul-18	28-Jan-19	6
265	ONT49	Keersluis DOV: Uitvoeren milieu- en grondonderzoek	0	03-Aug-18 A	18-Sep-18 A		03-Aug-18	18-Sep-18	0
266	ONT36	Doorlaatmiddel VMR: Uitvoeren milieu- en grondonderzoek	0	09-Aug-18 A	28-Sep-18 A		09-Aug-18	28-Sep-18	0
267	ONT33	Bestaand Spuimiddel: Uitvoeren beton- en bodemonderzoek	0	20-Aug-18 A	01-Feb-19 A		20-Aug-18	18-Mar-19	31
268	ONT44	Keersluis KWZ: Uitvoeren milieu- en grondonderzoek	0	28-Jan-19 A	01-Feb-19 A		28-Jan-19	04-Feb-19	1
269	**Betononderzoeken**		0	11-Jun-18 A	07-Sep-18 A		11-Jun-18	07-Sep-18	0
270	ONT11	Opstellen Plan instandhouding betonconstructies (AC voorwaarde Q)	0	11-Jun-18 A	07-Sep-18 A		11-Jun-18	07-Sep-18	0
271	**VGD Metingen**		0	21-May-18 A	24-Aug-18 A		21-May-18	24-Aug-18	0
272	ONT31	Uitvoeren valgewicht deflectie meting (VGD) en asfaltboringen weg	0	21-May-18 A	24-Aug-18 A		21-May-18	24-Aug-18	0
273	**Taskforce Raakvlakontwerp**		0	02-May-18 A	28-Jul-18 A		02-May-18	28-Jul-18	0
274	**Vergaderingen**		0	24-May-18 A	20-Jul-18 A		24-May-18	20-Jul-18	0
275	ONT88	1e werkvergadering WPF (ingepland binnen 30d na CD)	0	24-May-18 A	24-May-18 A		24-May-18	24-May-18	0
276	ONT93	2e werkvergadering WPF	0	11-Jun-18 A	11-Jun-18 A		11-Jun-18	11-Jun-18	0
277	ONT123	Driehoeksoverleg-1 (RWS/WPF/Levvel)	0	21-Jun-18 A	21-Jun-18 A		21-Jun-18	21-Jun-18	0
278	ONT103	3e werkvergadering WPF	0	28-Jun-18 A	28-Jun-18 A		28-Jun-18	28-Jun-18	0
279	ONT108	4e werkvergadering WPF	0	11-Jul-18 A	11-Jul-18 A		11-Jul-18	11-Jul-18	0
280	ONT118	Driehoeksoverleg-2 (RWS/WPF/Levvel)	0	20-Jul-18 A	20-Jul-18 A		20-Jul-18	20-Jul-18	0
281	**Raakvlakontwerp WPF**		0	02-May-18 A	28-Jul-18 A		02-May-18	28-Jul-18	0
282	ONT14	Opstellen 1e concept raakvlakontwerp WPF	0	02-May-18 A	18-May-18 A		02-May-18	18-May-18	0
283	ONT30	Opstellen 2e concept raakvlakontwerp WPF	0	22-May-18 A	05-Jul-18 A		22-May-18	05-Jul-18	0
284	ONT38	Indienen 2e concept raakvlakontwerp bij WPF (max. 45d na 1e werkvergadering)	0		05-Jul-18 A			05-Jul-18	0
285	ONT39	Bezwaartermijn concept raakvlakontwerp WPF	0	06-Jul-18 A	19-Jul-18 A		06-Jul-18	19-Jul-18	0
286	ONT89	Opstellen definitief raakvlakontwerp WPF	0	23-Jul-18 A	24-Jul-18 A		23-Jul-18	24-Jul-18	0
287	ONT99	Indienen definitief raakvlakontwerp WPF	0		24-Jul-18 A			24-Jul-18	0
288	ONT113	Bezwaartermijn definitief raakvlakontwerp WPF	0	24-Jul-18 A	25-Jul-18 A		24-Jul-18	25-Jul-18	0
289	ONT104	Verwerken opmerkingen raakvlakontwerp WPF	0	25-Jul-18 A	26-Jul-18 A		25-Jul-18	26-Jul-18	0
290	ONT94	Review raakvlakontwerp WPF	0	26-Jul-18 A	27-Jul-18 A		26-Jul-18	27-Jul-18	0
291	ONT46	Vrijgeven definitief raakvlakontwerp WPF (max 21d na 2e werkvergadering)	0		28-Jul-18 A			28-Jul-18	0
292	**Ontwerpen Infrastructuur RWS / Systeem Afsluitdijk**		223	19-Mar-18 A	01-Apr-20	551	19-Mar-18	27-Dec-21	452
293	**Ontwerpmanagement Opstartfase/DO/UO fase**		223	19-Mar-18 A	01-Apr-20	551	19-Mar-18	27-Dec-21	452
294	PB100	Opstartfase: Uitvoeren elsenanalyse en eisallocatie	0	19-Mar-18 A	19-Apr-19 A		19-Mar-18	21-Dec-18	-75
295	ONT87	Managen Ontwerp Infrastructuur RWS DO-Fase	0	20-Apr-18 A	24-May-19 A		20-Apr-18	09-Jan-19	-96
296	ONT740	Architectuur	150	23-Apr-18 A	20-Dec-19	624	23-Apr-18	27-Dec-21	525
297	ONT745	RAMS	150	23-Apr-18 A	20-Dec-19	624	23-Apr-18	27-Dec-21	525
298	ONT730	BIM Coordinator DO	30	03-Sep-18 A	05-Jul-19	551	03-Sep-18	01-Jun-20	235
299	ONT90	Uitvoeren Ontwerpmanagement UO	82	16-Jan-19 A	17-Sep-19	248	09-Jan-19	22-Sep-20	264
300	ONT735	BIM Coordinator UO	193	08-Jul-19	01-Apr-20	551	01-Jun-20	27-Dec-21	452
301	**Ontwerpen Infrastructuur RWS SO-Fase**		20	02-May-18 A	25-Jun-19	28	02-May-18	21-Jan-19	-108
302	ONT124	Ontwerpen Infrastructuur RWS SO-Fase	20	02-May-18 A	25-Jun-19	28	02-May-18	21-Jan-19	-108
303	ONT24	Opstellen SRA/OCD en uitvoeren SRR	0	02-May-18 A	02-Nov-18 A		02-May-18	02-Nov-18	0
304	**Ontwerpen Infrastructuur RWS VO-Fase**		48	02-Oct-18 A	31-Jul-19	28	02-Oct-18	05-Mar-19	-107

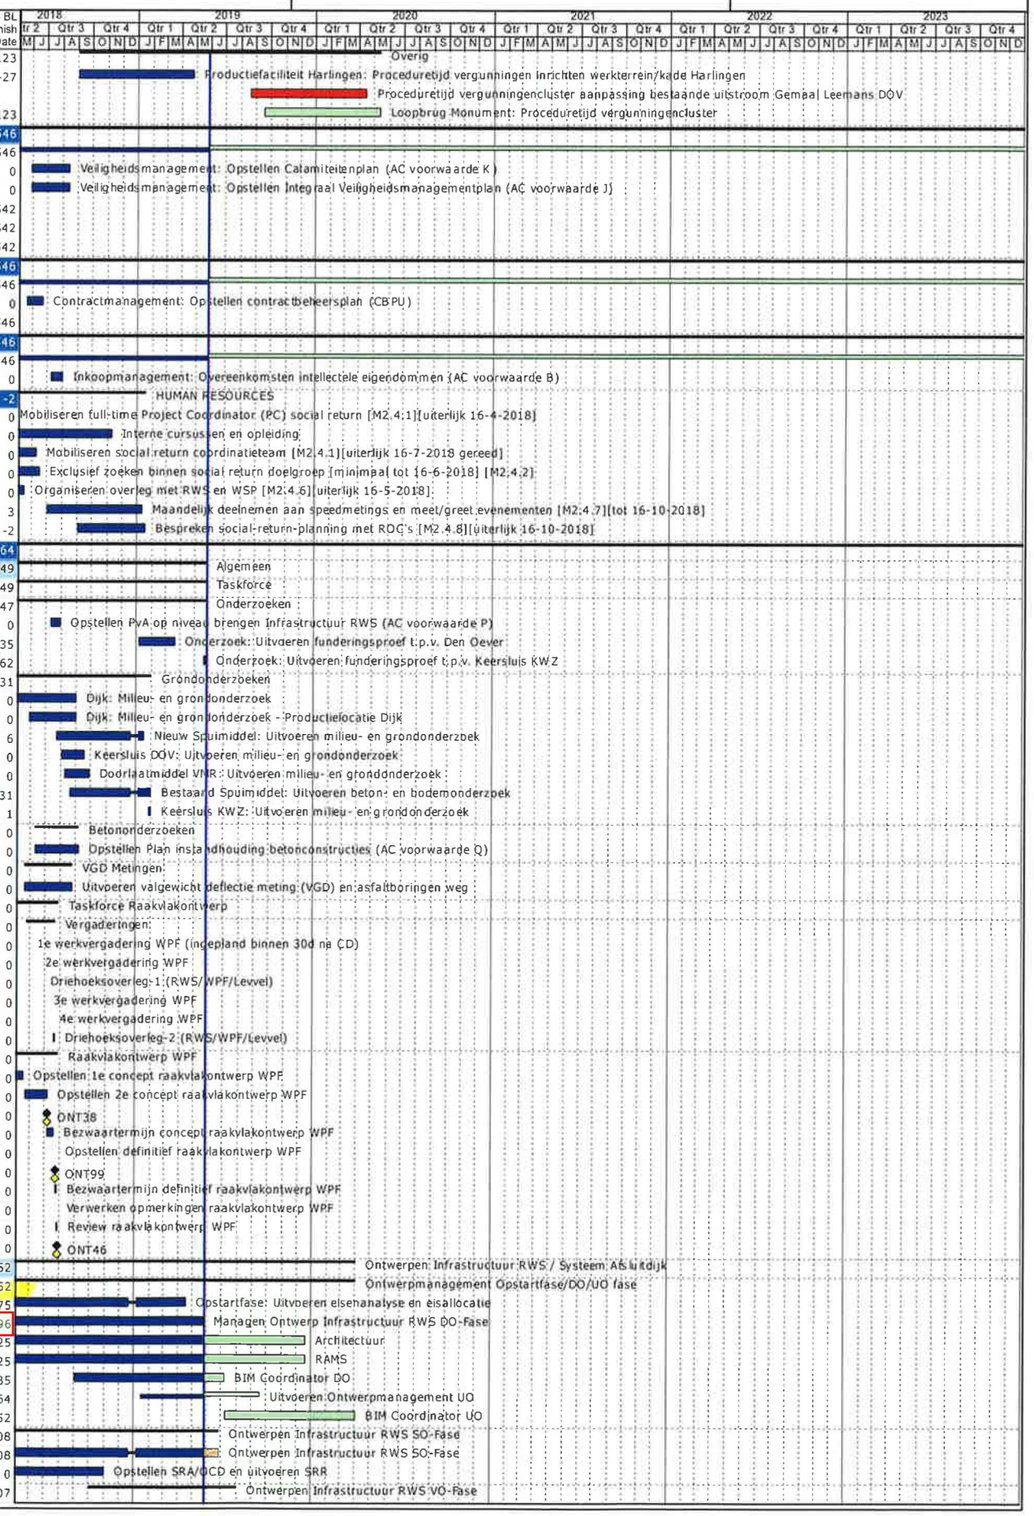

Projectplanning

STANDLIJN: 26-May-19

26-May-19
print datum: 19-Jun-19

layout: WOG 7.0 | lvl4 WOG HR 7.0
vs. versie G
TASK filter: All Activities

#	Activity ID	Omschrijving	Remaining Duration	Start	Finish	Total Float	BL Project Start	BL Project Finish	Variance - BL Project Finish Date
305	ONT58	Opstellen VO ondersteunende installaties en uitvoeren SDR	26	02-Oct-18 A	31-Jul-19	28	02-Oct-18	05-Mar-19	-103
306	VERPL-95	Opzetten virtuele Afsluitdijk [M1.7.6][uiterlijk gereed bij start VO][MIA]	20	07-Jan-19 A	21-Jun-19	56	24-Dec-18	04-Mar-19	-80
307	**Ontwerpen Dijk**		747	16-Apr-18 A	05-Apr-22	-2	16-Apr-18	04-Apr-22	-2
308	**Managen ontwerp Dijk, Dam, Haven**		150	16-Apr-18 A	20-Dec-19	218	16-Apr-18	08-Nov-21	490
309	ONT664	Dijk, Dammen en Havens: Managen ontwerp DO	118	16-Apr-18 A	06-Nov-19	3	16-Apr-18	08-Nov-21	522
310	ONT860	Dijk, Dammen en Havens: Managen ontwerp UO	150	30-Jul-18 A	20-Dec-19	218			
311	**Ontwerp Dijk Waddenzeezijde DO-fase**		116	16-Apr-18 A	06-Nov-19	375	16-Apr-18	07-Nov-19	0
312	ONT12	Dijk Waddenzeezijde - BAM-goot: Uitvoeren schaalmodelonderzoeken	0	16-Apr-18 A	26-Mar-19 A		16-Apr-18	28-May-19	43
313	ONT15	Dijk Waddenzeezijde - Dijkvak 1 t/m 17: Ontwerp DO	116	30-May-18 A	06-Nov-19	3	30-May-18	07-Nov-19	0
314	ONT34	Dijk Waddenzeezijde - Schelde-goot: Uitvoeren schaalmodelonderzoeken	45	30-May-18 A	30-Jul-19	398	30-May-18	21-Jun-19	-28
315	ONT43	Mijlpaal: Dijkontwerp (1e vak) gereed tbv Deltagoot	0		30-May-18 A			30-May-18	0
316	ONT48	Dijk Waddenzeezijde - Deltagoot: Uitvoeren schaalmodelonderzoeken vak 17, 8 & 6	18	30-Jul-18 A	21-Jun-19	0	30-Jul-18	01-Mar-19	-77
317	ONT68	Dijk Waddenzeezijde - Deltagoot: Uitvoeren schaalmodelonderzoeken Dijkvak 5	65	24-Jun-19*	20-Sep-19	380	11-Jul-19	07-Nov-19	33
318	ONT895	Dijk Waddenzeezijde - Dijkvak 8a: DO Gereed voor vergunningencluster	0		29-Jul-19*	5			
319	ONT139	Dijk Waddenzeezijde - Dijkvak 5 (kazemat): DO gereed voor vergunningencluster	0		20-Sep-19	380		10-Jul-19	-53
320	ONT138	Dijk Waddenzeezijde - Dijkvak 7: DO Gereed voor vergunningencluster	0		06-Nov-19	375		08-Feb-19	-190
321	**Ontwerp Dijk Waddenzeezijde UO-fase**		163	14-Dec-18 A	24-Jan-20	497	14-Dec-18	08-Nov-21	445
322	ONT73	Dijk Waddenzeezijde - Dijkvak 1 t/m 17: Ontwerp UO	148	14-Dec-18 A	20-Dec-19	203	14-Dec-18	08-Nov-21	460
323	ONT850	Dijk Waddenzeezijde - Dijkvak 8: Ontwerp UO	80	29-Jul-19	15-Nov-19	51			
324	ONT845	Dijk Waddenzeezijde - Dijkvak 9a: Opstellen UO	80	12-Sep-19	15-Jan-20	3			
325	ONT855	Dijk Waddenzeezijde - Dijkvak 5: Opstellen UO	80	23-Sep-19	24-Jan-20	497			
326	**Site Engineering Waddenzeezijde Realisatiefase**		747	15-Apr-19 A	05-Apr-22	-2	01-Apr-19	04-Apr-22	-2
327	ONT185	Dijk, Dammen en Havens: Site Engineering	747	15-Apr-19 A	05-Apr-22	-2	01-Apr-19	04-Apr-22	-2
328	**Ontwerp Dijk IJsselmeerzijde DO-fase**		112	23-Nov-18 A	31-Oct-19	1	23-Nov-18	02-May-19	-129
329	ONT62	Dijk IJsselmeerzijde: Ontwerp DO	112	23-Nov-18 A	31-Oct-19	1	23-Nov-18	02-May-19	-129
330	ONT900	Dijk IJsselmeerzijde - Sectie DOV-Mon: Opstellen DO	0	27-May-19		38			
331	**Ontwerp Dijk IJsselmeerzijde UO-fase**		242	27-May-19	19-May-20	280	02-Apr-19	20-Jun-19	-226
332	ONT905	Dijk IJsselmeerzijde - Sectie DOV-Mon: Opstellen UO	50	27-May-19	06-Aug-19	63			
333	ONT71	Dijk IJsselmeerzijde: Ontwerp UO	130	01-Nov-19	19-May-20	280	02-Apr-19	20-Jun-19	-226
334	**Ontwerpen Dam**		15	02-Jul-18 A	18-Jun-19	58	02-Jul-18	22-Feb-19	-79
335	**Ontwerpen Dam DO-fase**		0	02-Jul-18 A	22-Mar-19 A		02-Jul-18	11-Jan-19	-50
336	ONT35	Dammen - Opstellen DO	0	02-Jul-18 A	22-Mar-19 A		02-Jul-18	11-Jan-19	-50
337	**Ontwerpen Dam UO-fase**		15	11-Jan-19 A	18-Jun-19	58	11-Jan-19	22-Feb-19	-79
338	ONT56	Dammen - Opstellen UO	15	11-Jan-19 A	18-Jun-19	58	11-Jan-19	22-Feb-19	-79
339	**Ontwerpen Keersluis**		1338	02-May-18 A	10-Jul-24	-564	02-May-18	13-May-22	-564
340	**Managen ontwerp Keersluis Kornwerderzand**		162	06-Aug-18 A	07-Jan-20	-126	06-Aug-18	06-Dec-19	-23
341	ONT102	Keersluis KWZ: Managen ontwerp DO-fase	162	06-Aug-18 A	07-Jan-20	-126	06-Aug-18	06-Dec-19	-23
342	**Ontwerpen Keersluis Kornwerderzand DO-Fase**		150	06-Aug-18 A	08-Jan-20	106	06-Aug-18	22-Jul-19	-112
343	ONT47	Keersluis KWZ: Opstellen DO ontwerp	150	06-Aug-18 A	07-Jan-20	-129	06-Aug-18	22-Jul-19	-112
344	ONT114	Keersluis KWZ: DO ontwerp gereed voor vergunning	0		13-Nov-19	-109			
345	ONT920	Keersluis KWZ: DO ontwerp gereed voor inkoop staal	0	08-Jan-20		106			
346	**Ontwerpen Keersluis Kornwerderzand UO-Fase**		177	08-Jan-20	17-Sep-20	-116	22-Jul-19	06-Dec-19	-190
347	ONT70	Keersluis KWZ: Opstellen UO ontwerp	177	08-Jan-20	17-Sep-20	-116	22-Jul-19	06-Dec-19	-190
348	**Site Engineering Keersluis Kornwerderzand Realisatiefase**		1022	11-Mar-20	08-Feb-24	-500	23-Jan-20	02-Mar-22	-507
349	ONT112	Keersluis KWZ: Site Engineering	1022	11-Mar-20	08-Feb-24	-500	23-Jan-20	02-Mar-22	-507
350	**Managen ontwerp Keersluis Den Oever**		70	02-May-18 A	30-Aug-19	-246	02-May-18	26-Jul-19	-26
351	ONT107	Keersluis DOV: Managen ontwerp DO-fase	70	02-May-18 A	30-Aug-19	-246	02-May-18	26-Jul-19	-26
352	**Ontwerpen Keersluis Den Oever DO-Fase**		68	02-May-18 A	02-Sep-19	-24	02-May-18	13-Jun-19	-57
353	ONT23	Keersluis DOV: Opstellen DO ontwerp	68	02-May-18 A	30-Aug-19	-232	02-May-18	13-Jun-19	-57
354	ONT840	Keersluis DOV: DO ontwerp gereed voor vergunning	0	01-May-19 A					
355	ONT925	Keersluis DOV: DO ontwerp gereed voor inkoop staal	0	02-Sep-19		-24			
356	**Ontwerpen Keersluis Den Oever UO-Fase**		189	02-Sep-19	11-Jun-20	-232	15-Mar-19	26-Jul-19	-215
357	ONT57	Keersluis DOV: Opstellen UO ontwerp	189	02-Sep-19	11-Jun-20	-232	15-Mar-19	26-Jul-19	-215
358	**Site Engineering Keersluis Den Oever Realisatiefase**		1064	12-Jun-20	10-Jul-24	-564	05-Nov-20	13-May-22	-564
359	ONT117	Keersluis DOV: Site Engineering	456	12-Jun-20	11-Mar-22	-235	05-Nov-20	15-Nov-21	-85
360	ONT750	Keersluis DOV en KWZ: As Built	610	10-Mar-22	10-Jul-24	-564	01-Nov-21	13-May-22	-564
361	**Ontwerpen Haven**		58	19-Mar-18 A	14-Aug-19	190	18-Jun-18	07-Aug-19	-6
362	**Managen Ontwerp Haven**		12	19-Mar-18 A	11-Jun-19	187	18-Jun-18	07-Aug-19	40
363	ONT179	Haven: Managen Ontwerp DO-Fase	12	19-Mar-18 A	11-Jun-19	187	18-Jun-18	07-Aug-19	40
364	**Ontwerpen Haven DO-Fase**		10	18-Jun-18 A	11-Jun-19	177	18-Jun-18	11-Apr-19	-40
365	ONT37	Haven: Opstellen DO Remmings- en geleidewerken KWZ en DOV	10	18-Jun-18 A	11-Jun-19	177	18-Jun-18	11-Apr-19	-40
366	**Ontwerpen Haven UO-Fase**		46	22-Apr-19 A	14-Aug-19	177	11-Apr-19	07-Aug-19	-6
367	ONT53	Haven: Opstellen UO Remmings- en geleidewerken KWZ en DOV	46	22-Apr-19 A	14-Aug-19	177	11-Apr-19	07-Aug-19	-6
368	**Ontwerpen Spuimiddel**		1323	20-Apr-18 A	19-Jun-24	6701	04-Jun-18	21-Apr-22	-565
369	**Managen ontwerp Spuimiddel Bestaand**		472	20-Apr-18 A	16-Mar-21	8	04-Jun-18	10-Apr-20	-243
370	ONT105	Bestaand Spuimiddel: Managen ontwerp DO	332	20-Apr-18 A	01-Sep-20	-62	04-Jun-18	10-Apr-20	-103
371	ONT865	Bestaand Spuimiddel: Managen ontwerp UO	370	22-Apr-19 A	16-Mar-21	8			
372	**Ontwerpen Spuimiddel bestaand Den Oever DO-Fase**		163	04-Jun-18 A	24-Jan-20	7794	05-Jun-18	23-Aug-19	-101
373	ONT122	Bestaand spuimiddel DOV: Ontwerpen DO-fase	100	04-Jun-18 A	15-Oct-19	-239	05-Jun-18	23-Aug-19	-38
374	ONT121	Bestaand spuimiddel DOV - Brugdekken en spatscherm: DO ontwerp	88	13-Aug-18 A	27-Sep-19	-239	12-Apr-19	12-Apr-19	-117
375	ONT785	Bestaand spuimiddel DOV - Renovatie bewegingswerken: DO ontwerp	103	13-Aug-18 A	18-Oct-19	-219			
376	ONT760	Bestaand spuimiddel DOV - Renovatie torens: DO ontwerp	78	22-Aug-18 A	13-Sep-19	-230			
377	ONT120	Bestaand spuimiddel DOV - Schuiven en geleiding: DO ontwerp	103	01-Oct-18 A	18-Oct-19	-197	12-Apr-19	12-Apr-19	-132
378	ONT935	Bestaand spuimiddel DOV - Renovatie fietsbruggen: Ontwerp DO	163	10-Dec-18 A	24-Jan-20	7794			
379	ONT25	Bestaand spuimiddel DOV - Renovatie kokers: Ontwerp DO	138	10-Dec-18 A	06-Dec-19	-115	22-May-19	22-May-19	-141
380	**Ontwerpen Spuimiddel bestaand Den Oever UO-Fase**		190	22-Apr-19 A	26-Jun-20	-47	15-Mar-19	14-Feb-20	-91
381	ONT129	Bestaand spuimiddel DOV: Ontwerpen UO	130	22-Apr-19 A	01-May-20	-29	15-Mar-19	14-Feb-20	-53

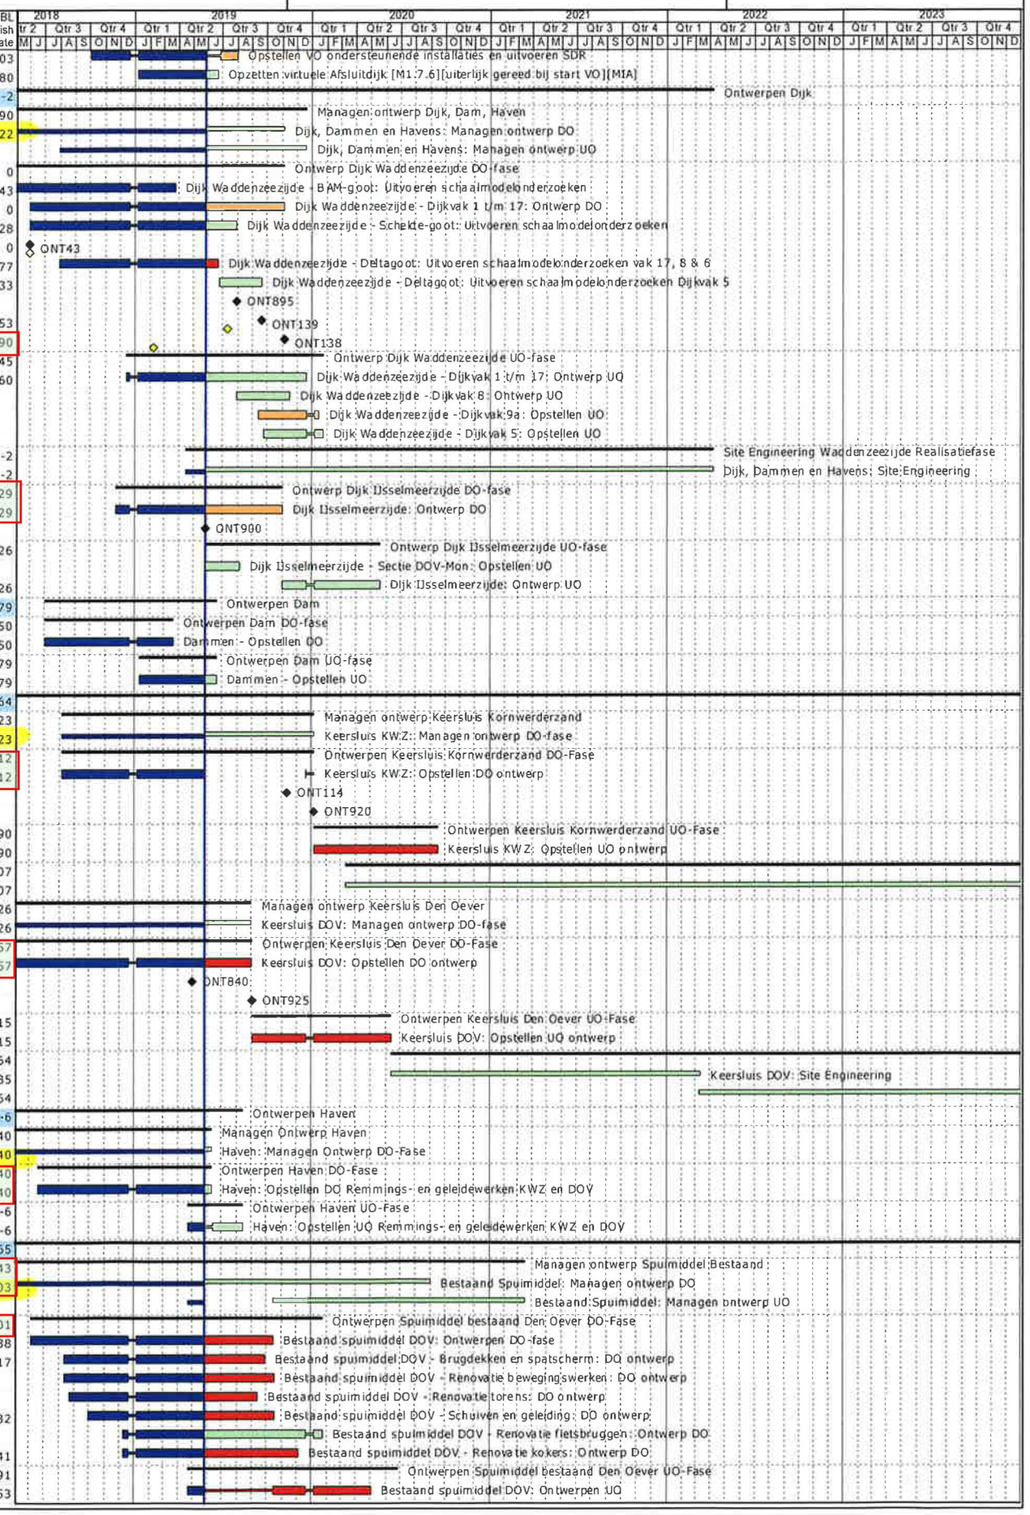

Projectplanning

STANDLIJN: 26-May-19

26-May-19
print datum: 19-Jun-19

layout: WOG 7.0 | lvl4 WOG HR 7.0
vs. versie G
TASK filter: All Activities

#	Activity ID	Omschrijving	Remaining Duration	Start	Finish	Total Float	BL Project Start	BL Project Finish	Variance - BL Project Finish Date
382	ONT765	Bestaand spuimiddel DOV - Renovatie torens: Ontwerp UO	130	16-Sep-19	27-Mar-20	-164			
383	ONT128	Bestaand spuimiddel DOV - Brugdekken & spatscherm: Ontwerp UO	130	30-Sep-19	14-Apr-20	-239	07-Nov-19	07-Nov-19	-102
384	ONT127	Bestaand spuimiddel DOV - Schuiven en geleiding: Ontwerp UO	30	21-Oct-19	29-Nov-19	-68	09-Sep-19	09-Sep-19	-60
385	ONT790	Bestaand spuimiddel DOV - Renovatie bewegingswerken: Ontwerp UO	130	21-Oct-19	06-May-20	-219			
386	ONT126	Bestaand spuimiddel DOV - Renovatie kokers: Ontwerp UO	130	09-Dec-19	26-Jun-20	-47	07-Nov-19	07-Nov-19	-152
387	**Ontwerpen Bestaande Spuigroepen Kornwerderzand DO-Fase**		315	05-Nov-18 A	01-Sep-20	-12	05-Nov-18	15-Nov-19	-193
388	ONT131	Bestaand Spuimiddel KWZ: Ontwerpen DO	315	05-Nov-18 A	01-Sep-20	-62	05-Nov-18	15-Nov-19	-193
389	ONT795	Bestaand Spuimiddel KWZ - Renovatie bewegingswerken: Ontwerpen DO	315	05-Nov-18 A	01-Sep-20	-77			
390	ONT21	Bestaand Spuimiddel KWZ - Schuiven en geleiding: Ontwerpen DO	315	26-Nov-18 A	01-Sep-20	-197	28-May-19	28-May-19	-314
391	ONT770	Bestaand Spuimiddel KWZ - Renovatie torens: Ontwerpen DO	315	26-Nov-18 A	01-Sep-20	-59			
392	ONT18	Bestaand Spuimiddel KWZ - Brugdekken & spatscherm: Ontwerpen DO	315	03-Dec-18 A	01-Sep-20	-62	22-Aug-19	22-Aug-19	-254
393	ONT130	Bestaand Spuimiddel KWZ - Renovatie kokers: Ontwerpen DO	315	03-Dec-18 A	01-Sep-20	-12	19-Sep-19	19-Sep-19	-234
394	**Ontwerpen Bestaande Spuigroepen Kornwerderzand UO-Fase**		130	02-Sep-20	16-Mar-21	103	12-Jul-19	14-Apr-20	-228
395	ONT51	Bestaand Spuimiddel KWZ - Brugdekken & spatscherm: Ontwerpen UO	130	02-Sep-20	16-Mar-21	8	12-Mar-20	12-Mar-20	-249
396	ONT54	Bestaand Spuimiddel KWZ - Schuiven en geleiding: Ontwerpen UO	30	02-Sep-20	13-Oct-20	-197	09-Sep-19	09-Sep-19	-272
397	ONT135	Bestaand Spuimiddel KWZ - Renovatie kokers: Ontwerpen UO	130	02-Sep-20	16-Mar-21	103	12-Mar-20	12-Mar-20	-249
398	ONT132	Bestaand Spuimiddel KWZ: Ontwerpen UO	130	02-Sep-20	16-Mar-21	8	12-Jul-19	14-Apr-20	-228
399	ONT800	Bestaand Spuimiddel KWZ - Renovatie bewegingswerken: Ontwerpen UO	130	02-Sep-20	16-Mar-21	-77			
400	ONT775	Bestaand Spuimiddel KWZ - Renovatie torens: Ontwerpen UO	130	02-Sep-20	16-Mar-21	11			
401	**Site Engineering Spuimiddel bestaand**		1252	18-Jun-19	03-Apr-24	-494	28-May-19	06-May-21	-760
402	ONT685	Bestaand Spuimiddel: Site Engineering	1252	18-Jun-19	03-Apr-24	-494	28-May-19	06-May-21	-760
403	**As Built Bestaande Spuimiddelen**		135	14-Dec-23	19-Jun-24	-565	17-Sep-21	21-Apr-22	-565
404	ONT700	Bestaand Spuimiddel: As Built	135	14-Dec-23	19-Jun-24	-565	17-Sep-21	21-Apr-22	-565
405	**Managen ontwerp Spuimiddel Nieuw**		215	04-Jun-18 A	20-Mar-20	154	17-Sep-18	25-Apr-19	-237
406	ONT175a	Nieuw Spuimiddel: Managen ontwerp DO-fase	65	04-Jun-18 A	23-Aug-19	154			
407	ONT59	Uitvoeren schaalmodelonderzoek bodembescherming + afvoercoefficienten [SMO-1]	10	17-Sep-18 A	11-Jun-19	-319	17-Sep-18	25-Jan-19	-94
408	ONT870	Nieuw Spuimiddel: Managen ontwerp UO-fase	150	15-Apr-19 A	20-Mar-20	154			
409	ONT65	Uitvoeren schaalmodelonderzoek aanstroming pompen [SMO-2]	72	16-Apr-19 A	05-Sep-19	210	07-Jan-19	04-Feb-19	-150
410	ONT69	Nieuw Spuimiddel - Pompgroepen: Uitvoeren schaalmodelonderzoek waaier pomp [SM	50	07-Oct-19	13-Dec-19	25	26-Mar-19	25-Apr-19	-165
411	**Ontwerpen Pompen Den Oever DO-Fase**		143	04-Jun-18 A	13-Dec-19	7	04-Jun-18	20-Aug-19	-84
412	ONT26	Nieuwe Pompgroepen - Pompen - Ontwerp DO	143	04-Jun-18 A	13-Dec-19	7	04-Jun-18	20-Aug-19	-84
413	ONT97	Nieuwe Pompgroepen - Pompen: Afsluiten contract - Inkoop Engineering & Fabricage	0	25-Jun-18 A	29-Jun-18 A		25-Jun-18	29-Jun-18	0
414	ONT98	Nieuwe Pompgroepen - Pompen: Afsluiten contract - Inkoop Montage & Testen	0	25-Jun-18 A	29-Jun-18 A		25-Jun-18	29-Jun-18	0
415	**Ontwerpen Pompen Den Oever UO-Fase**		200	16-Dec-19	09-Oct-20	72	29-May-19	24-Apr-20	-118
416	ONT140	Nieuwe Pompgroepen - Pompen: Ontwerp UO	200	16-Dec-19	09-Oct-20	72	29-May-19	24-Apr-20	-118
417	**Ontwerpen Nieuwe Spuigroepen Den Oever DO-Fase**		248	04-Jun-18 A	29-May-20	-151	04-Jun-18	19-Sep-19	-167
418	ONT755	Nieuwe Spuigroepen - Staal: Ontwerp DO	248	04-Jun-18 A	29-May-20	-161			
419	ONT28	Nieuwe Spuigroepen: Ontwerpen DO-Fase	248	04-Jun-18 A	28-May-20	-547	04-Jun-18	02-Aug-19	-201
420	ONT725	Nieuwe Spuigroepen - Bouwkuipen: Ontwerp DO	248	04-Jun-18 A	28-May-20	-547	07-May-19	07-May-19	-262
421	ONT27	Nieuwe Spuigroepen - Bewegingswerk: Ontwerp DO	248	04-Jun-18 A	29-May-20	-151	04-Jun-18	19-Sep-19	-167
422	ONT22	Nieuwe Spuigroepen - Bouwkuipen: Ontwerp DO (tbv vergunning)	0	04-Jun-18 A	04-Oct-18 A		04-Jun-18	05-Oct-18	1
423	ONT820	Nieuwe Spuigroepen - Betonwerk: Ontwerp DO	248	04-Jun-18 A	28-May-20	-430			
424	**Ontwerpen Nieuwe Spuigroepen Den Oever UO-Fase**		177	13-May-19 A	17-Feb-21	-151	04-Mar-19	05-Jun-20	-173
425	ONT77	Nieuwe Spuigroepen: Ontwerpen UO	177	13-May-19 A	16-Feb-21	-151	04-Mar-19	05-Jun-20	-173
426	ONT55	Nieuwe Spuigroepen - Bouwkuipen Noord: Ontwerp UO	177	29-May-20	16-Feb-21	-547	31-May-19	31-May-19	-422
427	ONT825	Nieuwe Spuigroepen - Betonwerk & bouwkuip Zuid: Ontwerp UO	177	29-May-20	16-Feb-21	-297			
428	ONT125	Nieuwe Spuigroepen - Bewegingswerk: Ontwerp UO	177	29-May-20	17-Feb-21	-151	19-Sep-19	07-Nov-19	-309
429	ONT805	Nieuwe Spuigroepen - Schuiven: Ontwerp UO	30	29-May-20	13-Jul-20	-161			
430	**Ontwerpen Pompgroepen Den Oever DO-Fase**		135	04-Jun-18 A	03-Dec-19	210	04-Jun-18	26-Sep-19	-49
431	ONT227	Nieuwe Pompgroepen - Bouwkuip en fundering: Ontwerp DO	90	04-Jun-18 A	01-Oct-19	-130	02-May-19	02-May-19	-107
432	ONT830	Nieuwe Pompgroepen - Betonwerk: Ontwerp DO	90	04-Jun-18 A	01-Oct-19	-129			
433	ONT226	Nieuwe Pompgroepen: Ontwerpen DO-Fase	90	04-Jun-18 A	01-Oct-19	-130	04-Jun-18	26-Sep-19	-4
434	ONT810	Nieuwe Pompgroepen - Staal: Ontwerp DO	90	04-Jun-18 A	01-Oct-19	-3			
435	ONT910	Nieuwe Pompgroepen - WTB: Ontwerp DO	135	04-Jun-18 A	03-Dec-19	210			
436	**Ontwerpen Pompgroepen Den Oever UO-Fase**		230	22-Apr-19 A	11-Aug-20	240	29-May-19	10-Feb-20	-127
437	ONT690	Nieuwe Pompgroepen: Ontwerpen UO	165	22-Apr-19 A	09-Jun-20	97	29-May-19	10-Feb-20	-82
438	ONT780	Nieuwe Pompgroepen - Bouwkuip Noord: Ontwerp UO	30	04-Sep-19	15-Oct-19	-58			
439	ONT815	Nieuwe Pompgroepen - Schuiven: Ontwerp UO	30	02-Oct-19	12-Nov-19	-3			
440	ONT835	Nieuwe Pompgroepen - Betonwerk & Bouwkuip Zuid: Ontwerp UO	165	02-Oct-19	09-Jun-20	-129			
441	ONT915	Nieuwe Pompgroepen - WTB: Ontwerp UO	165	04-Dec-19	11-Aug-20	240			
442	**Ontwerpen Bodembescherming Den Oever IJsselmeerzijde DO-Fase**		0	05-Jun-18 A	15-Mar-19 A		05-Jun-18	18-Mar-19	0
443	ONT16	Bestaand Spuimiddel DOV - Bodembescherming: Opstellen DO deel 1	0	05-Jun-18 A	12-Jul-18 A		05-Jun-18	12-Jul-18	1
444	ONT92	Opstellen DO bodembescherming bestaand Spuimiddel Den Oever; deel 2	0	13-Jul-18 A	15-Mar-19 A		13-Jul-18	18-Mar-19	0
445	**Ontwerpen Bodembescherming Den Oever IJsselmeerzijde UO-Fase**		0	03-Dec-18 A	24-May-19 A		03-Dec-18	29-May-19	3
446	ONT45	Bestaand Spuimiddel DOV - Bodembescherming: Ontwerp UO	0	03-Dec-18 A	24-May-19 A		03-Dec-18	29-May-19	3
447	**Ontwerpen Bodembescherming Den Oever Waddenzeezijde DO-Fase**		115	05-Oct-18 A	05-Nov-19	7682	17-Sep-18	29-May-19	-113
448	ONT195	Bodembescherming Den Oever - Waddenzeezijde: Ontwerp DO	115	05-Oct-18 A	05-Nov-19	7682	17-Sep-18	29-May-19	-113
449	**Ontwerpen Bodembescherming Den Oever Waddenzeezijde UO-Fase**		160	06-Nov-19	07-Jul-20	7682	01-May-19	27-Jan-20	-112
450	ONT197	Bodembescherming DOV - Waddenzeezijde: Ontwerp UO	160	06-Nov-19	07-Jul-20	7682	01-May-19	27-Jan-20	-112
451	**Ontwerpen Stabiliteitsconstructie Kornwerderzand IJsselmeerzijde DO-Fase**		77	05-Jun-18 A	12-Sep-19	51	05-Jun-18	13-Sep-19	0
452	ONT20	Bestaand Spuimiddel KWZ - Stabiliteitsconstructie: Opstellen DO	77	05-Jun-18 A	12-Sep-19	51	05-Jun-18	13-Sep-19	0
453	**Ontwerpen Stabiliteitsconstructie Kornwerderzand IJsselmeerzijde UO-Fase**		170	13-Sep-19	27-May-20	76	19-Jul-19	06-Mar-20	-55
454	ONT50	Bestaand Spuimiddel KWZ - Stabiliteitsconstructie: Opstellen UO	170	13-Sep-19	27-May-20	76	19-Jul-19	06-Mar-20	-55
455	**Ontwerpen Bodembescherming Kornwerderzand Waddenzeezijde DO-Fase**		35	17-Sep-18 A	16-Jul-19	257	17-Sep-18	15-Jul-19	-2
456	ONT196	Bestaand spuimiddel KWZ - Bodembescherming Waddenzeezijde: Ontwerp DO	35	17-Sep-18 A	16-Jul-19	257	17-Sep-18	15-Jul-19	-2
457	**Ontwerpen Bodembescherming Kornwerderzand Waddenzeezijde UO-Fase**		235	17-Jul-19	01-Jul-20	257	15-Jul-19	13-Jan-20	-117
458	ONT198	Bestaand Spuimiddel KWZ - Bodembescherming Waddenzeezijde: Ontwerp UO	235	17-Jul-19	01-Jul-20	257	15-Jul-19	13-Jan-20	-117

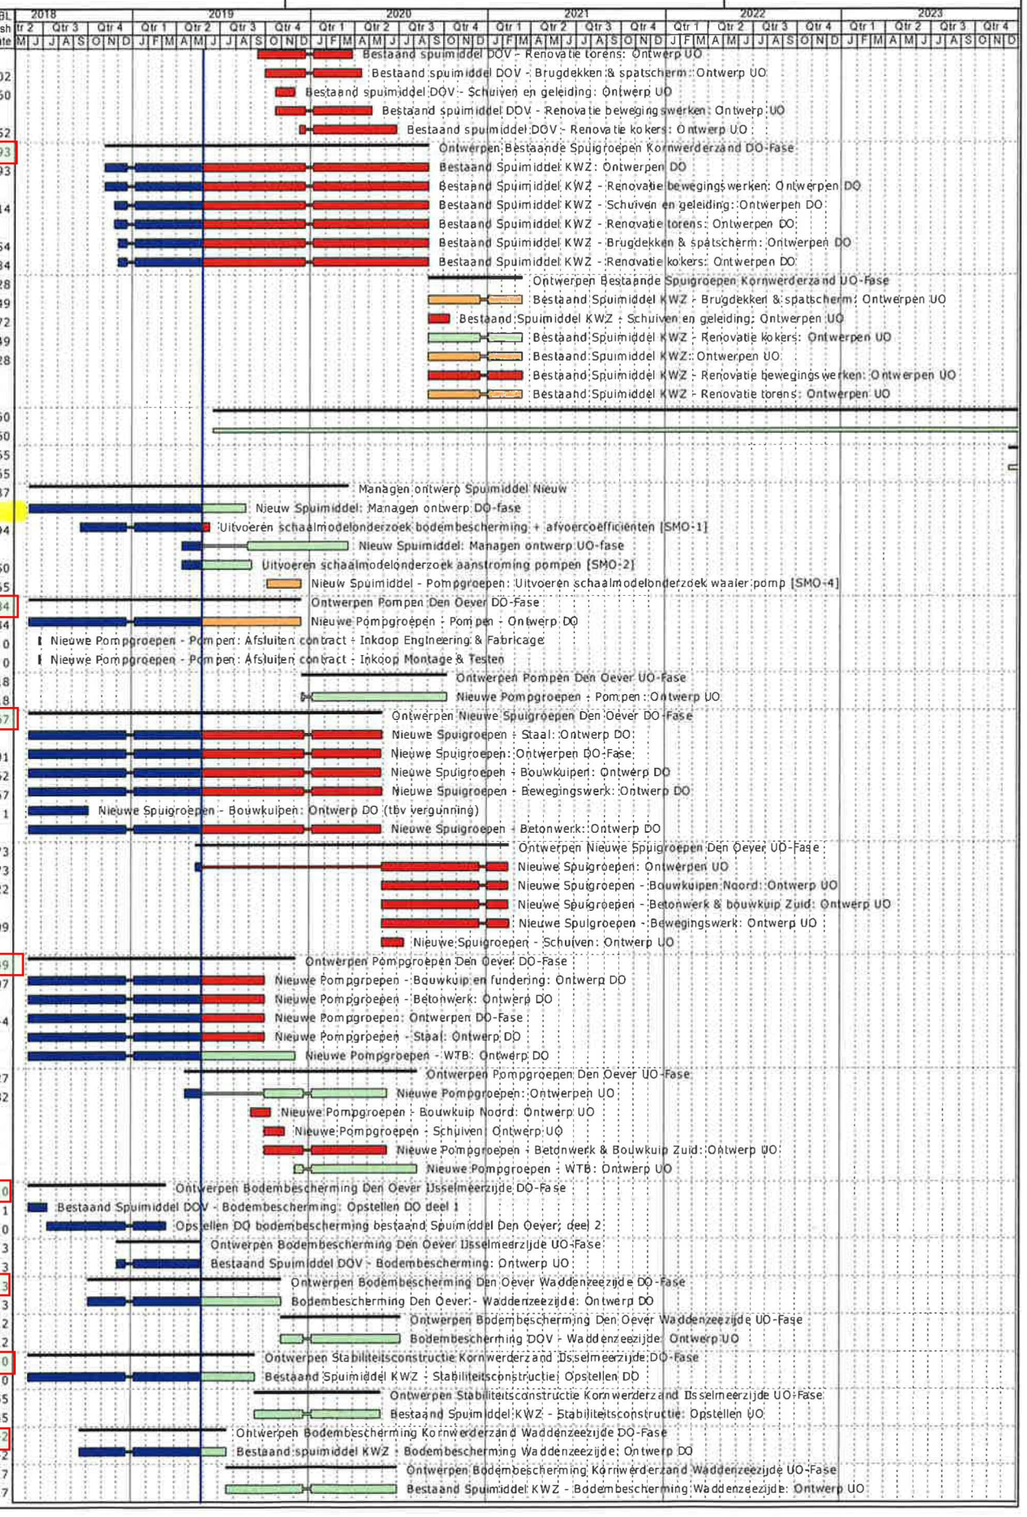

Projectplanning

STANDLIJN: 26-May-19

26-May-19
print datum: 19-Jun-19

layout: WOG 7.0 | lvl4 WOG HR 7.0
vs. versie G
TASK filter: All Activities

#	Activity ID	Omschrijving	Remaining Duration	Start	Finish	Total Float	BL Project Start	BL Project Finish	Variance - BL Project Finish Date
459	**Site Engineering Pompen Den Oever**		871	16-Oct-19	03-May-23	-543	21-Jan-19	12-Mar-21	-529
460	ONT705	Nieuwe Pompgroepen: Site Engineering	871	16-Oct-19	03-May-23	-543	21-Jan-19	12-Mar-21	-529
461	**As Built Nieuwe Pompen Den Oever**		260	08-Jun-23	19-Jun-24	-542	02-Jul-21	21-Apr-22	-542
462	ONT710	Nieuwe Pompgroepen: As Built	260	08-Jun-23	19-Jun-24	-542	02-Jul-21	21-Apr-22	-542
463	**Site Engineering Nieuwe Spuimiddelen Den Oever**		546	17-Feb-21	03-May-23	-543	21-Jan-19	12-Mar-21	-529
464	ONT715	Nieuwe Spuigroepen: Site Engineering	546	17-Feb-21	03-May-23	-543	21-Jan-19	12-Mar-21	-529
465	**As Built Nieuwe Spuimiddelen Den Oever**		285	04-May-23	19-Jun-24	-542	02-Jul-21	21-Apr-22	-542
466	ONT720	Nieuwe Spuigroepen: As Built	285	04-May-23	19-Jun-24	-542	02-Jul-21	21-Apr-22	-542
467	**Ontwerp Wegen**		1271	20-Apr-18 A	10-Jul-24	-542	04-Jun-18	11-Apr-22	-563
468	**Managen Ontwerp Wegen**		194	20-Apr-18 A	09-Mar-20	24			
469	ONT144a	Wegen: Managen Ontwerp DO	70	20-Apr-18 A	03-Sep-19	24			
470	ONT875	Wegen: Managen Ontwerp UO	124	04-Sep-19	09-Mar-20	24			
471	**Algemene ontwerpactiviteiten wegen**		25	29-Jun-18 A	02-Jul-19	8	11-Jun-18	14-Feb-20	152
472	ONT145	Wegen: Algemene ontwerpactiviteiten	25	29-Jun-18 A	02-Jul-19	8	11-Jun-18	14-Feb-20	152
473	**Ontwerpen HWN DO-Fase**		70	29-Jun-18 A	03-Sep-19	24	29-Jun-18	07-Jun-19	-62
474	ONT42	Wegen - Hoofd Wegennet: Ontwerpen DO	70	29-Jun-18 A	03-Sep-19	24	29-Jun-18	07-Jun-19	-62
475	**Ontwerpen OWN DO-Fase**		89	29-Jun-18 A	30-Sep-19	423	02-Jul-18	21-Jun-19	-72
476	ONT64	Wegen - Onderliggend Wegennet: Ontwerp DO	89	29-Jun-18 A	30-Sep-19	423	02-Jul-18	21-Jun-19	-72
477	**Ontwerpen Tijdelijke situaties/faseringen**		89	29-Jun-18 A	30-Sep-19	423	04-Jun-18	16-Sep-19	-11
478	ONT160	Wegen - Tijdelijke situaties/faseringen: Ontwerpen DO	89	29-Jun-18 A	30-Sep-19	423	04-Jun-18	16-Sep-19	-11
479	**Ontwerpen afwatering en waterhuishouding DO-fase**		55	13-Aug-18 A	13-Aug-19	43	13-Aug-18	30-Apr-19	-74
480	ONT150	Wegen - Afwatering en waterhuishouding: Ontwerpen DO	55	13-Aug-18 A	13-Aug-19	43	13-Aug-18	30-Apr-19	-74
481	**Rapporteren Geotechniek Wegen DO-fase**		50	27-Aug-18 A	06-Aug-19	63	27-Aug-18	01-May-19	-68
482	ONT151	Wegen - Geotechniek: Ontwerpen DO	50	27-Aug-18 A	06-Aug-19	63	27-Aug-18	01-May-19	-68
483	**Ontwerpen Technische installaties Wegen DO-fase**		90	10-Sep-18 A	01-Oct-19	8	10-Sep-18	08-May-19	-103
484	ONT165	Wegen - Technische installaties: Ontwerpen DO	90	10-Sep-18 A	01-Oct-19	8	10-Sep-18	08-May-19	-103
485	**Raporteren Verhardingsontwerp Wegen DO-fase**		70	27-Aug-18 A	03-Sep-19	48	27-Aug-18	29-May-19	-68
486	ONT167	Wegen - Verhardingsontwerp: Ontwerpen DO	70	27-Aug-18 A	03-Sep-19	48	27-Aug-18	29-May-19	-68
487	**Ontwerpen HWN UO-Fase**		170	02-Jul-19	09-Mar-20	24	01-Apr-19	07-Jan-20	-45
488	ONT74	Wegen - Hoofd Wegennet: Ontwerpen UO	170	02-Jul-19	09-Mar-20	24	01-Apr-19	07-Jan-20	-45
489	**Ontwerpen OWN UO-Fase**		120	03-Sep-19	02-Mar-20	507	04-Mar-19	19-Sep-19	-108
490	ONT78	Wegen - Onderliggend Wegennet: Ontwerp UO	120	03-Sep-19	02-Mar-20	507	04-Mar-19	19-Sep-19	-108
491	**Ontwerpen Afwatering en waterhuishouding UO-fase**		120	14-Aug-19	11-Feb-20	43	04-Feb-19	19-Jul-19	-138
492	ONT155	Wegen - Afwatering en waterhuishouding: Ontwerpen UO	120	14-Aug-19	11-Feb-20	43	04-Feb-19	19-Jul-19	-138
493	**Ontwerpen Technische installaties Wegen UO-fase**		120	02-Oct-19	31-Mar-20	8	01-Apr-19	24-Jun-19	-192
494	ONT166	Wegen - Ontwerpen Technische installaties Wegen UO-fase	120	02-Oct-19	31-Mar-20	8	01-Apr-19	24-Jun-19	-192
495	**Site engineering Wegen**		505	01-Apr-20	21-Apr-22	14	25-Sep-19	11-Apr-22	-7
496	ONT171	Wegen: Site engineering	505	01-Apr-20	21-Apr-22	14	25-Sep-19	11-Apr-22	-7
497	**As-built Wegen**		244	21-Jul-23	10-Jul-24	-542	31-Aug-21	23-Nov-21	-652
498	ONT172	Wegen: As-built	244	21-Jul-23	10-Jul-24	-542	31-Aug-21	23-Nov-21	-652
499	**Instandhoudingsrapporten Wegen**		95	01-Oct-19	24-Feb-20	423	21-Jun-19	08-Nov-19	-67
500	ONT173	Wegen: Instandhoudingsrapporten	95	01-Oct-19*	24-Feb-20	423	21-Jun-19	08-Nov-19	-67
501	**Installatiegebouwen**		100	01-Aug-19	18-Dec-19	7641			
502	**Ontwerp Installatiegebouwen**		100	01-Aug-19	18-Dec-19	7641			
503	ONT890	Installatiegebouwen: Ontwerp DO + UO	100	01-Aug-19	18-Dec-19	7641			
504	**Ontwerpen Integrale Installaties**		200	01-Aug-19	26-May-20	28	05-Mar-19	16-Dec-19	-103
505	**Managen ontwerp technische integrale installaties**		200	01-Aug-19	26-May-20	28	05-Mar-19	16-Dec-19	-103
506	ONT72	Ondersteunende installaties: Ontwerp DO en uitvoeren PDR	100	01-Aug-19	18-Dec-19	28	05-Mar-19	29-Jul-19	-103
507	ONT80	Ondersteunende installaties: Ontwerp UO en uitvoeren CDR	100	19-Dec-19	26-May-20	28	29-Jul-19	16-Dec-19	-103
508	**Ontwerp Doorlaatmiddel VMR**		1256	02-May-18 A	19-Jun-24	-542	02-May-18	23-Dec-21	-615
509	**Managen Ontwerp Doorlaatmiddel VMR**		230	02-May-18 A	01-May-20	53	02-May-18	29-Nov-19	-98
510	ONT170	Doorlaatmiddel VMR: Managen Ontwerp	230	02-May-18 A	01-May-20	53	02-May-18	29-Nov-19	-98
511	**Ontwerpen Doorlaatmiddel VMR DO-Fase**		130	02-May-18 A	26-Nov-19	-9	02-May-18	12-Jul-19	-98
512	ONT19	Doorlaatmiddel VMR - Tijdelijk werkeiland & by-pass VMR: Ontwerp VO/DO/UO	0	02-May-18 A	21-Mar-19 A		02-May-18	02-May-19	28
513	ONT67	Doorlaatmiddel VMR: Opstellen ontwerp DO	130	07-Jan-19 A	26-Nov-19	-9	07-Jan-19	12-Jul-19	-98
514	**Ontwerpen Doorlaatmiddel VMR UO-Fase**		100	27-Nov-19	01-May-20	53	12-Jul-19	29-Nov-19	-98
515	ONT79	Doorlaatmiddel VMR: Opstellen ontwerp UO	100	27-Nov-19	01-May-20	53	12-Jul-19	29-Nov-19	-98
516	**Site Engineering Doorlaatmiddel VMR Realisatiefase**		628	15-Aug-19	07-Mar-22	-2	02-May-19	23-Dec-21	-43
517	ONT680	Doorlaatmiddel VMR: Site Engineering	628	15-Aug-19	07-Mar-22	-2	02-May-19	23-Dec-21	-43
518	**As Built Doorlaatmiddel VMR Realisatiefase**		971	22-Jul-20	19-Jun-24	-542			
519	ONT880	Doorlaatmiddel VMR: As Built	971	22-Jul-20	19-Jun-24	-542			
520	**Ontwerpen Zoutwaterafvoersysteem Den Oever**		130	27-May-19	26-Nov-19	537	30-May-18	10-Jul-19	-100
521	**Ontwerpen Zoutwaterafvoersysteem Den Oever**		130	27-May-19	26-Nov-19	537	30-May-18	10-Jul-19	-100
522	ONT96	Zoutwaterafvoersysteem DOV: Opstellen VO/DO/UO	130	27-May-19	26-Nov-19	537	30-May-18	10-Jul-19	-100
523	**Ontwerpen Zoutwaterafvoersysteem Kornwerderzand**		130	27-May-19	26-Nov-19	504	30-May-18	10-Jul-19	-100
524	**Ontwerpen Zoutwaterafvoersysteem Kornwerderzand**		130	27-May-19	26-Nov-19	504	30-May-18	10-Jul-19	-100
525	ONT100	Zoutwaterafvoersysteem KWZ: Opstellen VO/DO/UO	130	27-May-19	26-Nov-19	504	30-May-18	10-Jul-19	-100
526	**Ontwerpen Vispassage Den Oever**		130	27-May-19	26-Nov-19	7827	30-May-18	10-Jul-19	-100
527	**Ontwerpen Vispassage Den Oever**		130	27-May-19	26-Nov-19	7827	30-May-18	10-Jul-19	-100
528	ONT101	Vispassage DOV: Opstellen VO/DO/UO	130	27-May-19	26-Nov-19	7827	30-May-18	10-Jul-19	-100
529	**Ontwerpen Bruggen**		240	19-Apr-19 A	15-May-20	7717	07-Jan-19	23-Aug-19	-178
530	**Managen ontwerp Brug**		160	19-Apr-19 A	21-Jan-20	234			
531	ONT52a	Bruggen: Managen ontwerp DO-fase	80	19-Apr-19 A	17-Sep-19	314			
532	ONT52b	Bruggen: Managen ontwerp UO-fase	80	18-Sep-19	21-Jan-20	169			
533	**Ontwerpen Nieuwe loopbrug Monument DO-fase**		80	27-May-19	17-Sep-19	314	07-Jan-19	01-May-19	-98
534	ONT63	Bruggen - Loopbrug Monument: Opstellen DO	80	27-May-19	17-Sep-19	314	07-Jan-19	01-May-19	-98
535	**Ontwerpen Handhaven bestaande bruggen DO-fase**		80	27-May-19	17-Sep-19	169	07-Jan-19	01-May-19	-98

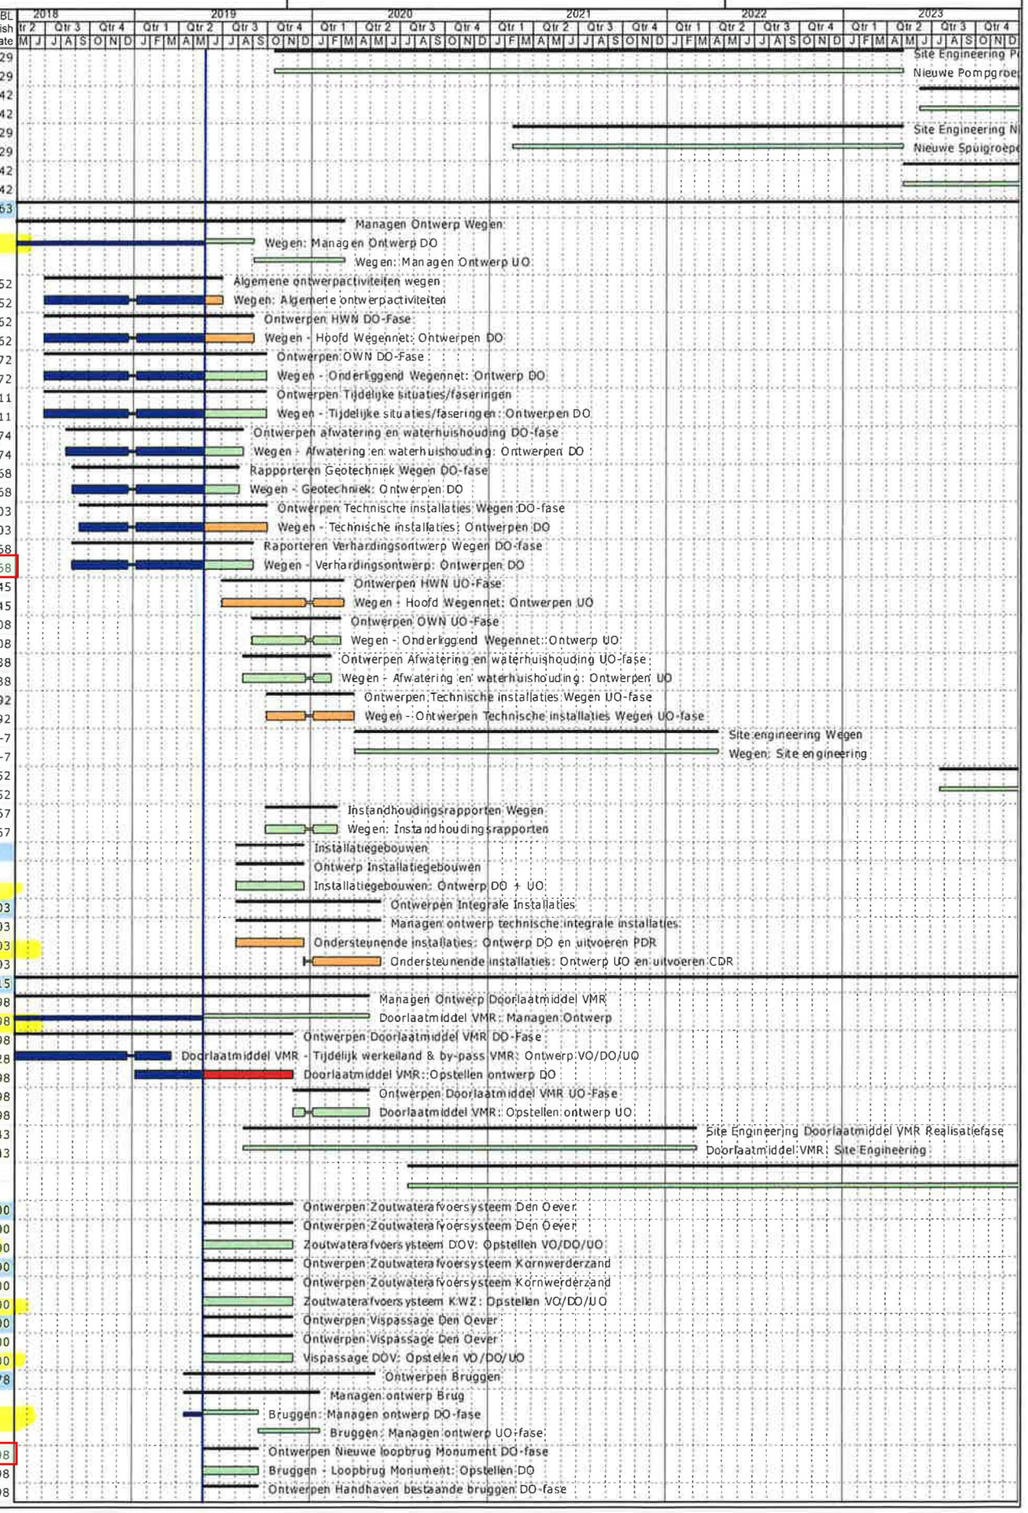

Projectplanning

STANDLIJN: 26-May-19

26-May-19
print datum: 19-Jun-19

layout: WOG 7.0 | lvl4 WOG HR 7.0
vs. versie G
TASK filter: All Activities
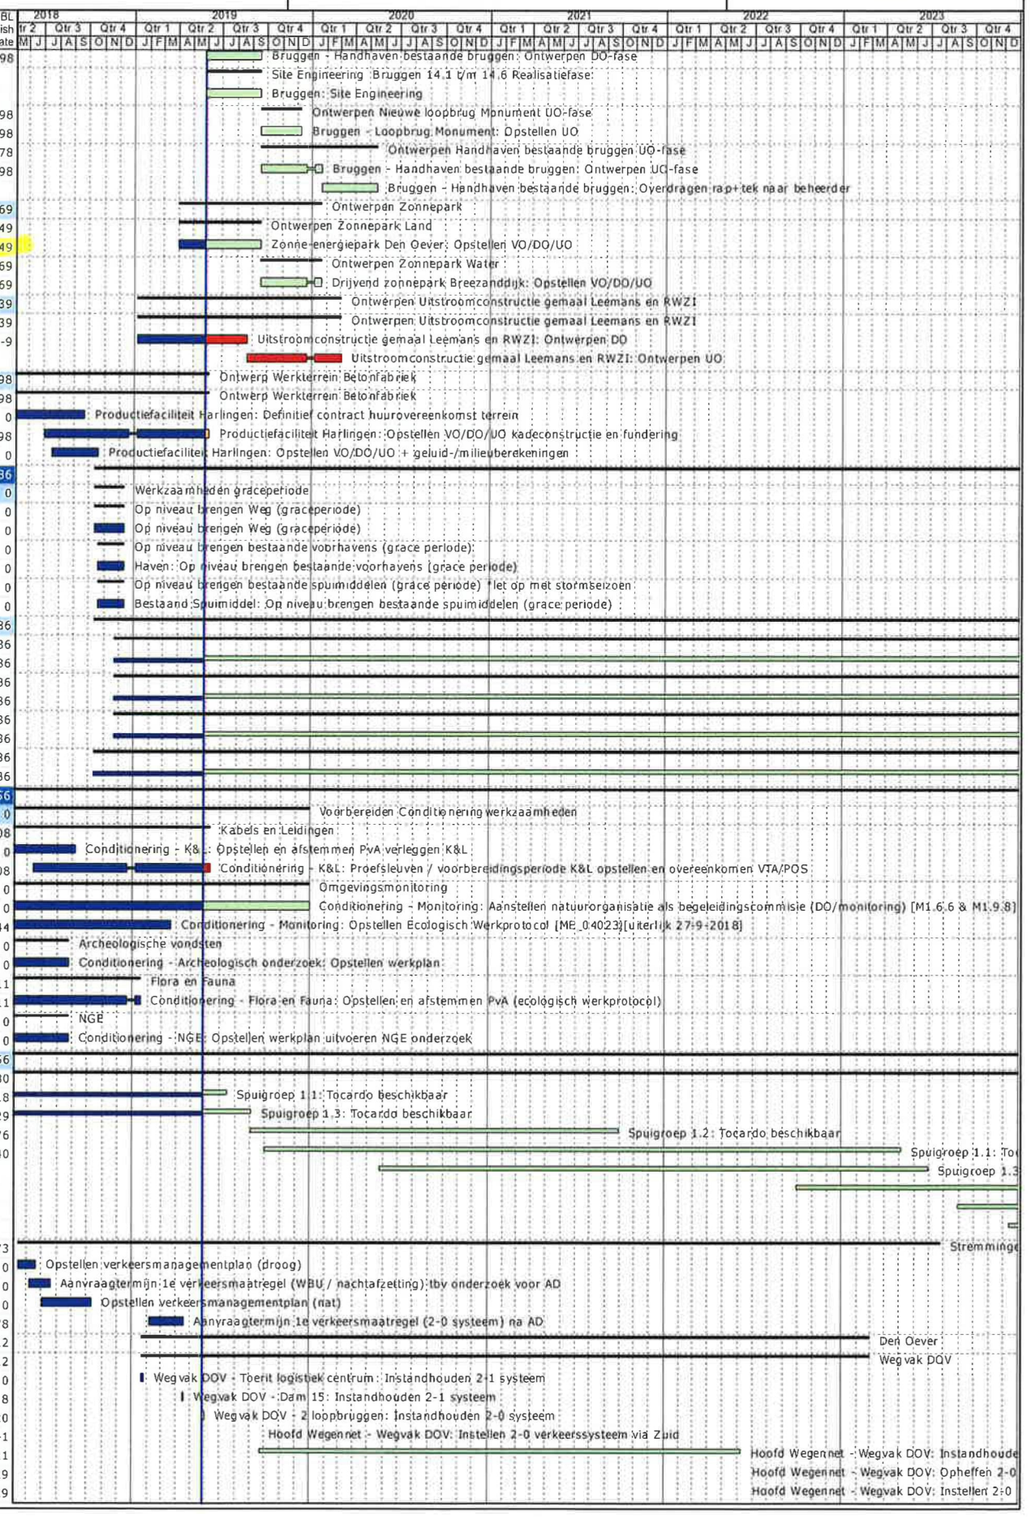
#	Activity ID	Omschrijving	Remaining Duration	Start	Finish	Total Float	BL Project Start	BL Project Finish	Variance - BL Project Finish Date
536	ONT106	Bruggen - Handhaven bestaande bruggen: Ontwerpen DO-fase	80	27-May-19*	17-Sep-19	169	07-Jan-19	01-May-19	-98
537	**Site Engineering Bruggen 14.1 t/m 14.6 Realisatiefase**		80	27-May-19	17-Sep-19	7877			
538	ONT930	Bruggen: Site Engineering	80	27-May-19*	17-Sep-19	7877			
539	**Ontwerpen Nieuwe loopbrug Monument UO-fase**		60	18-Sep-19	10-Dec-19	459	01-May-19	26-Jul-19	-98
540	ONT76	Bruggen - Loopbrug Monument: Opstellen UO	60	18-Sep-19	10-Dec-19	459	01-May-19	26-Jul-19	-98
541	**Ontwerpen Handhaven bestaande bruggen UO-fase**		160	18-Sep-19	15-May-20	489	01-May-19	23-Aug-19	-178
542	ONT109	Bruggen - Handhaven bestaande bruggen: Ontwerpen UO-fase	80	18-Sep-19	21-Jan-20	169	01-May-19	23-Aug-19	-98
543	ONT885	Bruggen - Handhaven bestaande bruggen: Overdragen rap+tek naar beheerder	80	22-Jan-20	15-May-20	489			
544	**Ontwerpen Zonnepark**		160	01-Apr-19 A	21-Jan-20	317	02-Jun-20	22-Sep-20	169
545	**Ontwerpen Zonnepark Land**		80	01-Apr-19 A	17-Sep-19	233	02-Jun-20	22-Sep-20	249
546	ONT82	Zonne-energiepark Den Oever: Opstellen VO/DO/UO	80	01-Apr-19 A	17-Sep-19	233	02-Jun-20	22-Sep-20	249
547	**Ontwerpen Zonnepark Water**		80	18-Sep-19	21-Jan-20	317	02-Jun-20	22-Sep-20	169
548	ONT83	Drijvend zonnepark Breezanddijk: Opstellen VO/DO/UO	80	18-Sep-19	21-Jan-20	317	02-Jun-20	22-Sep-20	169
549	**Ontwerpen Uitstroomconstructie gemaal Leemans en RWZI**		190	07-Jan-19 A	03-Mar-20	-111	14-May-19	08-Aug-19	-139
550	**Ontwerpen Uitstroomconstructie gemaal Leemans en RWZI**		190	07-Jan-19 A	03-Mar-20	-111	14-May-19	08-Aug-19	-139
551	ONT91	Uitstroomconstructie gemaal Leemans en RWZI: Ontwerpen DO	60	07-Jan-19 A	20-Aug-19	-147	14-May-19	08-Aug-19	-9
552	A7300	Uitstroomconstructie gemaal Leemans en RWZI: Ontwerpen UO	130	21-Aug-19	03-Mar-20	-111			
553	**Ontwerp Werkterrein Betonfabriek**		5	22-Feb-18 A	03-Jun-19	37	22-Feb-18	14-Jan-19	-98
554	**Ontwerp Werkterrein Betonfabriek**		5	22-Feb-18 A	03-Jun-19	37	22-Feb-18	14-Jan-19	-98
555	FAB12	Productiefaciliteit Harlingen: Definitief contract huurovereenkomst terrein	0	22-Feb-18 A	21-Sep-18 A		22-Feb-18	21-Sep-18	0
556	ONT40	Productiefaciliteit Harlingen: Opstellen VO/DO/UO kadeconstructie en fundering	5	02-Jul-18 A	03-Jun-19	11	02-Jul-18	14-Jan-19	-98
557	ONT41	Productiefaciliteit Harlingen: Opstellen VO/DO/UO + geluid-/milieuberekeningen	0	16-Jul-18 A	19-Oct-18 A		16-Jul-18	19-Oct-18	0
558	**INSTANDHOUDING**		1922	12-Oct-18 A	28-Aug-24	-786	12-Oct-18	05-Jul-22	-786
559	**Werkzaamheden graceperiode**		0	13-Oct-18 A	11-Dec-18 A		13-Oct-18	11-Dec-18	0
560	**Op niveau brengen Weg (graceperiode)**		0	13-Oct-18 A	11-Dec-18 A		13-Oct-18	11-Dec-18	0
561	IN102	Op niveau brengen Weg (graceperiode)	0	13-Oct-18 A	11-Dec-18 A		13-Oct-18	11-Dec-18	0
562	**Op niveau brengen bestaande voorhavens (grace periode)**		0	20-Oct-18 A	11-Dec-18 A		20-Oct-18	11-Dec-18	0
563	IN101	Haven: Op niveau brengen bestaande voorhavens (grace periode)	0	20-Oct-18 A	11-Dec-18 A		20-Oct-18	11-Dec-18	0
564	**Op niveau brengen bestaande spuimiddelen (grace periode) *let op met stormseizoen**		0	20-Oct-18 A	11-Dec-18 A		20-Oct-18	11-Dec-18	0
565	IN100	Bestaand Spuimiddel: Op niveau brengen bestaande spuimiddelen (grace periode)	0	20-Oct-18 A	11-Dec-18 A		20-Oct-18	11-Dec-18	0
566	**Onderhoud gedurende realisatie periode**		1922	12-Oct-18 A	28-Aug-24	-786	12-Oct-18	05-Jul-22	-786
567	**Uitvoeren baggeronderhoud haven Breezanddijk (1x per jaar)**		1922	23-Nov-18 A	28-Aug-24	-786	23-Nov-18	05-Jul-22	-786
568	IN106	Haven: Uitvoeren baggeronderhoud haven Breezanddijk (1x per jaar)	1922	23-Nov-18 A	28-Aug-24	-786	23-Nov-18	05-Jul-22	-786
569	**Uitvoeren baggeronderhoud haven Den Oever (2x per jaar)**		1922	23-Nov-18 A	28-Aug-24	-786	23-Nov-18	05-Jul-22	-786
570	IN105	Haven: Uitvoeren baggeronderhoud haven Den Oever (2x per jaar)	1922	23-Nov-18 A	28-Aug-24	-786	23-Nov-18	05-Jul-22	-786
571	**Uitvoeren baggeronderhoud haven Kornwerderzand (4x per jaar)**		1922	23-Nov-18 A	28-Aug-24	-786	23-Nov-18	05-Jul-22	-786
572	IN104	Haven: Uitvoeren baggeronderhoud haven Kornwerderzand (4x per jaar)	1922	23-Nov-18 A	28-Aug-24	-786	23-Nov-18	05-Jul-22	-786
573	**Uitvoeren onderhoud tijdens realisatiefase (AD tot BD)**		1922	12-Oct-18 A	28-Aug-24	-786	12-Oct-18	05-Jul-22	-786
574	IN103	Uitvoeren onderhoud tijdens realisatiefase (AD tot BD)	1922	12-Oct-18 A	28-Aug-24	-786	12-Oct-18	05-Jul-22	-786
575	**VOORBEREIDING**		1556	22-Feb-18 A	12-May-25	6468	22-Feb-18	25-Mar-23	-556
576	**Voorbereiden Conditioneringwerkzaamheden**		158	09-Mar-18 A	01-Jan-20	653	09-Mar-18	02-Jan-20	0
577	**Kabels en Leidingen**		10	09-Mar-18 A	11-Jun-19	-195	09-Mar-18	07-Jan-19	-108
578	CON10	Conditionering - K&L: Opstellen en afstemmen PvA verleggen K&L	0	09-Mar-18 A	07-Sep-18 A		09-Mar-18	07-Sep-18	0
579	CON14	Conditionering - K&L: Proefsleuven / voorbereidingsperiode K&L opstellen en overeenkc	10	13-Jun-18 A	11-Jun-19	-195	13-Jun-18	07-Jan-19	-108
580	**Omgevingsmonitoring**		158	20-Apr-18 A	01-Jan-20	653	20-Apr-18	02-Jan-20	0
581	VERPL-13	Conditionering - Monitoring: Aanstellen natuurorganisatie als begeleidingscommisie (D	158	20-Apr-18 A	01-Jan-20	653	20-Apr-18	02-Jan-20	0
582	VERPL-36	Conditionering - Monitoring: Opstellen Ecologisch Werkprotocol [ME_04023][uiterlijk 2	0	20-Apr-18 A	22-Mar-19 A		20-Apr-18	21-Jan-19	-44
583	**Archeologische vondsten**		0	02-May-18 A	24-Aug-18 A		02-May-18	24-Aug-18	0
584	CON12	Conditionering - Archeologisch onderzoek: Opstellen werkplan	0	02-May-18 A	24-Aug-18 A		02-May-18	24-Aug-18	0
585	**Flora en Fauna**		0	02-May-18 A	18-Jan-19 A		02-May-18	04-Feb-19	11
586	CON11	Conditionering - Flora en Fauna: Opstellen en afstemmen PvA (ecologisch werkprotocol)	0	02-May-18 A	18-Jan-19 A		02-May-18	04-Feb-19	11
587	**NGE**		0	02-May-18 A	24-Aug-18 A		02-May-18	24-Aug-18	0
588	CON13	Conditionering - NGE: Opstellen werkplan uitvoeren NGE onderzoek	0	02-May-18 A	24-Aug-18 A		02-May-18	24-Aug-18	0
589	**Voorbereiding verkeersmanagement**		1556	22-Feb-18 A	12-May-25	6468	22-Feb-18	25-Mar-23	-556
590	**Beschikbaarheid Tocardo Den Oever**		2179	22-Feb-18 A	12-May-25	-780	22-Feb-18	25-Mar-23	-780
591	OM100	Spuigroep 1.1: Tocardo beschikbaar	51	22-Feb-18 A	15-Jul-19	366	22-Feb-18	28-Jun-19	-18
592	OM120	Spuigroep 1.3: Tocardo beschikbaar	100	22-Feb-18 A	02-Sep-19	335	28-Jun-19	05-Aug-19	-29
593	OM135	Spuigroep 1.2: Tocardo beschikbaar	758	03-Sep-19	29-Sep-21	-528	05-Aug-19	11-Jun-20	-476
594	OM138	Spuigroep 1.1: Tocardo beschikbaar	1311	01-Oct-19	03-May-23	-801	11-Jun-20	25-Mar-23	-40
595	OM159	Spuigroep 1.3: Tocardo beschikbaar	1129	26-May-20	28-Jun-23	-799			
596	OM164	Spuigroep 1.2: Tocardo beschikbaar	957	29-Sep-22	12-May-25	-780			
597	OM169	Spuigroep 1.1: Tocardo beschikbaar	621	31-Aug-23	12-May-25	-780			
598	OM174	Spuigroep 1.3: Tocardo beschikbaar	516	14-Dec-23	12-May-25	-780			
599	**Stremmingen en beperkingen weg**		1087	14-May-18 A	25-Jul-23	6937	14-May-18	01-Oct-21	-473
600	VM100	Opstellen verkeersmanagementplan (droog)	0	14-May-18 A	20-Jun-18 A		14-May-18	20-Jun-18	0
601	VM101	Aanvraagtermijn 1e verkeersmaatregel (WBU / nachtafzetting) tbv onderzoek voor AD	0	06-Jun-18 A	20-Jul-18 A		06-Jun-18	20-Jul-18	0
602	VM140	Opstellen verkeersmanagementplan (nat)	0	02-Jul-18 A	11-Oct-18 A		02-Jul-18	11-Oct-18	0
603	VM102	Aanvraagtermijn 1e verkeersmaatregel (2-0 systeem) na AD	0	06-Feb-19 A	19-Apr-19 A		06-Feb-19	07-Aug-19	78
604	**Den Oever**		982	21-Jan-19 A	28-Feb-23	7042	21-Jan-19	15-Mar-21	-512
605	**Wegvak DOV**		982	21-Jan-19 A	28-Feb-23	7042	21-Jan-19	15-Mar-21	-512
606	VM138	Wegvak DOV - Toerit logistiek centrum: Instandhouden 2-1 systeem	0	21-Jan-19 A	25-Jan-19 A		21-Jan-19	26-Jan-19	0
607	VM142	Wegvak DOV - Dam 15: Instandhouden 2-1 systeem	0	15-Apr-19 A	19-Apr-19 A		01-Apr-19	27-Apr-19	8
608	VM141	Wegvak DOV - 2 loopbruggen: Instandhouden 2-0 systeem	5	26-May-19	30-May-19	11228	06-May-19	11-May-19	-20
609	OMZ-01	Hoofd Wegennet - Wegvak DOV: Instellen 2-0 verkeerssysteem via Zuid	2	19-Sep-19*	20-Sep-19	-182	18-Sep-19	20-Sep-19	-1
610	VM106	Hoofd Wegennet - Wegvak DOV: Instandhouden 2-0 verkeerssysteem via Zuid	992	21-Sep-19	08-Jun-22	-799	18-Sep-19	18-Jun-20	-721
611	OMZ-02	Hoofd Wegennet - Wegvak DOV: Opheffen 2-0 verkeerssysteem via Zuid	1	09-Jun-22	09-Jun-22	-477	17-Jun-20	18-Jun-20	-429
612	OMZ-94	Hoofd Wegennet - Wegvak DOV: Instellen 2-0 verkeerssysteem via Noord	1	10-Jun-22	10-Jun-22	-477	18-Jun-20	19-Jun-20	-429
